



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

«برنامه اقدام هفتاد و یکساله»



در راستای مصوبه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تبیین راهبردها و انتظارات عمومی و مدیریتی 18 گانه و الویت‌های سازمان در سال 99 در قالب 2 طرح محوری برنامه اجرایی شامل «آبخیزداری و آبخوانداری (مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی)»، «صیانت از جنگل‌های کشور» و 9 پروژه طرح 9 در 99 با عناوین «اجرای طرح کاداستر اراضی ملی با الویت عرصه‌های جنگلی و سواحل»، «ارتقاء پوشش حفاظتی تاکید بر بلوک بندی مناطق بحرانی و بهره‌گیری از همیاران طبیعت»، «مدیریت و بهره‌برداری از مراتع در قالب طرح‌های مصوب مرتعداری با تکیه بر تولید گیاهان دارویی»، «تعیین تکلیف مدیریت بوستان‌های جنگلی»، «ذخیره‌گاه‌های جنگلی تشخیص، تعیین حدود و آگهی»، «توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی»، «اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری»، «توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری‌های روز و سامانه‌های هوشمند» و «توسعه و تقویت صندوق‌های منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی» عملکرد این اداره کل بشرح ذیل جهت استحضار و بهره‌برداری بحضور ارسال میگردد :

گزارش عملکرد های طرح های موارد ۹ گانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

ردیف	عنوان طرح	حجم مصوب	واحد	حجم عملکرد	درصد پیشرفت	توضیحات
معاونت حفاظت						
۱	اتمام عملیات شناسایی، تشخیص و آگهی عرصه‌های فاقد اجرای مقررات	۱,۰۰۰	هکتار	۱,۹۶۰	۱۹۶	
۲	کاداستر اراضی منابع ملی و دولتی (اسناد تبدیلی)	۶۰۰,۰۰۰	هکتار	۸۹۳,۸۳۸	۱۴۹	
۳	تکمیل الکترونیکی نمودن پاسخگویی به استعلامات و رفع اشکال سامانه سامط	۱۴	سامانه	۱۴	۱۰۰	
۴	تکمیل الکترونیکی نمودن پاسخگویی به استعلامات از طریق سامانه جامع پاسخگویی به استعلامات (صدور گواهی مستثنیات)	۱۴	سامانه	۱۴	۱۰۰	
۶	برنامه‌ریزی برای ورود اطلاعات پرونده‌های ممیزی اراضی در سامانه حدنگاری و بانک اطلاعات اراضی	۲,۳۸۸	فقره	۲,۱۱۹	۸۹	
۷	احصاء پرونده‌ها و شناسایی طرح‌های ماده (۳) قانون حفاظت	۲۵۰	پرونده	۲۵۰	۱۰۰	
۸	تعیین تکلیف پرونده‌های ماده (۳) از حیث طرح، قرارداد، بیلان و پرداخت حقوق دولتی و بهنگام‌سازی طرح‌های ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری	۵۷۲	هکتار	۵۸۲	۱۰۲	
۹	تکمیل و بهره‌برداری بانک اطلاعات سامانه پرونده‌های طرح‌های مدیریت منابع طبیعی سنواتی و جاری مشمول ماده (۳)	۹۰۰	پرونده	۸۰۲	۸۹	
۱۰	تعیین تکلیف عرصه‌های تحت اختیار و تصرفی نیروهای مسلح و اعاده عرصه‌های تصرفی مازاد	۱۱۰	هکتار	۳,۹۹۳	۳,۶۳۰	
۱۱	تعیین تکلیف نحوه اعمال مواد (۴) و (۶) قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن	۱۰۰	هکتار	۱۱۹	۱۱۹	
۱۲	تعیین تکلیف عرصه‌های تحت تصرف یا بهره‌برداری دستگاه‌های دولتی	۴	هکتار	۱۲	۳۱۰	
۱۳	اجرای عملیات کمربند	۴۰	کیلومتر	۳۳	۸۲	
۱۴	نظارت بر اجرای عملیات تامین و جایگزینی سوخت مناسب	۳۱	خانوار	۱۲۱	۳۹۰	
۱۵	نظارت بر اجرای عملیات مبارزه با آفات و بیماری‌ها در عرصه جنگل و مرتع	۱۹,۵۰۷	هکتار	۱۹,۶۹۷	۱۰۱	
۱۶	نظارت بر پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص عمومی و عمرانی	۷۰	فقره	۷۰	۱۰۰	
۱۷	پایش فعالیت‌های معدنی و نظارت بر اجرای عملیات بازسازی عرصه‌های تخریب	۲,۰۰۰	فقره	۲,۰۰۰	۱۰۰	
۱۸	ارتقاء و ساماندهی نیروهای حفاظتی	۱۴	اداره	۱۴	۱۰۰	

گزارش عملکرد های طرح های موارد ۹ گانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

ردیف	عنوان طرح	حجم مصوب	واحد	حجم عملکرد	درصد پیشرفت	توضیحات
۱۹	تهیه برنامه جامع حفاظتی با هدف ارتقای پوشش کامل حفاظتی (فاز یک شامل؛ پهنه‌بندی مناطق بحرانی، جانمایی پایگاه‌های اطفای حریق، پاسگاه‌ها و ...)	۱۴	اداره	۱۴	۱۰۰	
۲۰	ارتقای پوشش شبکه رادیویی	۸۵	درصد	۸۵	۱۰۰	
معاونت فنی						
۲۱	جنگلکاری اقتصادی با گونه‌های چند منظوره جنگلی در قالب طرح‌های مدیریت منابع طبیعی	۲,۰۰۰	هکتار	۳۰۰	۱۵	
۲۲	توسعه جنگل با نهال (بیولوژیک صندوق توسعه ملی)	۱۲۱	هکتار	۱۲۱	۱۰۰	
۲۳	تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره‌گاه‌های جنگلی	۵,۰۰۰	هکتار	۵,۲۸۶	۱۰۶	
۲۴	تعیین تکلیف مدیریت پارک‌های جنگلی در قالب طرح‌های مصوب	۴۹۵	هکتار	۴۹۵	۱۰۰	
۲۵	احاله مدیریت نهالستان‌های جنگلی	۲	نهالستان	۲	۱۰۰	
۲۶	طرح جنگلکاری توسعه فضای سبز استانی	۱,۲۸۰	هکتار	۱,۲۸۰	۱۰۰	
۲۷	نگهداری مناطق احیایی	۵۰	هکتار	۳۷۰	۷۴۰	
۲۸	احیا و غنی‌سازی جنگل	۲۱۰	هکتار	۱۰۰	۴۸	
۲۹	شناسایی، تعیین حدود ذخیره‌گاه‌های جنگلی	۵,۰۰۰	هکتار	۵,۲۸۶	۱۰۶	
۳۰	عملیات اصلاحی بهداشتی	۲,۲۳۰	هکتار	۲,۲۳۰	۱۰۰	
۳۱	محاوط بذرگیری	۴۰	هکتار	۴۰	۱۰۰	
۳۲	توسعه جنگل با نهال	۹۰	هکتار	۵۱	۵۷	
۳۳	تولید و تأمین نهال جنگلی	۱,۰۵۰	هزار اصله	۵۵۰	۵۲	
۳۴	زراعت چوب	۷۰۰	هکتار	۵۰۳	۷۲	
۳۵	بهره برداری محصولات فرعی گونه‌های جنگلی	۲۰۰,۰۰۰	هکتار	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۳۶	ساماندهی شیوه مدیریت چرای دام در عرصه مراتع ممیزی شده	۳۰۰,۰۰۰	هکتار	۴۰۶,۶۶۰	۱۳۶	
۳۷	ممیزی و تنسيق مراتع	۱۵,۷۹۱	هکتار	۱۵,۷۹۱	۱۰۰	
۳۸	تهیه طرح‌های مرتعداری تلفیقی	۲۳۱,۰۰۰	هکتار	۱۴۱,۰۰۱	۶۱	
۳۹	واگذاری طرح‌های مرتعداری تهیه شده به مجریان طرح‌ها	۶۰۷,۵۷۲	هکتار	۶۳,۶۶۲	۱۰	
۴۰	تشخیص و تعیین محدوده آگهی مناطق ذخیره‌گاهی مرتعی	۵,۰۰۰	هکتار	۵,۰۰۰	۱۰۰	
۴۱	مدیریت بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی بنه	۲۰۰,۰۰۰	هکتار	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۲	استقرار و بهره‌برداری کامل از سامانه مدیریت بهره‌برداری و حمل چوب‌آلات	۱	سامانه	۱	۱۰۰	
۴۳	بهره برداری از درختان و جنگلهای دست کاشت زراعت چوب که به سن دیر زیستی رسیده اند و بازکاشت عرصه های بهره برداری شده	۱,۲۰۰	مترمکعب	۲,۴۵۰	۲۰۴	
۴۴	احیا و توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی	۳,۵۰۰	هکتار	۳,۱۷۰	۹۱	

گزارش عملکرد های طرح های موارد 9 گانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

ردیف	عنوان طرح	حجم مصوب	واحد	حجم عملکرد	درصد پیشرفت	توضیحات
معاونت آبخیزداری						
۴۵	اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه های آبخیز استان	۸,۷۵۴	هکتار	۲۴,۰۵۳	۲۷۵	
۴۶	شناسایی و رقومی سازی اطلاعات توصیفی و مکانی اقدامات انجام شده بر اساس مطالعات تفصیلی-اجرایی طرح های قبلی	۱۱,۰۵۰	هکتار	۲۵,۸۹۰	۲۳۴	
۴۷	استفاده از فن آوری ها و الگوهای جدید در کنترل فرسایش خاک و حفاظت آب بر اساس دستاورد های تحقیقاتی	۱۳۰	هکتار	۲۰۷	۱۵۹	
۴۸	اشاعه مدل هفت گام اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز با مشارکت همه بخش ها	۲۲,۲۶۱	هکتار	۱۷,۸۰۸	۸۰	
۴۹	اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه های آبخیز استان (کنترل سیلاب و آبخوانداری)	۱,۰۴۰	هکتار	۸۳۲	۸۰	
معاونت برنامه ریزی						
۵۰	صدور مجوز تشکیل فعالیت بند ب ماده ۲۹	۵	مورد	۵۰	۱,۰۰۰	
۵۱	صدور مجوز تعاونی فعالیت بند ب ماده ۲۹	۵	مورد	۱۵	۳۰۰	
۵۲	تعداد قرارداد منعقد با شکل و تعاونی			۲۴		
۵۳	ارسال مستندات به دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های			۶۵		
۵۴	بکار گیری همیار	۹۰۰	نفر	۴,۷۱۰	۵۲۳	
۵۵	آموزش	۷۶۰	نفر روز	۲,۱۰۰	۲۷۶	
۵۶	قرار داد با بسیج قرارداد های یگان			۳		مبلغ ۱۲۱۸۵ میلیون ریال
۵۷	درآمد حاصل از بهره مالکانه طرح های جنگلداری و محصولات جنگلی و مرتعی و حق بهره برداری،...	۴۱۰۰۰	میلیون ریال	۱۰,۶۰۲	۲۶	دوره استراحت کتیرا و مجوز برداشت ممنوع بوده
۵۸	درآمد حاصل (صدور و تمدید پروانه چرا)	۱۰۰۰۰	میلیون ریال	۱۱,۰۹۵	۱۱۱	
۵۹	درآمد حاصل از حق فنی استعلامات	۱۴۰۰	میلیون ریال	۱,۶۴۲	۱۱۷	
۶۰	درآمد حاصل از جرایم و مواد بازداشتی	۸۰۰۰	میلیون ریال	۱۳,۱۱۶	۱۶۴	
۶۱	درآمد حاصل از خسارت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و معدنی	۲۳۳۰۰	میلیون ریال	۶,۱۷۳	۲۶	عدم دریافت بدستور
۶۲	فروش اموال به منظور جبران کسری ، حقوق	۶۰۰۰۰	میلیون ریال	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	
۶۳	نامین سرمایه ناسیس صندوق های حمایت	۱۰۰۰۰	میلیون ریال	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	

یگان حفاظت

62 منطقه	۱۰۰	۴۸۶۰۹۲	هکتار	۴۸۶۰۹۲	مناطق بحرانی	۶۴
192 منطقه	۱۰۰	۸۱۲۰۴۹	هکتار	۸۱۲۰۴۹	مناطق نیمه بحرانی	۶۵
44 منطقه	۱۰۰	۱۸۵۱۲۶	هکتار	۱۸۵۱۲۶	عادی	۶۶
	۱۰۰	۸۵	درصد	۸۵	شبکه رادیویی	۶۷
	۱۰۰	۲۰	دستگاه	۲۰	احداث پاسگاه و پایگاه اطفاء حریق (دستگاه)	۶۸

آمار سالیانه عملکرد اداره مرتع ۹۹* ۱۹ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۱۳۹۹

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال ۹۹	الزامات	نوع فعالیت اجرا شده	هدف کمی	عملکرد	واحد				
1	ساماندهی شیوه مدیریت چرای دام در عرصه مراتع ممیزی شده ^۱	تامین اعتبار	عقد قرارداد با پیمانکاران-معرفی سامان ها یا عرف ها به پیمانکار -در حال انجام	۳۰۰۰۰۰	۴۰۶۶۶۰	هکتار				
2	ممیزی و تنسيق مراتع ^۲	تامین اعتبار- تشکیل اکيپ ممیزی در استان	صدور آگهی ممیزی-تشکیل اکيپ ممیزی-در حال انجام	۱۵۷۹۱	۱۵۷۹۱	هکتار				
3	اخذ عوارض پروانه چرا	-	اطلاع رسانی به دامداران ذیحق جهت پرداخت عوارض علفچری	۱۰۰۰۰	۱۳۵۰۰	میلیون ریال				
4	*تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی	تامین اعتبار	تعداد ۱۴۳ فقره به مساحت ۱۴۱۰۰۱ بصورت مشارکتی توسط بهره برداران تهیه طرح شده است.	۲۳۱۰۰۰	۱۴۱۰۰۱	هکتار				
5	**واگذاری طرح های مرتعداری تهیه شده به مجربان طرح ها	پیگیری استان ها	تعداد ۴۹ فقره به مساحت ۶۳۶۶۲ هکتار معرفی به در دفتر خانه جهت عقد قرار داد	۶۰۷۵۷۲	۶۳۶۶۲	هکتار				
6	شناسایی و تعیین تکلیف مراتع بلامعارض	پیگیری استان ها	۰	۰	۰	هزار هکتار	-	-	-	-
7	ساماندهی چرای شترهای آزاد در مراتع	پیگیری استان ها	۰	۰	۰	هزار هکتار	-	-	-	-
8	تشخیص و تعیین محدوده آگهی مناطق ذخیره گاهی مرتعی	تامین اعتبارات لازم	تشخیص و شناسایی محدوده	۵۰۰۰	۵۰۰۰	هزار هکتار				
۹	استقرار و بهره برداری از سامانه امور مراتع (زیرمجموعه سامانه جامع مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری)	پس از تکمیل و راه اندازی سامانه				سامانه نرم افزاری	-	-	-	-

*قابل ذکر است با عنایت به اینکه تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی ملزم به تامین اعتبار می باشد و اعتباری در این خصوص تخصیص نیافته است. با مشارکت بهره برداران ذیحق در سطح ۵۱۴۱۰۰۱ هکتار طرح مرتعداری تهیه شده است.

**عمده مشکلات و موانع در احاله مدیریت طرح های مرتعداری تک برگی نبودن اسناد مالکیت اراضی ملی پلاکها بود و همچنین نیاز به بازنگری طرح های تهیه شده سنواتی باعث رکود در احاله میشد و قبول نداشتن شوراها به نمایندگی از بهره برداران به عنوان یک شخصیت حقوقی، ظرفیت محدود قرار دادن برای دفترخانه های اسناد رسمی که این دفترخانه ها قادر به پذیرش تقاضا های احاله طرح نبودن و... لازم به توضیح میباشد که سطوح تعهدات ابلاغی به استان در تهیه طرح و احاله طرح های مرتعداری به نسبت سایر استانها بسیار بالاتر میباشد حتی در صورت اجرای سطوح ده در صدی در احاله مدیریت طرحها نسبت به استانهای دیگر علی رغم اینکه از نظر مساحت بالاتر میباشد اما در محاسبه درصد پایین تر میباشد استدعا دارد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

¹ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها واحدهای اقدام کننده می باشند.

² ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها واحدهای اقدام کننده می باشند.

آمار سالیانه عملکرد اداره ممیزی اراضی ۹۹*۹۹ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۱۳۹۹

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
								اول	دوم	سوم	چهارم
1	اتمام عملیات شناسایی، تشخیص و آگهی عرصه‌های فاقد اجرای مقررات	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	تأمین اعتبار	فنی - اجرایی	۱۰۰۰	۱۹۶۰	هکتار	۲۰	۴۰	۴۰	۰
2	اجرای عملیات حدنگاری در اراضی فاقد سند	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	تأمین اعتبار	فنی - اجرایی	۰		هکتار	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰
3	کاداستر اراضی منابع ملی و دولتی (اسناد تبدیلی) با اولویت: عرصه‌های جنگلی، اراضی منابع ملی حاشیه شهرها با الویت کلان شهرهای کشور، اراضی ساحلی، ذخیره‌گاه‌های جنگلی، مرتعی، بیشه‌زارها و سایر اکوسیستم‌های شکننده، اراضی مطروحه در کمیسیون‌های ماده (54) (رفع تداخلات)، ماده واحده، مستندسازی و... عرصه‌های مرتعی درجه یک، سایر عرصه‌های ملی	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	تأمین اعتبار	فنی - اجرایی	۶۰۰۰۰۰	۸۹۳۸۳۸	هکتار	۱۵	۲۵	۳۰	۳۰
4	تکمیل الکترونیکی نمودن پاسخگویی به استعلامات و رفع اشکال سامانه سامط	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	فنی - اجرایی	فنی - اجرایی	۱۴	۱۴	سامانه	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
4	تکمیل الکترونیکی نمودن پاسخگویی به استعلامات از طریق سامانه جامع پاسخگویی به استعلامات (صدور گواهی مستثنیات)	دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	فنی - اجرایی	فنی - اجرایی	۱۴	۱۴	سامانه	-	۳۰	۳۰	۴۰
*5	تعیین تکلیف پرونده های اراضی اختلافی (ماده واحده)	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	فنی - اجرایی	فنی - اجرایی	۲۰	۳	فقره	۱۵	۲۵	۳۵	۱۵
**6	برنامه ریزی برای ورود اطلاعات پرونده های ممیزی اراضی در سامانه حدنگاری و بانک اطلاعات اراضی	دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	فنی - اجرایی	فنی - اجرایی	۲۳۸۸	۲۱۱۹	سامانه نرم افزاری	-	۳۰	۳۰	۴۰

- مساحت حدنگاری مورد تعهد استان طبق پیوست نامه شماره 99/1/4825-99/2/27-99 معادل 600 هزار هکتار میباشد که تا پایان سال 99 مساحت تقریبی 894 هزار هکتار (130 درصد) در سامانه کاداستر تثبیت و گردید.
 - طبق نقشه پوشش گیاهی، سطح جنگلهای استان حدود 527 هزار هکتار میباشد که در سال 99 کاداستر این سطح محقق گردید
 - در سال 99 عملیات کاداستر در دو شهرستان جنگلی پاوه و ثلاث باباجانی اتمام یافت .
 - کل پلاکهای استان مورد قرارداد کاداستر قرار گرفته اند بطوریکه تعدادی از آنها توسط مشاورین اداره کل مورد اقدام برای کاداستر قرار گرفته و مابقی پلاکها نیز مورد قرارداد مشاور اداره کل ثبت اسناد قرار گرفته است .
- * در خصوص تعداد باقیمانده پرونده ها ، بدلیل اینکه پلاکهای مربوطه در کمیسیون رفع تداخل موضوع ماده 54 مطرح که منجر به تعیین تکلیف قطعی نشده اند لذا بررسی آنها منوط به تصمیم کمیسیون یاد شده گردیده است .
- ** مابقی پلاکها عمدتاً " مربوطه به آندسته از پلاکهایی هستند که فاقد اراضی ملی می باشند که ورود اطلاعات آنها در سامانه موضوعیت ندارد .

اداره استعدادیابی

ردیف	برنامه اجرائی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	زمان اجرا (سه ماهه) %				
							واحد	اول	دوم	سوم	چهارم
1	احصاء پرونده ها و شناسایی طرح های ماده (3) قانون حفاظت	معاونت امور جنگل	تأمین اعتبار	فنی - اجرایی	۲۵۰	۲۵۰	پرونده	-	۳۰	۴۰	۳۰
2*	تعیین تکلیف پرونده های ماده (3) از حیث طرح، قرارداد، بیلان و پرداخت حقوق دولتی و بهنگام سازی طرح های ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری		-	فنی - اجرایی	۵۷۲	۵۸۱/۹۶۶۶	هکتار	-	۳۰	۴۰	۳۰
3	تکمیل و بهره برداری بانک اطلاعات سامانه پرونده های طرح های مدیریت منابع طبیعی سنواتی و جاری مشمول ماده (3)	دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری	-	فنی - اجرایی	۹۰۰	۸۰۲	پرونده	-	۳۰	۴۰	۳۰
4	تعیین تکلیف عرصه های تحت اختیار و تصرفی نیروهای مسلح و اعاده عرصه های تصرفی مازاد		-	فنی - اجرایی	۱۱۰	۳۹۹۳/۵۹۵۲	هکتار	-	۴۰	۴۰	۲۰
5	تعیین تکلیف پرونده های مشمول ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری که در مهلت قانونی ثبت دفاتر شده است	دفتر امور حقوقی، دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد	-	فنی - اجرایی	-	-	هکتار	-	۳۰	۴۰	۳۰
6**	پیگیری اخذ درآمد ناشی از حقوق دولتی طرح های مدیریت منابع طبیعی		-	فنی - اجرایی	۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	ریال	-	۳۵	۳۵	۳۰
7	تعیین تکلیف نحوه اعمال مواد (4) و (6) قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	-	فنی - اجرایی	۱۰۰	۱۱۸/۶۱۹۰	هکتار	-	۳۵	۳۵	۳۰

* شامل پرونده های ماده 3 می باشد که مورد بررسی قرار گرفته و حسب مورد طرح یا بیلان آنها اصلاح و یا اقدام به عقد قرارداد شده و ضمن اینکه تعداد 186 فقره پرونده طرح طوبی بند الف آماده جهت ارسال به دفترخانه می باشد که علیرغم استعلام و مکاتبات متعدد این اداره کل با سازمان مبنی بر اینکه آیا مشمول مزایده می شوند یا خیر ، تاکنون پاسخی واصل نشده که به محض وصول جوابیه اقدام لازم معمول خواهد شد.

** علت عدم تحقق کامل : ۱- تعدادی از طرحها دارای مشکلات قضایی می باشند که در دست پیگیری است. ۲- طرحهای جنگلکاری اقتصادی - اراضی شیبدار و کشت گیاهان دارویی حسب نوع طرح و نوع گونه و طبق طرح مصوب کمیته فنی به ترتیب بعد از ۱۵ سال - ۴ سال و ۵ سال به بهره برداری رسیده و مشمول دریافت بهره مالکانه می شوند.

*** در این اداره کل پرونده ماده ۳۱ قانون ح و ب وجود ندارد و اگر در سنوات قبل نیز واگذاریهایی در قالب این ماده قانونی انجام شده در فرایند تمدید تبدیل به مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه اصلاحی شده اند. **** به علت عدم تأمین اعتبار انجام نشده است.

اداره استعدادیابی

ردیف	برنامه اجرائی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
								اول	دوم	سوم	چهارم
۸	تعیین تکلیف پرونده ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری که مهلت سی ساله قرارداد آنها به پایان رسیده است.	دفتر امور حقوقی، سازمان امور اراضی کشور، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تامین اعتبار	فنی - اجرایی	-		پرونده	-	۴۰	۳۰	۳۰
۹	تعیین تکلیف عرصه‌های تحت تصرف یا بهره‌برداری دستگاه‌های دولتی	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دفتر مهندسی و مطالعات	-	فنی - اجرایی	۴	۱۲/۴۶۲۶	هکتار	-	۳۵	۳۵	۳۰
۱۰	تهیه نقشه پهنه‌بندی اراضی مشمول ممنوعیت تخصیص به تفکیک شهرستان	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دفتر مهندسی و مطالعات	تامین اعتبار	فنی - اجرایی			اداره		۳۵	۳۵	۳۰

برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال ۹۹ اداره حفاظت و حمایت

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
								اول	دوم	سوم	چهارم
1	<p>اجرای عملیات کمربند در سال جاری مقدار 12.8 کیلومتر کمربند حفاظتی در سه شهرستان (کرمانشاه ، دالاهو و کنگاور) به صورت مشارکتی اجرا شده . همچنین 20 کیلومتر در اسلام آباد غرب در سال جاری اجراء گردیده.</p>	معاونت امور جنگل، دفتر امور مراتع	انجام حدنگاری	فنی - اجرایی	۴۰	۳۲۰۸	کیلومتر	-	۳۰	۳۰	۴۰
2	<p>نظارت بر اجرای عملیات تامین و جایگزینی سوخت مناسب (تعداد 52 پک اقلام گاز سوز در حوزه آهوران توزیع شده است . قرارداد ها: تهیه و نصب 19 دستگاه آبگرمکن خورشیدی به مبلغ 1386000000 ریال از محل اعتبارات استانی انجام شده. تهیه و نصب 50 دستگاه آبگرمکن خورشیدی به مبلغ 3120000000 ریال از محل اعتبارات صیانت انجام شده.</p>	-	تامین اعتبار	فنی - اجرایی	۳۱	۱۲۱	خانوار	-	۳۰	۳۰	۴۰
3	<p>نظارت بر اجرای عملیات مبارزه با آفات و بیماری ها در عرصه جنگل و مرتع : پیش آگاهی و پایش - مراقبت از کانون های آلوده قبلی - پایش ویژه آفت جوانه خوار - عملیات پیشگیری از طریق محلول پاشی با BT . میزان 1647 هکتار از درختان ارژن آلوده به مویزک عسلی (لورانتوس) در شهرستان هرسین و 50 هکتار نیز لورانتوس در شهرستان پاوه، روستای باینگان به صورت مشارکتی و 100 هکتار در نودشه در قالب قرارداد حفاظت مشارکتی با شورای روستا مورد پاکسازی قرار گرفته است</p> <p>در راستای تفاهم نامه های حفاظت مشارکتی و قرارداد های بهره برداری از محصولات فرعی اراضی جنگلی میزان 400 هکتار در شهرستان جوانرود و 200 هکتار در شهرستان گیلانغرب مبارزه و قطع لورانتوس انجام گردیده است</p> <p>قرارداد های سال 99: از محل اعتبارات صیانت 750 هکتار در شهرستان دالاهو (پلاک سیاهانه) به مبلغ 2871960000</p>		تامین اعتبار	فنی - اجرایی	۱۹۵۰۷	۱۹۶۹۷ هکتار	هکتار	۵۰	۲۰	۲۰	۱۰

									ریال عقد قرارداد و اجرا شده . از محل اعتبارات صندوق توسعه قرارداد 750 هکتار در شهرستان دالاهو (قورچی باشی) به مبلغ 2871960000 ریال عقد قرارداد و اجرا شده. از محل اعتبارات استانی نیز قرارداد 400 هکتار در روانسر (منطقه قوری قلعه) به مبلغ 1531712000 ریال عقد قرارداد و اجرا شده. _ که مجموعاً سطحی معادل 19697 هکتار را شامل می شود.)		
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	فقره	70	70	فنی - اجرایی	-	کمیته‌های نظارت بر طرح‌های عمومی و عمرانی واحدهای ستادی و استانی	نظارت بر پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص عمومی و عمرانی <u>(تعداد 70 فقره پاسخ نهایی از مجموع 25 جلسه کمیته نظارت ابلاغ گردیده است)</u>	4
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	فقره	2000	2000	فنی - اجرایی	-	کمیته‌های نظارت بر طرح‌های عمومی و عمرانی واحدهای ستادی و استانی	پایش فعالیت‌های معدنی و نظارت بر اجرای عملیات بازسازی عرصه‌های تخریب شده ناشی از آن (نظارت مستمر توسط کارشناسان شهرستانی صورت می گیرد)	5
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	-	3603 میلیون ریال	22000 ریال	پشتیبانی	-	دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و هماهنگی طرح‌ها، اداره کل امور مالی	برنامه‌ریزی و اقدام در جهت وصول درآمد آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری :	*6
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	میلیارد تومان			پشتیبانی	-	دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و هماهنگی طرح‌ها، معاونت امور جنگل	شناسایی ظرفیت‌های اخذ درآمد به تفکیک ادارات کل در خصوص اکتشاف و بهره‌برداری معادن و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی	7
۱۰	۴۰	۴۰	۱۰	اداره	68 نفر از همکاران شهرستانی و نیروهای وظیفه	جهت 487092 هکتار اراضی جنگلی و 997175 هکتار اراضی	فنی - اجرایی	-	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل، یگان حفاظت، دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی، دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد، دفتر حراست مرکزی	ارتقاء و ساماندهی نیروهای حفاظتی (شامل تقسیم نیرو های موجود با توجه به نرم ابلاغی از سازمان شامل یک نیروی حفاظتی به ازای هر 6000 هکتار در اراضی جنگلی و 30000 هکتار اراضی مرتعی - همچنین اعلام کمبود نیرو به سازمان - بکارگیری تعداد 68 نفر از همکاران شهرستانی و سربازان وظیفه - 255 نیروی دیدبان جهت افزایش پوشش حفاظتی و بکارگیری 11 نفر نیروی شرکتی گشت و مراقبت از محل اعتبارات صندوق توسعه) - تجهیز نیرو های حفاظتی و واحد های گشت و مراقبت به وسایل و تجهیزات حفاظتی و ... - صدور کارت و حکم مأموریت برای نیروها- راه اندازی سامانه 139 در	8

						مرتعی				استان.	
۳۰	۳۰	۳۰	۱۰	اداره	پهنه بندی انجام و مناطق بحرانی و نیمه بحرانی شناسایی شده است	تعداد ۶۲ منطقه بحرانی و ۱۹۲ منطقه نیمه بحرانی	فنی - اجرایی	دفتر مرکزی حراست، یگان حفاظت	تهیه برنامه جامع حفاظتی با هدف ارتقای پوشش کامل حفاظتی (فاز یک شامل؛ پهنه‌بندی مناطق بحرانی، جانمایی پایگاه‌های اطفای حریق، پاسگاه‌ها و ...) (پهنه بندی مناطق بحرانی و نیمه بحرانی انجام شده است. جانمایی تعداد 3 پایگاه اطفای حریق در مناطق سرفیروز آباد کرمانشاه، قوری قلعه روانسر و بیستون انجام که پایگاه قوری قلعه در حال راه اندازی است)	9	
-	-	-	-	مورد	1	15	پشتیبانی	تامین اعتبار	دفتر مهندسی و مطالعات ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تامین بهیاد جهت نظارت و پایش استان‌ها (یک عدد تهیه و پیش بینی ۱۴ عدد برای شهرستان‌ها در صورت تامین اعتبار)	10
۴۰	۳۰	۳۰	۰	درصد	85	85	فنی - اجرایی	یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	ارتقای پوشش شبکه رادیویی (۸۰ درصد سطح استان تحت پوشش شبکه رادیویی قرار دارد)	11	
۴۰	۳۰	۳۰	۰	سامانه نرم‌افزاری			فنی - اجرایی	پس از تکمیل و راه اندازی سامانه	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	بهره‌برداری از سامانه جامع پاسخگویی به استعلامات (استعلامات طرح‌های معدنی در اراضی ملی)	12

۴۰	۳۰	۳۰	۰	سامانه			فنی - اجرایی	پس از تکمیل و راه اندازی سامانه	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تکمیل و به‌روزرسانی سامانه آفات و امراض	13
۴۰	۳۰	۳۰	۰	سامانه نرم‌افزاری			فنی - اجرایی	پس از تکمیل و راه اندازی سامانه	دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	برنامه‌ریزی جهت ورود اطلاعات معادن واقع در اراضی ملی در سامانه حدنگاری و بانک اطلاعات اراضی (بخش معادن)	14

* در پایان سال ۹۹ با توجه به پیگیریهای انجام شده قرار شد شرکت گاز استان اقدام به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و صد میلیون تومان) از خسارات معوقه سنوات گذشته نماید، ولی با توجه به اعلام سازمان

در خصوص عدم دریافت خسارت در پایان سال ۹۹ لذا مقرر شد خسارت یاد شده در سال ۱۴۰۰ از شرکت گاز اخذ شود.

آمار عملکرد سالیانه واحد بهره برداری ۹ در ۹۹ در سال ۱۳۹۹

ردیف	برنامه اجرائی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار*	الزامات	نوع فعالیت اجرا شده	هدف کمی	عملکرد	
						واحد	سالیانه
1	مدیریت بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی محصولات درخت بنه	-	تامین اعتبار	بازدید و نظارت در طی مرحله بهره برداری- برخورد با متخلفان- انجام امور محوله در مراحل پایانی بهره برداری	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	هکتار
2	استقرار و بهره‌برداری کامل از سامانه مدیریت بهره‌برداری و حمل چوب‌آلات	دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	بعداز تکمیل و تحویل سامانه	ارسال لیست به سازمان و در حال حاضر منتظر کد رهگیری از سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات می باشد.	-	-	سامانه نرم‌افزاری
3	بهره برداری از درختان و جنگلهای دست کاشت زراعت چوب که به سن دیر زیستی رسیده اند و بازکاشت عرصه های بهره برداری شده	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تامین اعتبار	-	۱۲۰۰	۲۴۵۰	مترمکعب
4	نظارت بر بهره‌برداری محصولات فرعی عرصه های جنگلی و مرتعی و اخذ بهره مالکانه	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	بهره برداری و اجرای طرح در زمان مناسب	ابلاغ کارشناس ناظر شهرستانی - بهره گیری از کارشناسان نظام مهندسی در نظارت و احیای عرصه مورد بهره برداری برداشت علف گاوزبان	۱۰۰۰۰	۱۰۶۰۲	میلیون ریال
5*	احیا و توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	تامین اعتبار	عدم تامین اعتبار مکاتبه با استانداری در خصوص تخصیص اعتبار اصلاح و توسعه استانی و ارجاء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امور عشایری و سازمان جهاد کشاورزی	۳۵۰۰	۳۱۷۰	هکتار

با توجه به اینکه اعتباری بابت هزینه کشت گیاهان دارویی در برنامه جهش ۹ در ۹۹ ابلاغ نگردید لذا این اداره کل طی مکاتبات متعدد با استانداری ، سازمان جهاد کشاورزی و امور عشایری استان اقداماتی بصورت مشارکتی و خود جوش توسط بهره برداران ذیحق و محلی به شرح ذیل اقدام گردید

مساحت 1980 هکتار از مراتع شهرستان دالاهو با مشارکت بهره برداران ذیحق عرفی عملیات کشت گونه های خوراکی و دارویی با گونه های: چویل ، ریواس، آویشن (ازبوه)، کنگر ، باریجه، آنغوزه و ...
مساحت 400 هکتار از روستای کرم بست توسط خیرین و اهالی روستا با گونه های موسیر و آویشن بومی احیا و نگهداری گردید
مساحت 200 هکتار از توابع روستای خسروآباد شهرستان سنقر کلیایی با گونه آویشن بومی توسط اهالی روستا بصورت خودجوش احیا و مراقبت گردید
مساحت 20 هکتار از اراضی جنگلی تخریبی با مشارکت کارشناس سازمان نظام مهندسی و بهره برداران عرفی سقز با نهال بنه و گلابی جنگلی و بذر ریواس احیاء گردید
مساحت 30 هکتار از مراتع شهرستان صحنه از محل اعتبارات استانی با گونه نهال گلمحمدی و آویشن اقدام گردید.
مساحت 540 هکتار از مراتع دارای طرح مرتعداری در سطح استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با کشت و توسعه گونه های کنگر ، باریجه، ریواس، آنغوزه تلخ و شیرین و ... اقدام گردید

پیشرفت فیزیکی پروژه های اداره جنگلداری و جنگلکاری در سال ۱۳۹۹

ردیف	برنامه اجرائی تحقق اهداف در سال 99	الزامات اجرا	هدف کمی	عملکرد اسفند	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
						اول	دوم	سوم	چهارم
۱ *	جنگلکاری اقتصادی با گونه های چند منظوره جنگلی در قالب طرح های مدیریت منابع طبیعی	تامین اعتبار	۲,۰۰۰	۳۰۰	هکتار	-	-	۵۰	۵۰
۳	توسعه جنگل با نهال (بیولوژیک صندوق توسعه ملی)	تامین اعتبار	۱۲۱	۱۲۱	هکتار	-	-	۵۰	۵۰
۴	تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره گاه های جنگلی	تامین اعتبار	۵۰۰۰	۵۲۸۶	هکتار	-	۳۰	۳۰	۴۰
۵ **	تعیین تکلیف مدیریت پارک های جنگلی در قالب طرح های مصوب	-	۴۹۵	۴۹۵	هکتار	-	۳۰	۳۰	۴۰
۶ ***	احاله مدیریت نهالستان های جنگلی	-	۲	۲	نهالستان	-	-	-	-
۷	طرح جنگلکاری توسعه فضای سبز استانی	تامین اعتبار	۱۲۸۰	۱۲۸۰	هکتار	-	-	-	-

پیشرفت فیزیکی پروژه های اداره جنگلداری و جنگلکاری در سال ۱۳۹۹

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99	الزامات اجرا	هدف کمی	عملکرد اسفند	واحد	زمان اجرا (سه ماهه).%			
						اول	دوم	سوم	چهارم
۸	اجرای طرح صیانت از جنگل های نواحی رویشی (5) گانه	تامین اعتبار	۵۰	۳۷۰	هکتار	-	-	-	۵۰
				۲۱۰					
				۵۰۰۰					
				۲۲۳۰					
				۴۰					
				۹۰					
۹	تولید و تأمین نهال جنگلی	تامین اعتبار	۱۰۵۰	۵۵۰	هزار اصله	-	۳۰	۳۰	۴۰
۱۰	زراعت چوب	تامین اعتبار	۷۰۰	۵۰۳	هکتار	-	۳۰	۳۰	۴۰
۱۱	بهره برداری محصولات فرعی گونه های جنگلی	-	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	هکتار	-	-	-	-

تشریح اقدامات اجرایی بعمل آمده ، موانع و مشکلات تحقق 100 درصدی برخی از پروژه ها :

* در خصوص تعهدات ابلاغی استان، جهت اجرای طرح جنگلکاری مشارکتی اقتصادی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار ، شناسایی عرصه های مستعد و متقاضیان ، تهیه نقشه های رقومی ، تشکیل پرونده احاله مدیریت برای متقاضیان بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری با شرط اجرای کلیه عملیات حفاظت ، مراقبت ، نگهداری و آبیاری توسط مجریان ، اجرا گردیده است که پس از ابلاغ اعتبارات عملیات اجرایی شروع خواهد گردید که در این خصوص، علیرغم تعیین سهم اعتبارات استان توسط آن مرکز، تاکنون ابلاغ اعتبار از سوی دفتر برنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرح های سازمان به استان ابلاغ نشده است و اساساً منبع تامین اعتبار جهت درج در متن قراردادهای فراهم سازی زیر ساخت یا درخواست های خرید نهال مورد نیاز نامشخص می باشد. که در آخرین پیگیری بعمل آمده اعلام شد مقرر شده است اعتبار مذکور از محل طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار به استان ها ابلاغ گردد که پس از اینکه در جلسه پیگیری موضوع در ستاد سازمان با جناب آقای دکتر غیبی رئیس وقت مرکز جنگلهای خارج از شمال اعلام گردید امکان تامین اعتبار مذکور در سال جاری وجود ندارد ، با تشریح ضرورت های اجرای زیر ساخت طرح های مذکور نهایتاً" مقرر گردید تعهدات استان صرفاً در حد ۲۰۰ هکتار قطعات خرد اصلاح گردد که مراحل نهایی عقد قرارداد جهت تحویل عرصه اجرای طرح های مذکور توسط بهره برداران بومی محلی درحال پیگیری و اجرا می باشد .

** درخصوص تعیین تکلیف احاله مدیریت پارک های جنگلی استان به منظور احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک های جنگلی استان، در جهت تحقق اهداف 9 گانه ابلاغی برای کلیه پارک های استان که تاکنون احاله مدیریت نشده اند با بهره گیری از توان کارشناسی همکاران این اداره کل، اقدامات لازم شامل تهیه گزارش اولیه ، تهیه نقشه های رقومی، تهیه اسناد مزایده ، تصویب گزارش اولیه در کمیته فنی ، بارگذاری در سامانه تدارکات دولت و انتشار فراخوان در جراید ملی اجرا گردیده که علیرغم ارائه مشوق های مناسب مانند 5 سال معافیت از بهره مالکانه و تعیین حداقل قیمت برای بهره مالکانه پایه، در بازگشایی مرحله اول در مورخه 3 / 08 / 1399 و مرحله دوم در مورخه 11 / 09 / 1399 هیچ گونه پیشنهاد قیمتی در سامانه دریافت نشد که پس از دعوت از تعدادی از سرمایه گذاران به منظور بررسی دلایل عدم استقبال از این موضوع، محرز گردید که علاوه بر مشکلات تامین آب مورد نیاز جهت نگهداری از پوشش جنگلی موجود و آب شرب مورد نیاز بخش گردشگری، عمده ترین مشکل این نوع سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های بسیار بالای مراقبت و نگهداری از پوشش گونه های جنگلی موجود و ایجاد زیرساخت های گردشگری، بدلیل فقدان هر گونه امکانات و تجهیزات تفرجگاهی در پارک های مذکور می باشد به گونه ای که در این پارک ها صرفاً پوشش گونه های جنگلی ایجاد شده و با توجه به فقدان اعتبارات ایجاد زیر ساخت، این مهم تاکنون اجرا نشده است که در راستای ایجاد زیر ساخت در پارک های

مذکور و نیز احاله مدیریت به شهرداری ها مکاتبات لازم با استاندار محترم و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری جهت تخصیص اعتبار به منظور ایجاد ریر ساخت های گردشگری و یا الزام شهرداری های استان به تحویل به منظور بهره برداری بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری بعمل آمده است. بر اساس شاخص های اعلامی آن تا مزایده سپاری و بازگشایی قیمت ها 60 درصد پیشرفت فیزیکی محسوب می گردد. که حسب دستور ریاست محترم سازمان در صورتی که استان ها مراحل و فرایند های مزایده سپاری در سامانه ستاد را اجرا نمایند اما بدلیل عدم تقاضای سرمایه گذاری احاله مدیریت صورت نگیرد پیشرفت فیزیکی استان معادل 100 درصد محاسبه خواهد گردید .

******* در خصوص ساماندهی احاله مدیریت نهالستان های جنگلی، نظر به اینکه استان دارای ۲ نهالستان مادری گرمسیری و سردسیری می باشد و بر اساس دستورالعمل های نظام تولید و بهره برداری از نهالستان ها و نیز نامه شماره ۹۶/۴۴/۲۷۹۲ مورخه ۹۶/۲/۱۰ آن مرکز، مدیریت نهالستانهای مذکور کما فی سابق در اختیار این اداره کل میباشد اما به استناد دستور شفاهی ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و صورت جلسه مرحله اول شورای راهبردی جهش سازمانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، تولید مشارکتی یک میلیون و پانصد هزار اصله نهال در قالب تفاهم نامه مشارکتی تولید نهال با افراد حقیقی و حقوقی در دستور کار قرارداد. در زمینه احاله مدیریت نهالستان به منظور تولید نهال مشارکتی در دو مرحله در روزنامه های محلی و سایت های استانی فراخوان عمومی منتشر گردیده است که تاکنون درخواستی از سوی متقاضیان به این اداره کل ارائه نشده است. شرکت آرین آرکین نیز پس از پیگیری های متعدد و انعقاد قرارداد به صورت مکتوب، انصراف خود را بدلیل عدم توانایی در تولید ناشی از شرایط اپیدمی کرونا اعلام نموده است .

بر اساس بررسی های بعمل آمده، عدم استقبال تولید کنندگان نهال در استان از این نوع از احاله مدیریت ، بدلیل مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی قیمتها ، نیاز به سرمایه نقدی مناسب جهت فرآیند های اجرایی تولید نهال و نیز عدم وجود ساز و کار خرید تضمینی نهال به منظور امنیت سرمایه گذاری ، بخصوص بدلیل محدودیت امکان فروش گونه های جنگلی است که عمدتاً خریدار اصلی این نوع گونه ها ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها و یا شهرداری ها بوده که بدلیل مشکلات اعتباری سنوات اخیر، امکان خرید تضمینی توسط مراکز مذکور فراهم نمی باشد .

*** ** * مهمترین دلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصدی اجرای تعهدات ابلاغی صیانت ، عدم تناسب اعتبارات مصوب و تخصیصی با حجم عملیات ابلاغی است به گونه ای که بر اساس حداقل نرم هزینه واحد اجرای پروژه های مذکور حتی بر اساس نرم های ابلاغی توسط آن مرکز به بیش از ۲۸۰۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیصی نیاز می باشد در شرایطی که کل اعتبار مصوب استان براساس موافقتنامه های ابلاغی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۱۵۰ میلیون ریال می باشد .

*** ** * در خصوص تعهدات تولید نهال به میزان ۱۰۵۰ هزار اصله تاکنون ۵۵۰ هزار اصله نهال در نهالستان سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب با گونه های بنه ، گلابی جنگلی ، بادام ، توت ، ارغوان ، صنوبر ، زبان گنجشک ، اکالیپتوس و تولید گردیده است ، همچنین برای مابقی تعهدات به میزان ۵۰۰ هزار اصله در سال ۱۳۹۹ در دو مرحله و هر کدام در سه نوبت مناقصه سپاری در سامانه ستاد دولت انجام شده است که هیچ گونه پیشنهاد قیمتی در سامانه ستاد ارائه نگردید که هم اکنون سوم مناقصه سپاری نیز اجرا گردیده است که زمان بازگشایی پیشنهادات قیمت در مورخه ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۰ می باشد .

*** ** * در زمینه طرح توسعه زراعت چوب ، تعهدات استان در سطح ۷۰۰ هکتار شامل ۳۰۰ هکتار استحصال چوب در اراضی ملی و مستثنیات به میزان ۱۲۰۰ متر مکعب، ۴۰۰ هکتار توسعه جدید با گونه های صنوبر و اکالیپتوس می باشد که در زمینه استحصال چوب پیشرفت فیزیکی برابر ۱۷۰ درصد به میزان ۲۰۱۶ مترمکعب پروانه حمل صادر گردیده است و در خصوص بخش توسعه ، شناسایی متقاضیان ، تهیه نقشه و تکمیل پرونده در مساحت ۴۰۰ هکتار اجرا گردیده است و به منظور تامین نهال مورد نیاز ضمن هماهنگی با مدیر محترم توسعه زراعت چوب کشور بعمل آمده و لیست مشخصات متقاضیان نهال به انضمام مکاتبات شرکت پارس پیوند به ستاد سازمان ارسال شده است که در مرحله هماهنگی با شرکت های وابسته به صنایع چوب و کاغذ کشور جهت تامین نهال می باشد که بدلیل عدم توان شرکت های مذکور در تامین نهال در دو مرحله با ریاست محترم سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور مکاتبات لازم جهت تامین نهال از سایر مجاری بعمل آمده است و در تاریخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹ طی تماس با جناب آقای دکتر غیبی و آقای دکتر پورمقدم موضوع مجدداً پیگیری گردید که در پیامد پیگیری های بعمل آمده نهایتاً " مرکز جنگلهای خارج از شمال طی نامه شماره ۳۲۶۷۴ / ۴۴ / ۹۹ مورخه ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۹ از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خواستار تحویل ۲۰۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس گردید که در پیگیری های بعمل آمده محرز گردید اداره کل مذکور نیز فاقد نهال قابل خروج در سال جاری است و علیرغم مکاتبه با اداره کل استان ایلام و پیگیری پاسخ مکتوب ، تاکنون پاسخی دریافت نشده است .

در جریان پیگیری موضوع در ستاد سازمان اعلام گردید انجمن کارفرمایان صنایع چوب نسبت به تامین نهال اقدام نمایند که در همین راستا نماینده شرکت آرین سینا معرفی شده توسط سازمان جهت تامین نهال و انعقاد قرارداد خرید تضمینی با حضور معاون محترم فنی با مدیران شرکت در روز یکشنبه ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹ جلسه برگزار و از موقعیت محدوده ۶۵۰ هکتاری شرکت جهت برنامه ۵ ساله توسعه زراعت چوب بازدید نمودند ، همچنین لیست کلیه متقاضیان ۲ هکتار و بالاتر به مساحت ۴۹۱ هکتار با شماره تماس برای انجمن کارفرمایان صنایع چوب و کاغذ ارسال گردید

با عنایت به موارد مذکور و نظر به اینکه نهال مورد نیاز مجریان طرح توسعه زراعت چوب استان تامین نگردید با توزیع نهال های تولیدی موجود در نهالستان های استان و نیز هماهنگی با برخی فروشندگان نهال در کشور به منظور خرید توسط متقاضیان و مجریان ، نهایتاً با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود ۲۰۳ هکتار توسعه زراعت چوب در استان اجرا و کاشت گردید .

جدول شماره 2 - ارتقای پوشش حفاظتی استان کرمانشاه

الف - بلوک بندی در قالب محدوده‌های مشخص:

مناطق بحرانی			مناطق نیمه بحرانی			مناطق عادی		
منطقه (تعداد)	مساحت (هکتار)	تعداد شهرستان	منطقه (تعداد)	مساحت (هکتار)	تعداد شهرستان	منطقه (تعداد)	مساحت (هکتار)	تعداد شهرستان
۶۲	۴۸۶۰۹۲	۱۴	۱۹۲	۸۱۲۰۴۹	۱۴	۴۴	۱۸۵۱۲۶	۹

- ✓ مساحت تحت پوشش اعلامی با کسر واگذاریها و مناطق تحت مدیریت محیط زیست می باشد.
- ✓ شهرستانهای ثلاث باباجانی، پاوه، جوانرود، روانسر و کرمانشاه فاقد مناطق عادی حریق می باشند.

ب - استقرار و وضعیت نیروها در بخش‌های مشخص شده:

وضعیت ملبس نمودن ، صدور کارت و حکم ماموریت نیروهای حفاظتی بر اساس دستورالعمل						تعداد نیرو و استقرار در بخش‌های مشخص شده			
نیروهای حفاظتی شرکتی (نفر)			نیروهای حفاظتی سازمانی (رسمی، پیمانی و قراردادی) نفر			تنظیم صورت جلسه و تحویل منطقه استحضاطی		تعداد بخش تعیین شده در استان	
صدور کارت و حکم ماموریت نیروها	ملبس شدن نیروها	تعداد کل نیرو	صدور کارت و حکم ماموریت نیروها	ملبس شدن نیروها	تعداد کل نیرو	به تعداد نفر	تعداد بخش	استقرار نیرو در بخش (تعداد)	تعداد بخش
۱۱	۱۱	۱۱	۵۷	۵۷	۵۷	۶۸	۳۱	۶۸	۳۱

✓ شناسنامه حفاظتی مشتمل بر طرح حفاظتی انتظامی برای هر کدام از بخش ها تهیه شده است که پس از ارسال به سازمان به عنوان الگویی نمونه ای برای تهیه به سایر استانها ابلاغ گردید

ج- تجهیزات و اقدامات حمایتی:

تعداد کل خودرو و موتورسیکلت‌های استان (دستگاه)		سیستم مانیتورینگ (GPS)		تجهیز به آرم، چراغ، آژیر و ...	شبکه رادیویی (بهره برداری از بی سیم های خودرویی، دستی و ثابت) (هزارهکتار)		احداث پاسگاه و پایگاه اطفاء حریق (دستگاه)	
خودروهای حفاظتی	موتور سیکلت‌های گشت	تعداد ارسال شده به استان (دستگاه)	تعداد GPS نصب شده روی خودروها (دستگاه)	تعداد خودروهای تجهیز شده (دستگاه)	سطح کل استان	سطح پوشش	تعداد کل پاسگاه مورد نیاز	تعداد پاسگاه تجهیز شده
۲۲	۱	۰	۰	۲۲	۲۴۴۵	۲۰۷۸	۲۱	۲۰

✓ لازم به ذکر است این اداره کل در حال حاضر به تفکیک دارای 18 پاسگاه حفاظتی - 2 پایگاه اطفای حریق دائمی - 17 پایگاه اطفای حریق فصلی می باشد و اقدامات لازم جهت مکانیابی 2 گلوگاه و 1 پاسگاه حفاظتی دیگر نیز انجام گردیده است. همچنین تعداد 45 دستگاه جی پی اس خورویی و انفرادی جهت برنامه ریزی مجدد به سازمان ارسال که تا کنون اقدامی در زمینه عودت دستگاهها جهت نصب بر روی خودروها صورت نگرفته است.

د- اقدامات پشتیبانی:

پرداخت حقوق		عقد قرارداد	
(برابر سیاست های ابلاغی حقوق پرسنل شرکتی در قالب قراردادهای منعقد شده همه ماهه بدون تاخیر بایستی پرداخت شود) میلیون ریال		(جذب نیروها در قالب شرکتی توسط کمیسیون معاملات) فقره	
مبلغ ماه های پرداخت شده	مصوب کل اعتبار	قراردادهای منعقد شده	
		محل اعتبارات ملی	محل اعتبارات استانی
۱۱۱۶۷	۱۲۱۸۵	صندوق توسعه ملی	۳

✓ توضیح اینکه از 3 قرارداد منعقد با بسیج سازندگی تعداد 2 قرارداد به مبلغ 8796 میلیون ریال جهت بکارگیری 255 نفر دیده بان اطفاء حریق به مدت 5 ماه جهت مناطق بحرانی و نیمه بحرانی حریق منعقد گردیده است که کلیه مطالبات طرف قرارداد پرداخت گردیده است. یک قرارداد جهت بکارگیری تعداد 11 نفر نیروی شرکتی به مبلغ 3389 میلیون ریال به مدت 12 ماه منعقد که تا کنون کلیه مطالبات 11 ماهه سپری شده قرارداد بدون تاخیر پرداخت گردیده است.

اهم اقدامات صورت گرفته در سال 1399 اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه

- ✓ در سال 99 تعداد 31 فقره آتش سوزی مهم در استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است که طی به میزان 120 هکتار از عرصه های منابع طبیعی آسیب وارد آمده و طعمه حریق شده است. بر این اساس حریق های رخ داده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ فقره 58 درصد و از لحاظ مساحت شاهد کاهش 33 درصدی حریق بوده ایم.
- 1- بکارگیری تعداد 255 نفر دیده بان اطفاء حریق از میان مردم بومی در قالب عقد قرارداد با بسیج سازندگی در مناطق بحرانی استان به مدت 5 ماه از سال
 - 2- تهیه و توزیع تعداد 80 دستگاه دمنده اطفاء حریق از ناحیه اداره کل منابع طبیعی، 28 دستگاه دمنده از ناحیه خیرین و تعداد 132 دستگاه دمنده از ناحیه بخشدارهای ها.
 - 3- تشکیل 17 پایگاه موقت اطفاء حریق در سطح شهرستانها و 40 اکیپ واکنش سریع در سطح ادارات منابع طبیعی، تشکیل 165 گروه 10 نفره با محوریت دهیاری ها و مردم بومی و در مناطق بحرانی
 - 4- برقراری تعامل با مدیران ارشد استان و اخذ دستور کتبی استاندار محترم، دادستان محترم عمومی و انقلاب استان، خطاب به مدیران کل دستگاههای اجرای استان، فرمانداران و به تبع آن دهیاران، بخشداران در خصوص مشارکت همه جانبه با نیروهای منابع طبیعی استان
 - 5- برقراری تعامل و اخذ دستور دادستان محترم نظامی و فرماندهان محترم نظامی و انتظامی استان در خصوص همکاری همه جانبه نیروهای تحت الامر با نیروهای منابع طبیعی استان
 - 6- برگزاری مستمر جلسات هماهنگی مدیریت بحران استان و تشکیل 14 جلسه کمیته حفاظت در سطح شهرستانهای و اخذ و ابلاغ دستور 6 ماده ای استاندار محترم به فرمانداران شهرستانهای تابعه
 - 7- ایجاد پوشش بیمه بی نام حداقل به تعداد 100 نفر برای افراد شرکت کننده در حریق که در صورت بروز حادثه از آن استفاده شود.
 - 8- صدور ابلاغ برای معاونین محترم استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران به عنوان مدیر بحران و رییس ستاد اطفاء حریق
 - 9- اخذ و ابلاغ دستور معاون محترم عمرانی استاندار به شهرداران در خصوص انتقال امکانات و تجهیزات آتش نشانی مناطق سردسیر به گرم سیر و بالعکس و همچنین ابلاغ به ریاست محترم دادگستری استان در خصوص برخورد قاطع با خاطیان و مسببین حریق
 - 10- اجرای 208 فقره حکم قضایی خلع ید عرصه های منابع طبیعی از ید متصرفین به مساحت 336.41 هکتار
 - 11- اجرای 96 فقره جلوگیری از تخریب و تصرف در عرصه های منابع طبیعی به مساحت 140 هکتار

معاونت آبخیزداری

برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99

اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
								اول	دوم	سوم	چهارم
1	*اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخیزداری در سطح حوزه‌های آبخیز استان	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت امور جنگل	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	8754	7003	هکتار	10	25	53	80
2	شناسایی و رقومی سازی اطلاعات توصیفی و مکانی اقدامات انجام شده بر اساس مطالعات تفصیلی-اجرایی طرح‌های قبلی	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	11050	8840	هکتار	10	25	53	80
3	مطالعه و اجرای عملیات پایدارسازی زمین لغزش و فرسایش گالی	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	0	0	حوزه	0	0	0	0
4	استفاده از فن آوری‌ها و الگوهای جدید در کنترل فرسایش خاک و حفاظت آب بر اساس دستاورد های تحقیقاتی		تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	130	104	هکتار	10	25	53	80
5	اشاعه مدل هفت گام اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز با مشارکت همه بخش ها	کلیه واحدهای ستادی، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	-	فنی - اجرایی	22261	17808	هکتار	10	25	53	80

*توضیح اینکه: استان کرمانشاه بیش از دو برابر پروژه های سال 1399 دارای اعتبار مازاد سال 1398 بود که در سال 1399 تخصیص یافت و بخش عمده ای از وقت و انرژی این اداره کل صرف انجام مناقصات، انعقاد پیمان و انجام تعهدات پیمان این پروژه ها گردید.

**لازم به ذکر است تا هفته گذشته طبق اعلام سازمان جنگلها مقرر بود معادل 70 درصد از تعهدات اجرایی انجام گیرد علی رغم این موضوع استان کرمانشاه تاکنون 80 درصد از تعهدات خود را انجام داده است.

اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

ردیف	برنامه اجرایی تحقق اهداف در سال 99	واحد همکار	الزامات	نوع فعالیت	هدف کمی	عملکرد ماه	واحد	زمان اجرا (سه ماهه) %			
								اول	دوم	سوم	چهارم
1	اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه‌های آبخیز استان (کنترل سیلاب و آبخوانداری)	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	1040	832	هکتار	10	25	53	80
3	اجرای طرح‌های کنترل سیل در حوزه‌های سیل خیز بحرانی استان	ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	0	0	هکتار	0	0	0	0
4	شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد پخش سیلاب در استان	دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک، دفتر مهندسی و مطالعات، معاونت امور جنگل	تخصیص اعتبار	فنی - اجرایی	0	0	هکتار	0	0	0	0
5	استفاده از فن آوری های نو و مدل های جدید در کنترل سیل و تغذیه آبخوان ها با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی			فنی - اجرایی	1	0	مورد	10	25	53	80

عناوین ضوابط و معیارهای فنی (ردیف 2) : 1- مکانیابی، طراحی و اجرای پارک آبخیز 2- مکانیابی، طراحی و اجرای سیستم های پخش سیلاب 3- تعیین حریم طرح ها و پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 4- روش های غیرسازه ای پیشگیری و مهارسیلاب در حوزه های آبخیز 5- مدیریت سیلاب در حوزه های آبخیز شهری 6- طراحی و اجرای سامانه های آنگیر باران 7- نگهداری و بهره برداری طرح ها و پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 8- سازه های توری سنگی (گابیونی) 9- تدوین فرهنگ واژگان مهندسی آبخیزداری و آبخوانداری (خاتمه اجرای طرحهای آبخیزداری ، پایان سال مالی می‌باشد)





وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه



«نمودار فعالیت‌های اقدام جهش یکساله»

راهنم‌دها و انتظارات عمومی و مدیریتی ۱۸ گانه سازمان

ابلاغی از سوی دکتر منصور سرپرست سازمان جنگلها، مراتع و آبفیز داری کشور



◉ در همه حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود بدانیم و هیچ چیز را بر رضایت پروردگار و رعایت قانون ترجیح ندهیم.

◉ تعهد، پاکدستی، تلاش و کوشش مضاعف، هماهنگی و همکاری، پرهیز از حواشی، عیوب را در کنار انتقاد سازنده و دلسوزانه سرلوحه کلیه اقدامات خود قرار دهیم. در همین راستا حضور در نمازهای جماعت اول وقت انشاالله رحمت و عنایت حق تعالی را برای آن به دنبال خواهد داشت.

◉ نظارت و بازرسی مستمر از عوامل انجام کار بر مبنای اصل پیشگیری از وقوع تخلف و نه مجبوری، بدیهی است که همواره پیشگیری از تخلف بر کشف آن و مجازات متخلف اولویت دارد و موجب ارتقاء سطح توانمندی، رضایت شغلی، مقبولیت سازمانی و ارتقاء سلامت نظام اداری خواهد بود.

◉ ارتقاء و افزایش دانش و مهارت همکاران مرتبط با وظایف سازمانی و ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات و تجارب همکاران با استفاده از توان علمی و تجربی ارزشمند همکاران بازنشسته انجام گردد.

◉ همه فعالیتها باید مبتنی و بر اساس قانون، دستورالعمل و شیوه نامه مشخص باشد و از اقدامات سلیقه ای و بدون ضابطه اکیدا پرهیز شود. در مواردی که خلا قانون آیین نامه و دستورالعمل وجود دارد لازم است با هماهنگی پیشنهاد و پیگیری لازم جهت تدوین از طریق مراجع ذیربط درون و بیرون سازمان صورت پذیرد.

◉ تعامل سازنده مبتنی بر قانون و کلیه دستگاههای اجرایی به ویژه سازمان محیط زیست کشور به گونه‌ای که اثبات شود منابع طبیعی نه تنها مانع توسعه پایدار نیست بلکه از الزامات آن است. لیکن توسعه مورد انتظار، توسعه پایدار است. این تعامل و هماهنگی موجب می‌شود تا طرح‌های عمومی و عمرانی دولت با حداقل خسارت طراحی و اجرا و خسارت‌های احتمالی آن نیز جبران شود در این راستا هماهنگی و همراهی محیط زیست می‌تواند موثر و مطلوب باشد.

◉ رفع مغایرت‌های آماری از منابع تحت مدیریت و گزارشات عملکردی و تهیه و ارائه آمار متقن، دقیق و مستند را می‌بایست با جدیت پیگیری نماییم.

◉ همکاری، هماهنگی و ارتباط کامل و دوسویه با دستگاه‌های نظارتی و استفاده از گزارشات و اجرای پیشنهادات قانونی و اجرایی آنها در سرلوحه کارها باشد.

◉ در گزینش و انتخاب مسئولین و عوامل انجام کار علاوه بر تعهد و پاکدستی که شاخص اساسی و مبنایی تخصصی و تجارب مورد نیاز و مرتبط رعایت گردد.

◉ در راستای بهبود امور، انجام ارزیابی‌های دوره‌ای از نحوه انجام فعالیتها و نیز مستندسازی و اطلاع رسانی از عملکردها در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد.

◉ به امور رفاهی همکاران و برخورداری حداکثری آنان از مزایا و امکانات در چهارچوب مقررات توجه گردد.

◉ جلسات دوره‌ای منظم توسط معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات با کارشناسان واحدهای تحت مدیریت جهت استفاده از پیشنهادات و انتقادات سازنده و مبادله اطلاعات برگزار گردد.

◉ ارتباط منطقی، هدفمند و سازنده با ائمه محترم جمعه و جماعات، استناداران محترم، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و نهادهای مدنی محلی و استفاده از ظرفیت‌های معنوی و قانونی آنان برای شناخت و ارتقای کمی و کیفی منابع طبیعی و آبفیزداری کشور برقرار گردد.

◉ رعایت سلسله مراتب در مکاتبات و اجرای وظایف در کنار امکان اظهار نظر آزاد در قالب جلسات مورد انتظار و تاکید می‌باشد.

◉ ارتباط مستمر، منظم و هدفمند با مجامع علمی، دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، انجمن‌های علمی و صنفی، تعاونی‌های منابع طبیعی، سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای سازنده اجرایی آنان مورد توجه قرار گیرد.

◉ توجه و اهتمام به توسعه دولت الکترونیک و اجرای کامل اتوماسیون اداری و استفاده از روش‌های نوین انجام کار و نرم‌افزارهای تدوین شده در کنار شیوه نامه‌های ابلاغی می‌توانند در جلوگیری از تخلفات احتمالی و شفافیت اقدامات بسیار موثر باشد.

◉ تلاش برای افزایش اعتبارات جاری و عمرانی و نیز دریافت حقوق دولت و استفاده بهینه، شفاف و حداکثری از اعتبارات و امکاناتی که به عنوان بیت‌المال و به صورت امانت در اختیار داریم.

◉ شاغلین مجموعه سازمان متبوع به ویژه مدیران و کارشناسان فنی اجرایی، می‌باید حضور مستمر و موثر در عرصه‌های تحت مدیریت داشته باشند. این امر علاوه بر ایجاد ارتباط موثر کارشناسان با مجریان و تبادل اطلاعات، یقیناً به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش کمی و کیفی حفاظت منابع طبیعی خواهد شد.




کشور بایستی قوی بشود... و «جهش تولید» هم که بنده
امسال مطرح کردم، در واقع از ابزارهای قدرت است.
(رهبر معظم انقلاب، بیانات نوروزی سال ۱۳۹۹)




طرح ۹۹ در ۹۹

- ۱ آبخیزداری و آبخوانداری (مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی)
- ۲ مقابله با بیابان زایی
- ۳ صیانت از جنگل های کشور
- ۴ توقف بهره برداری چوب از جنگل های هیرکانی و اجرای طرح جایگزین


ارزیابی عملکرد اهداف 9گانه

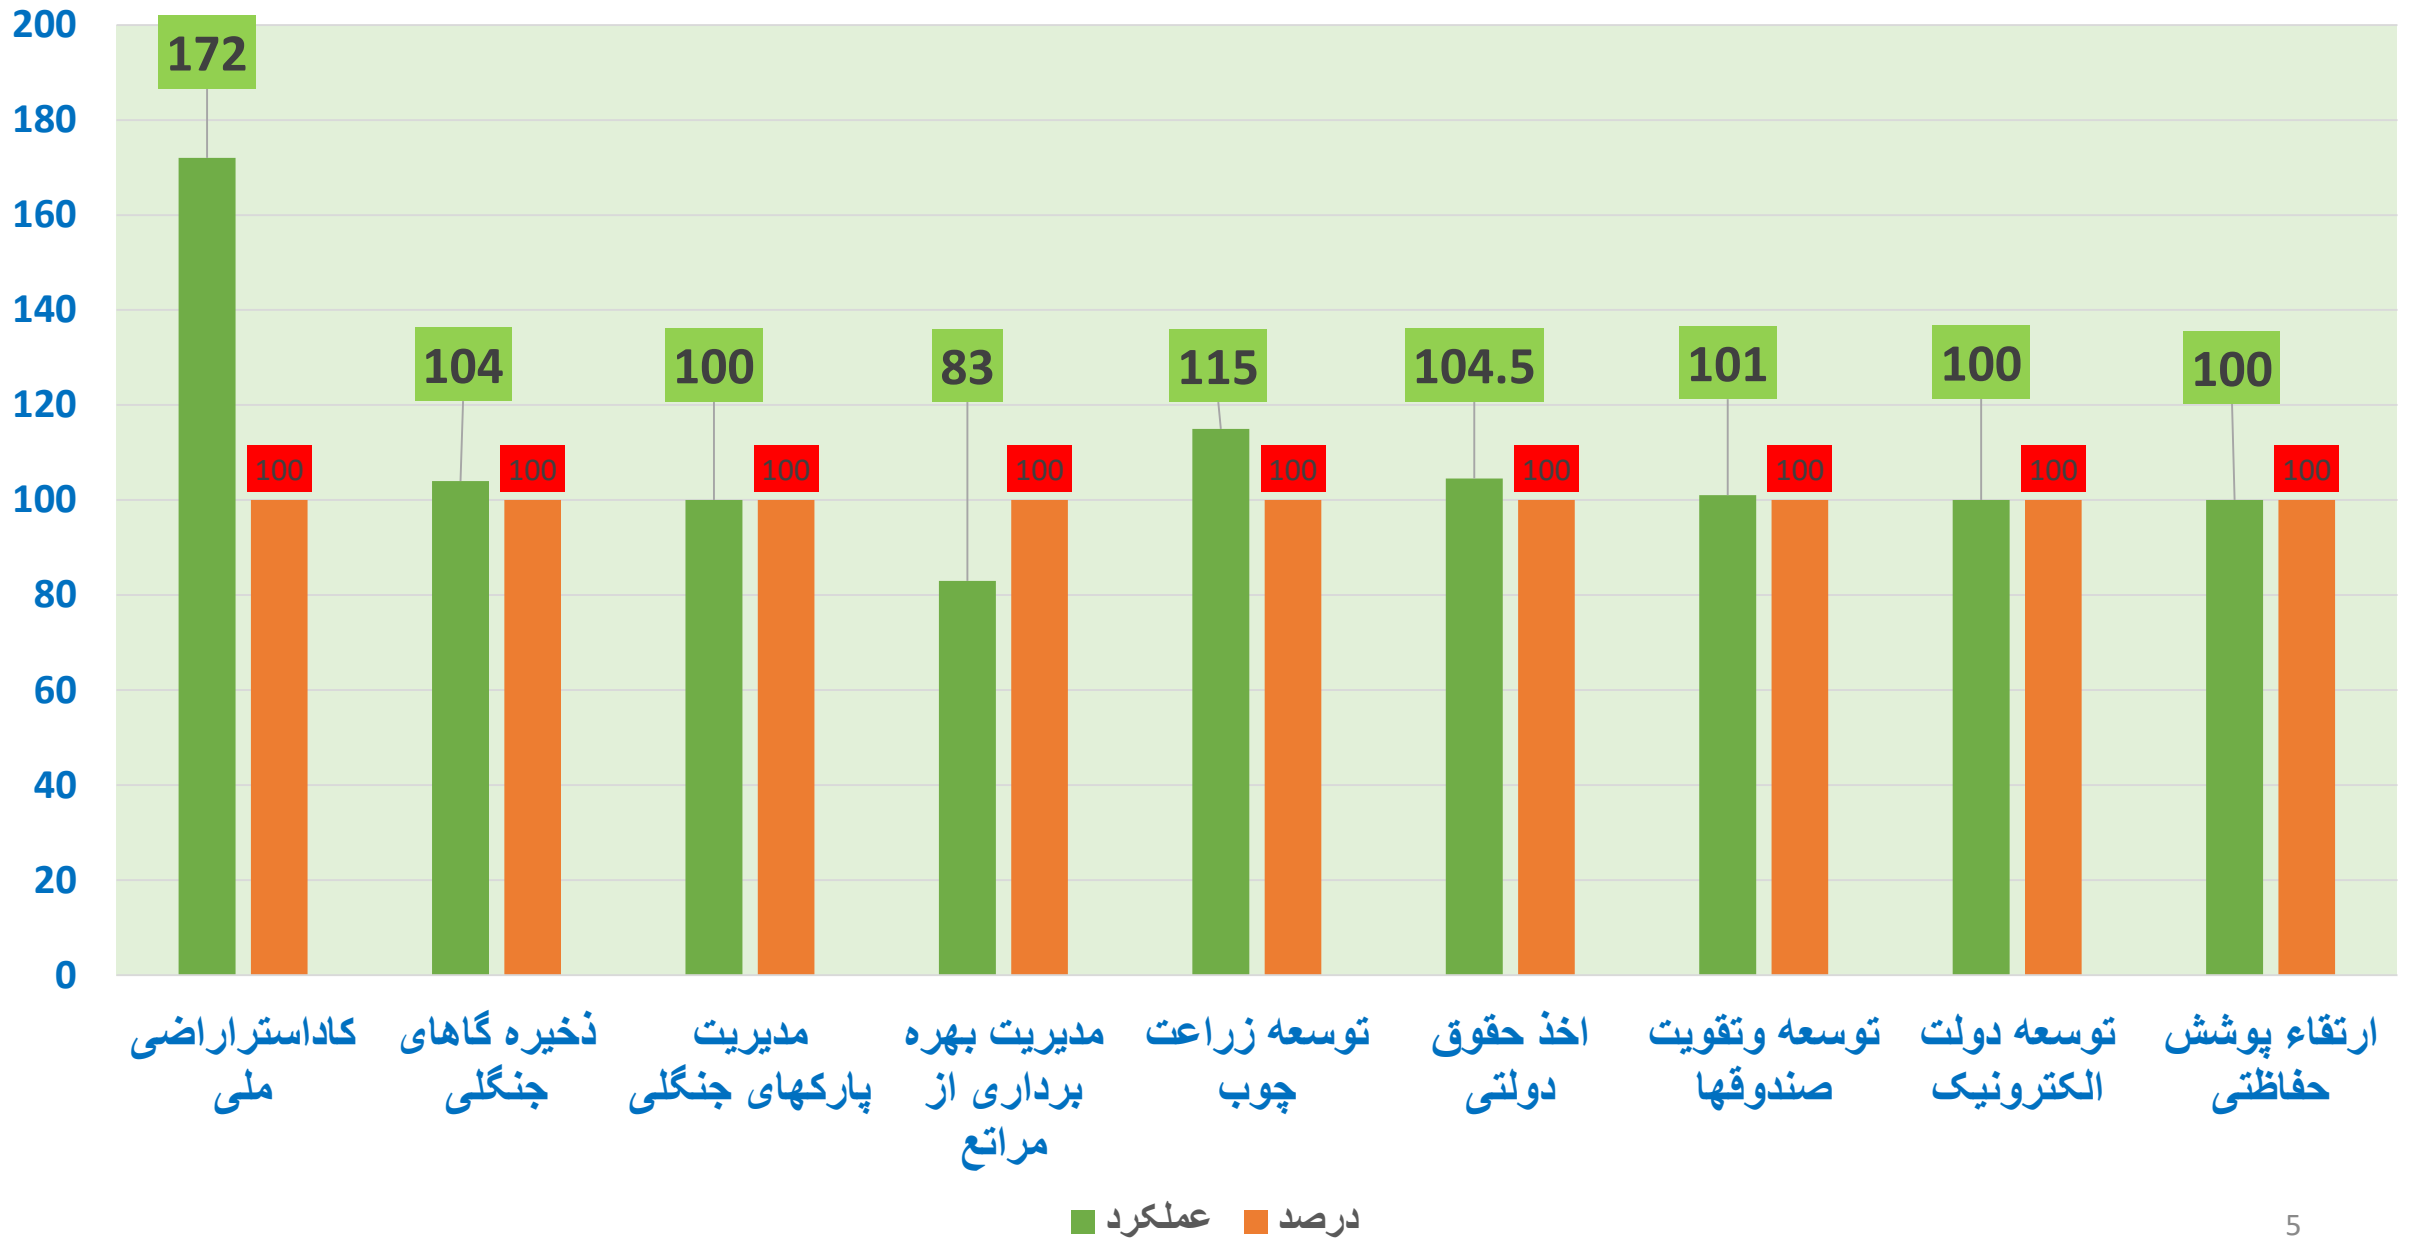


4 طرح محوری

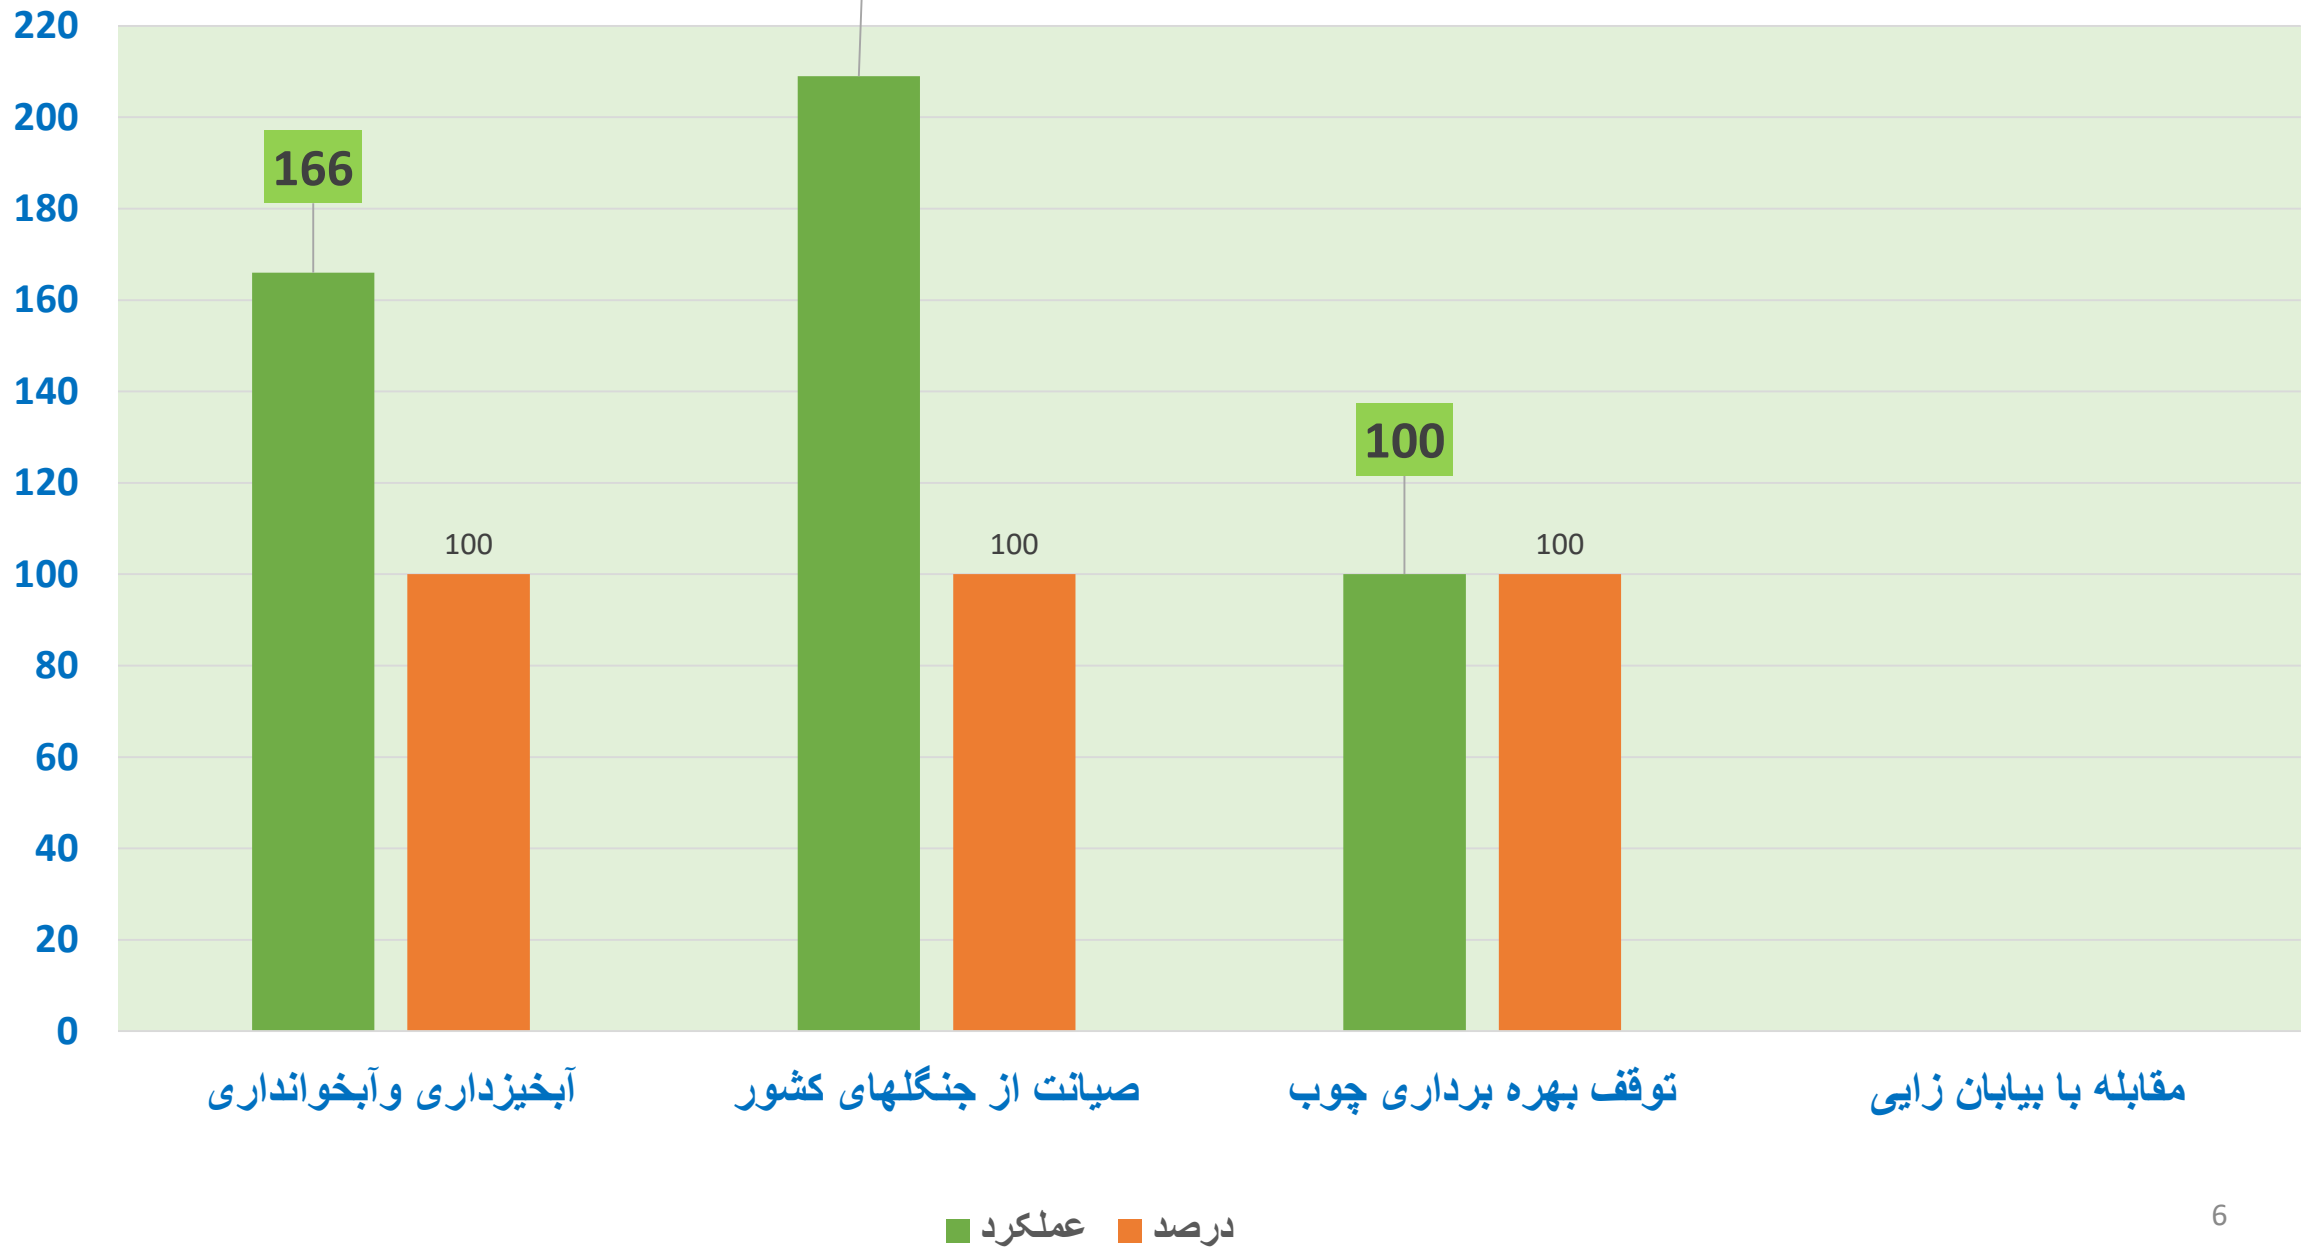

عملکرد کلی طرح های به تفکیک معاونت ها

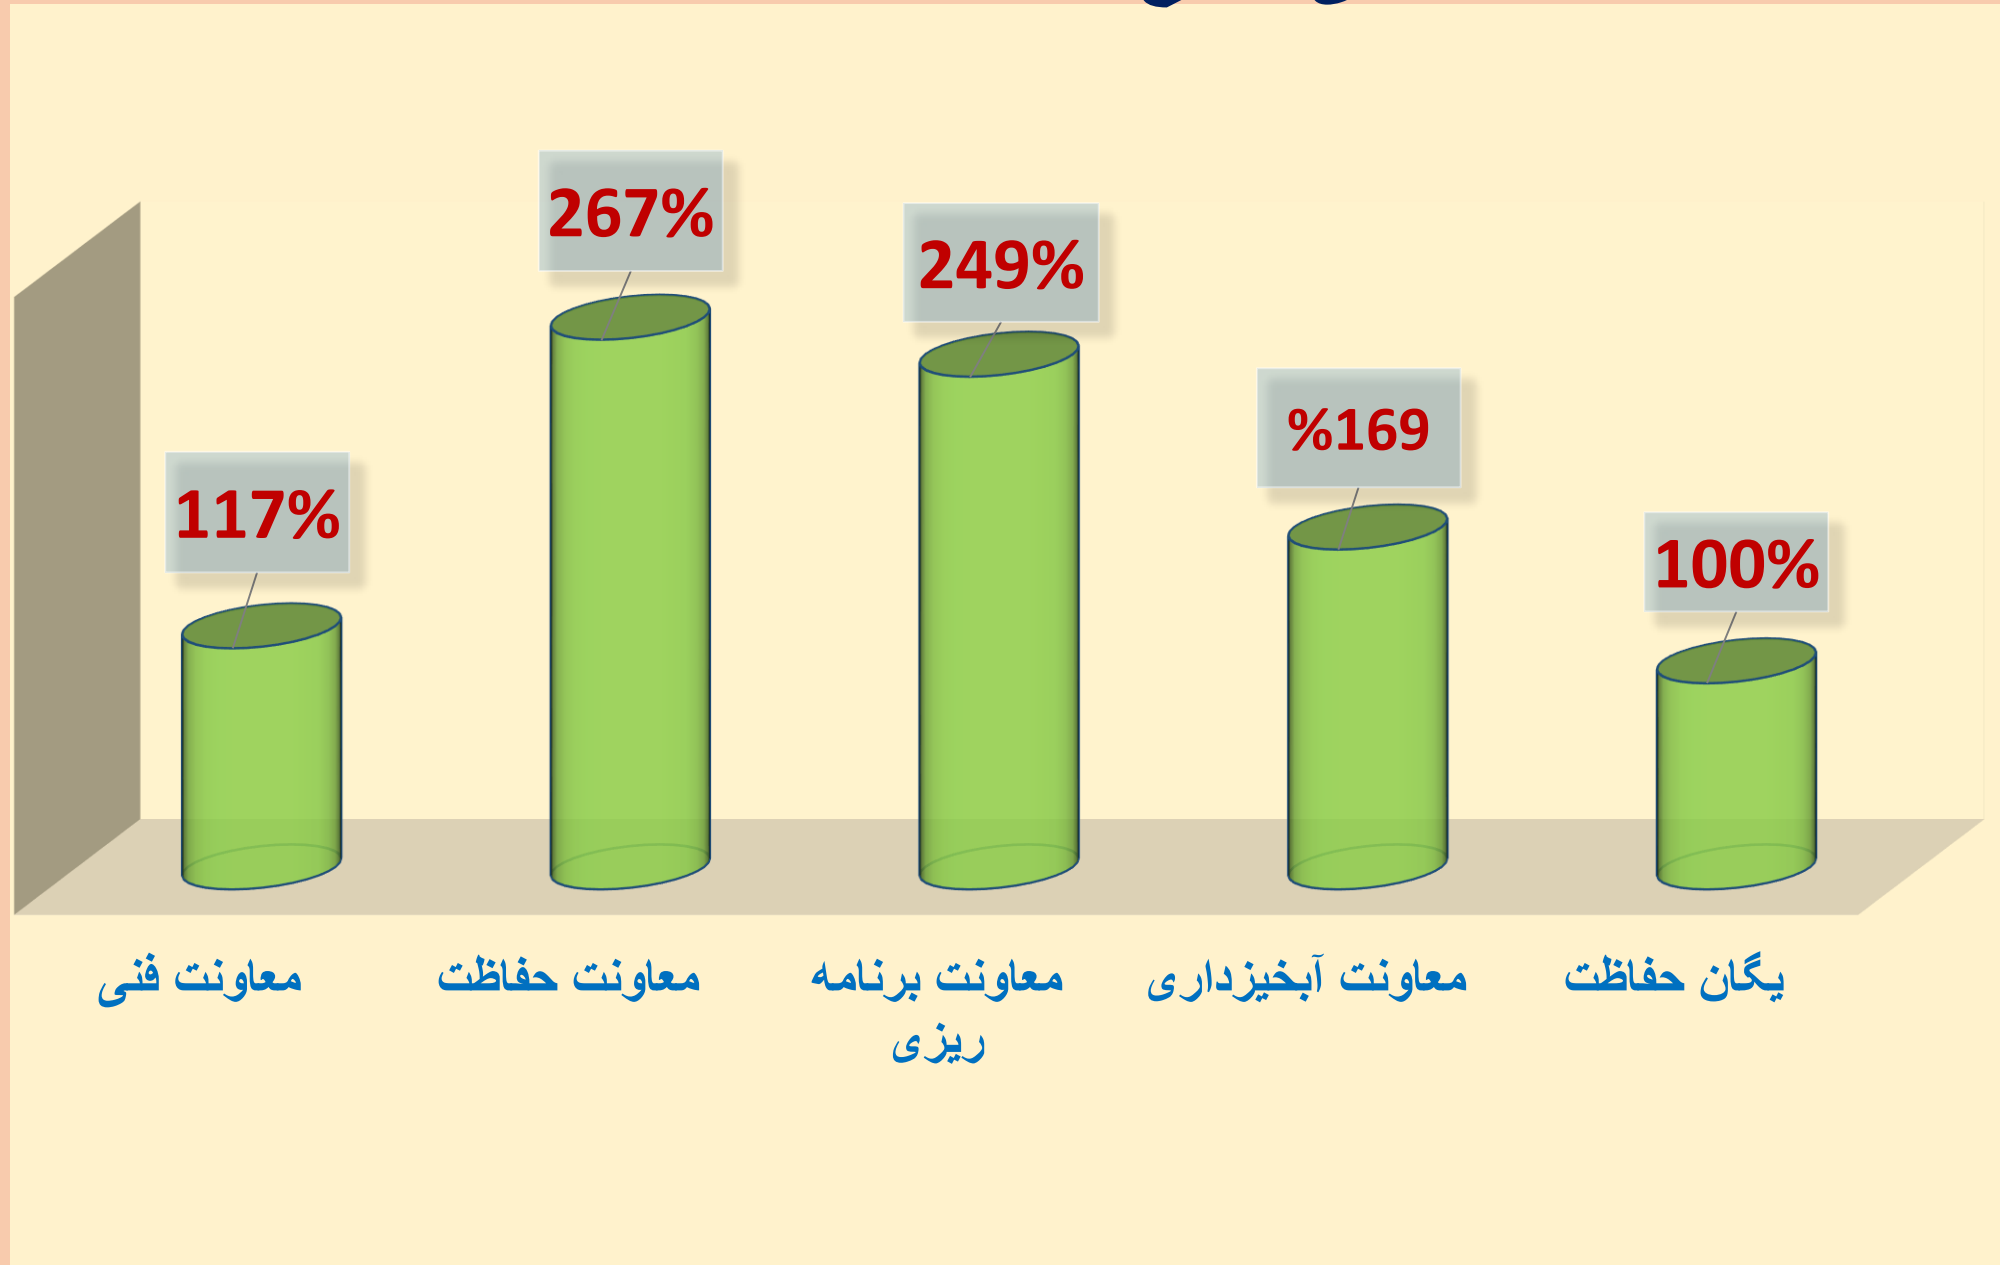

عملکرد کلی تعهدات به تفکیک معاونت ها

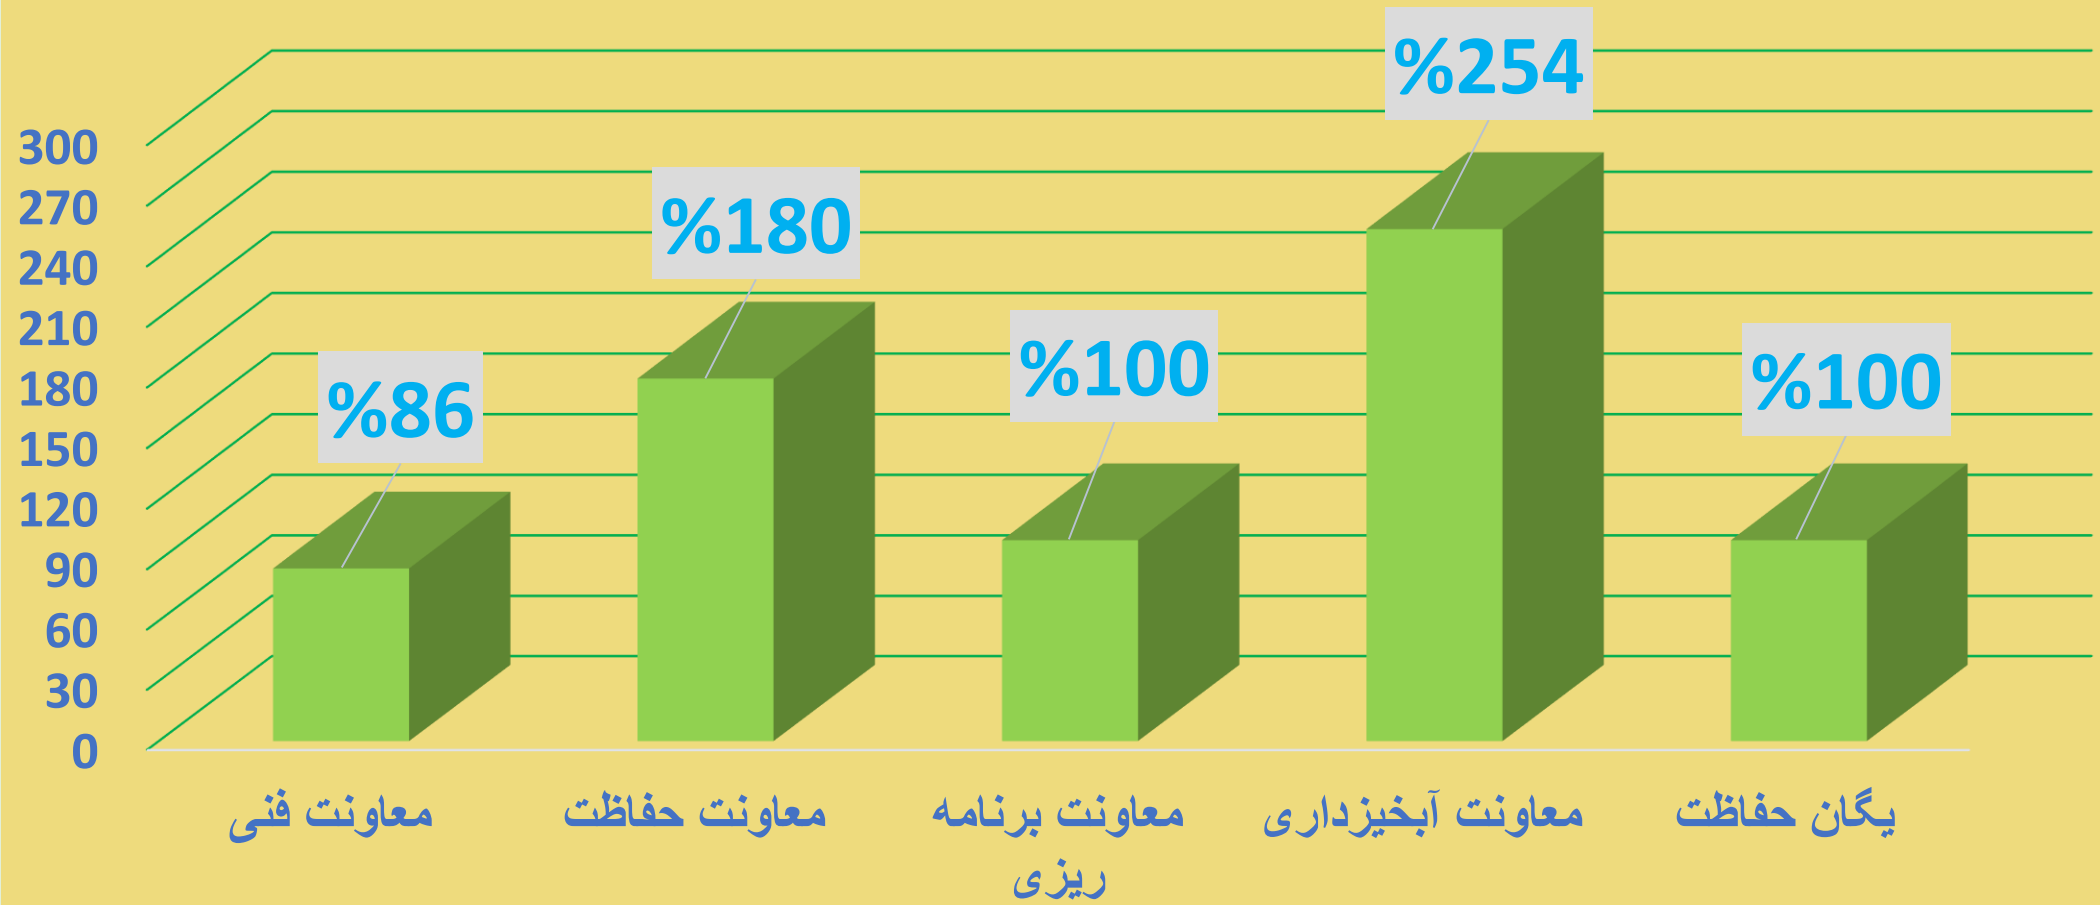

اجرای برنامه احیاء، توسعه و غنی سازی با نهال و بذر

تعهدات : 121 هکتار

عملکرد: 96 هکتار

براساس شاخص ها
و تقسیم بندی سازمان
میزان عملکرد 100 %
می باشد




عملکرد
تعهدات


صیانت از نواحی رویشی (توسعه جنگل)

عملکرد	تعهدات (هکتار)
100	210
51	90
2230	2230
40	40
740	50

غنی سازی جنگل با بذر
توسعه جنگل با نهال
عملیات اصلاحی
بهداشتی
محاوط بذرگیری
مراقبت مناطق احیایی

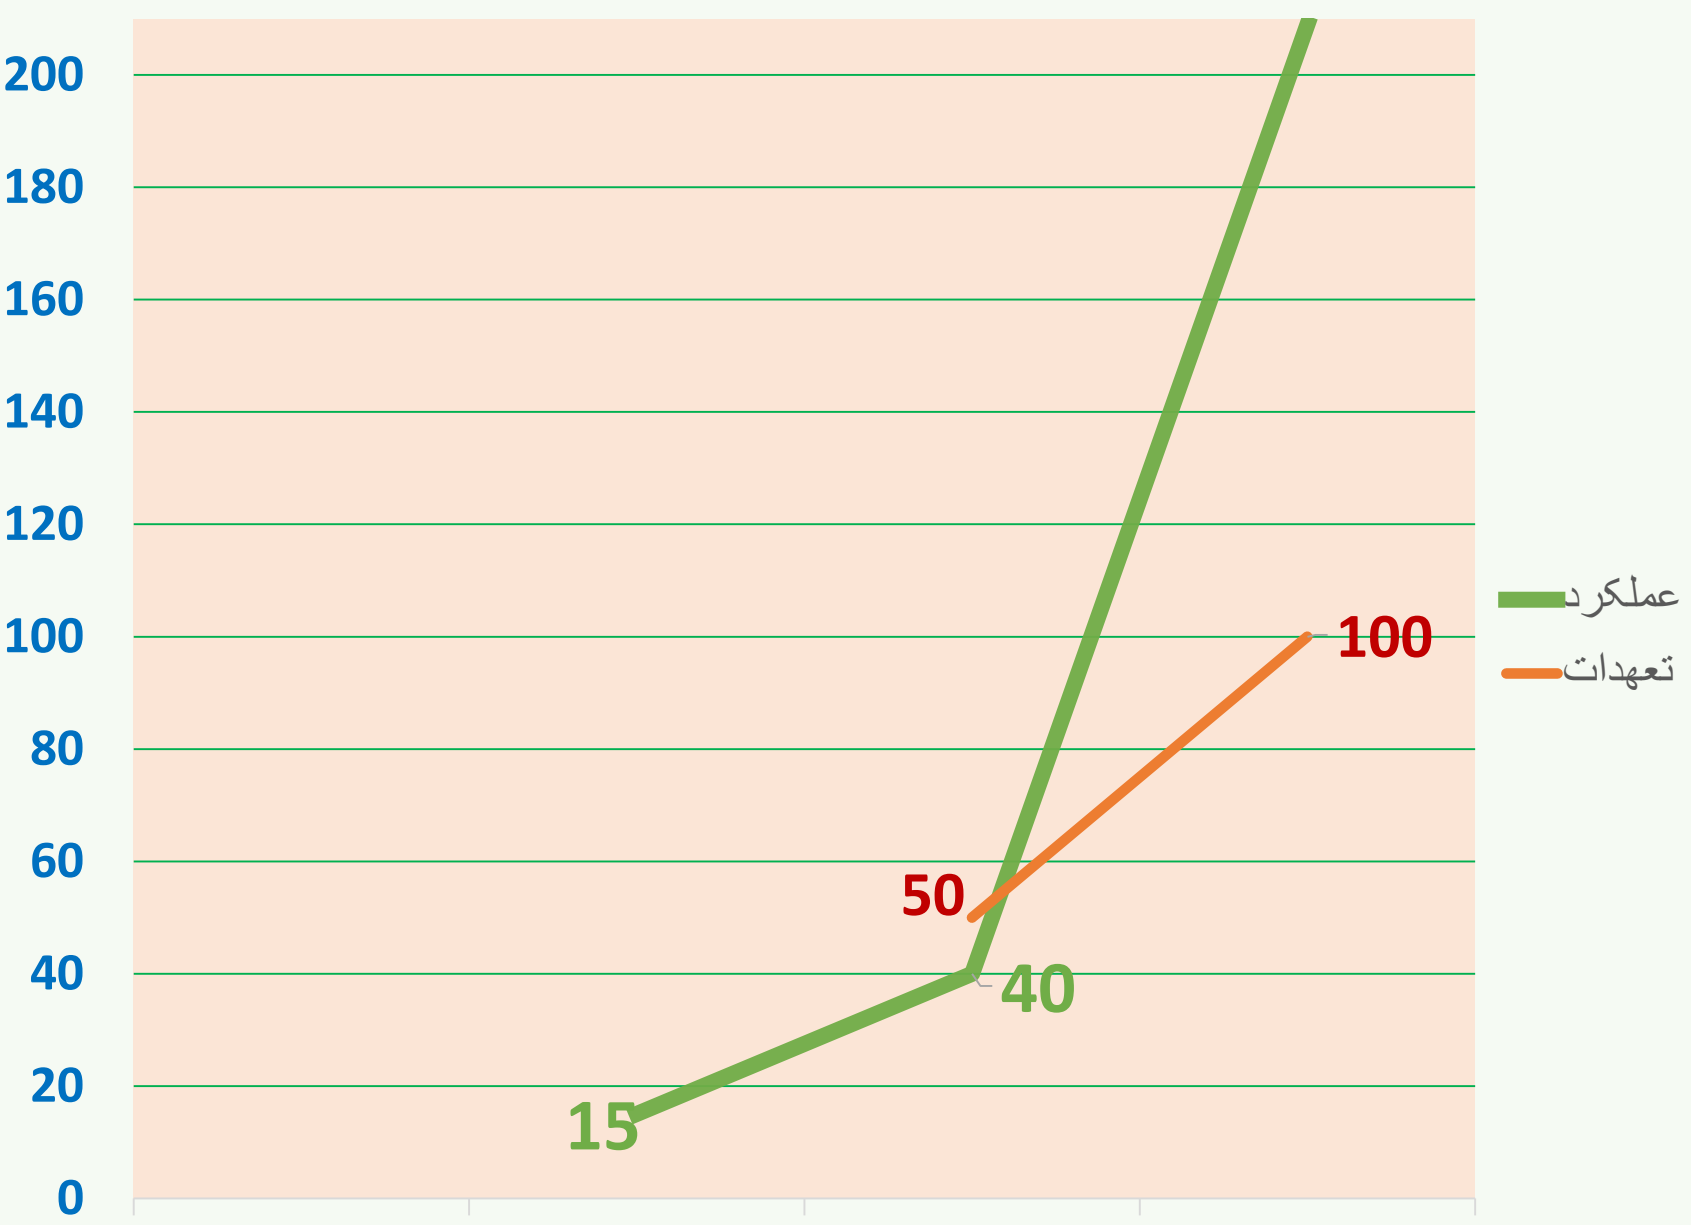

احیاء و توسعه رویشگاه های گیاهی

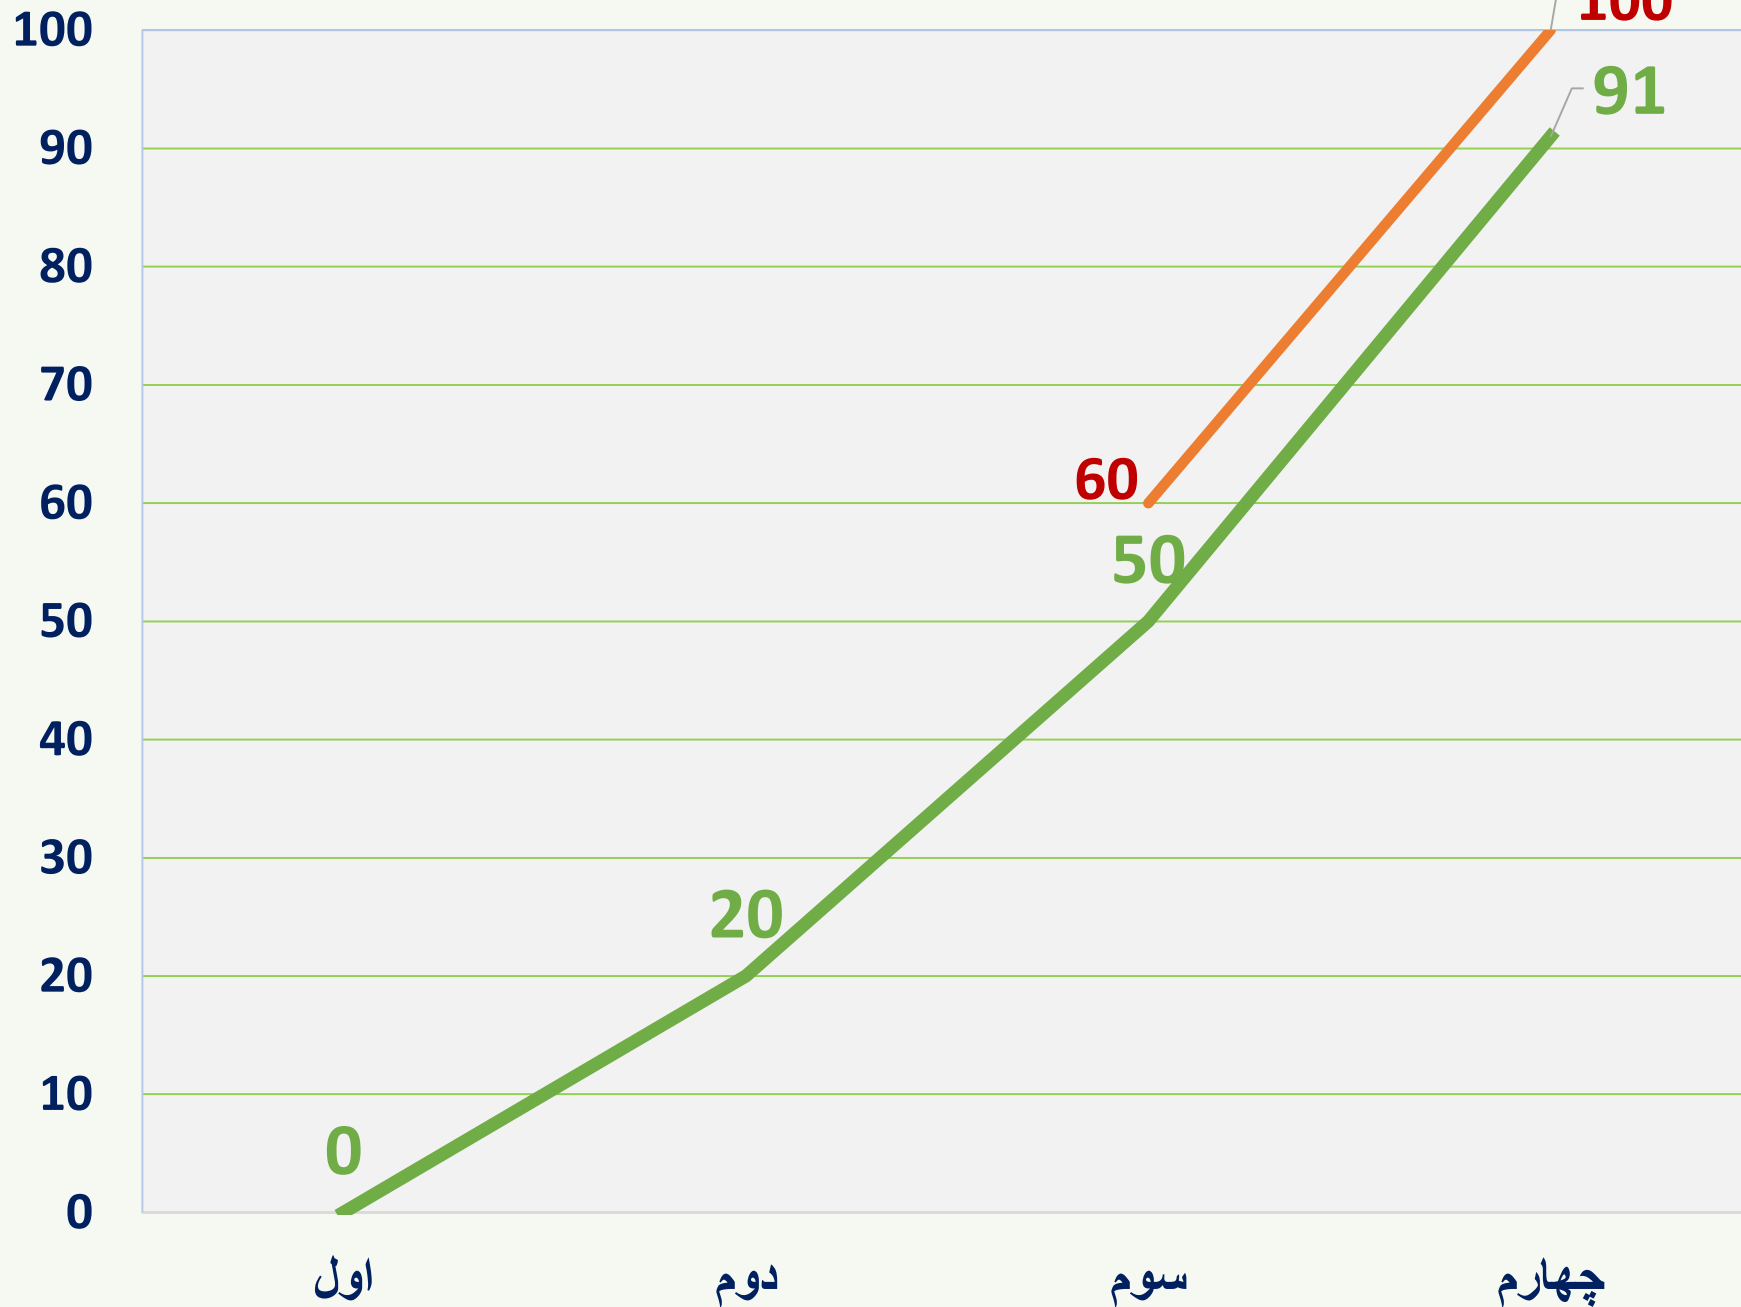


تعهدات : 3500 هکتار
عملکرد: 3170 هکتار



میزی و تنسيق مراتع

تعهدات: ۱۵۷۹۱ هكتار
عملکرد: ۱۵۷۹۱ هكتار

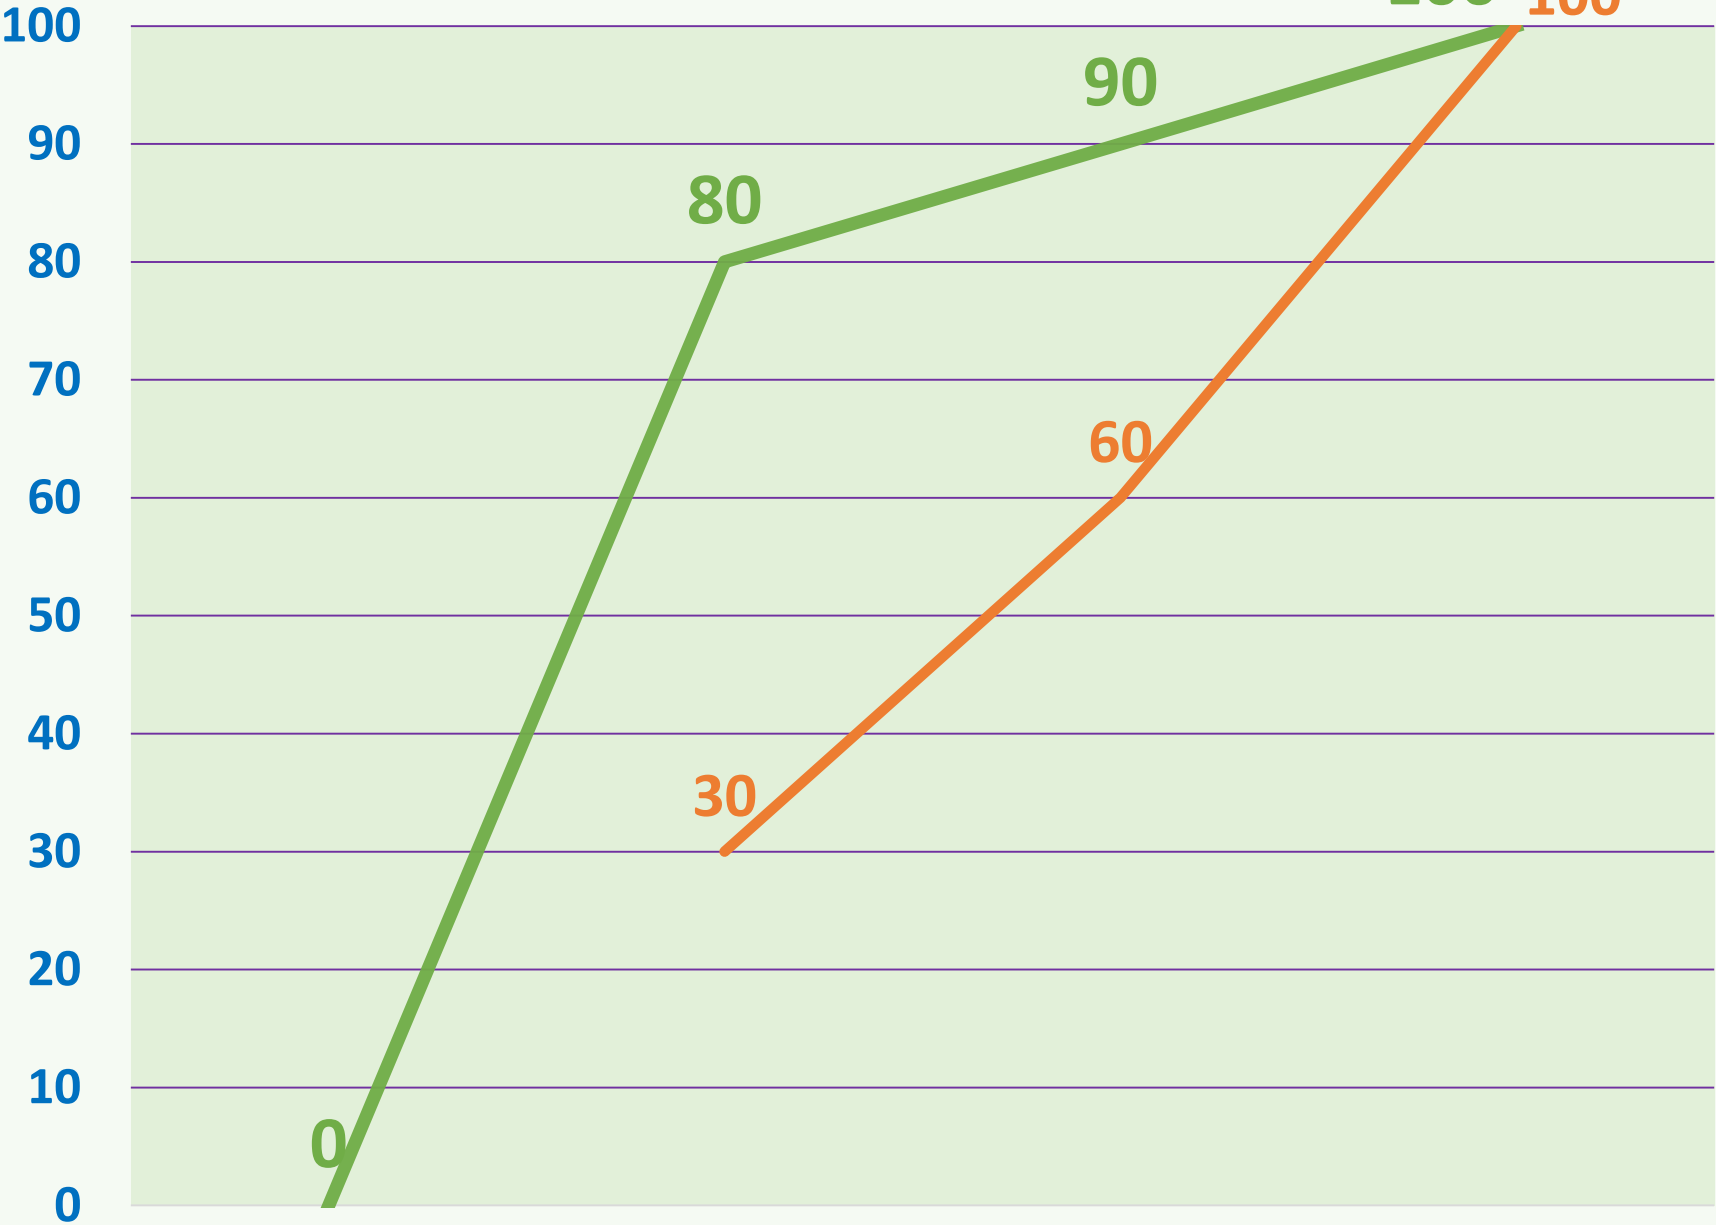

عملکرد

تعهدات

اول

دوم


سوم

چهارم

100 میلیون

اخذ عوارض پروانه چرا


میلیون ریال

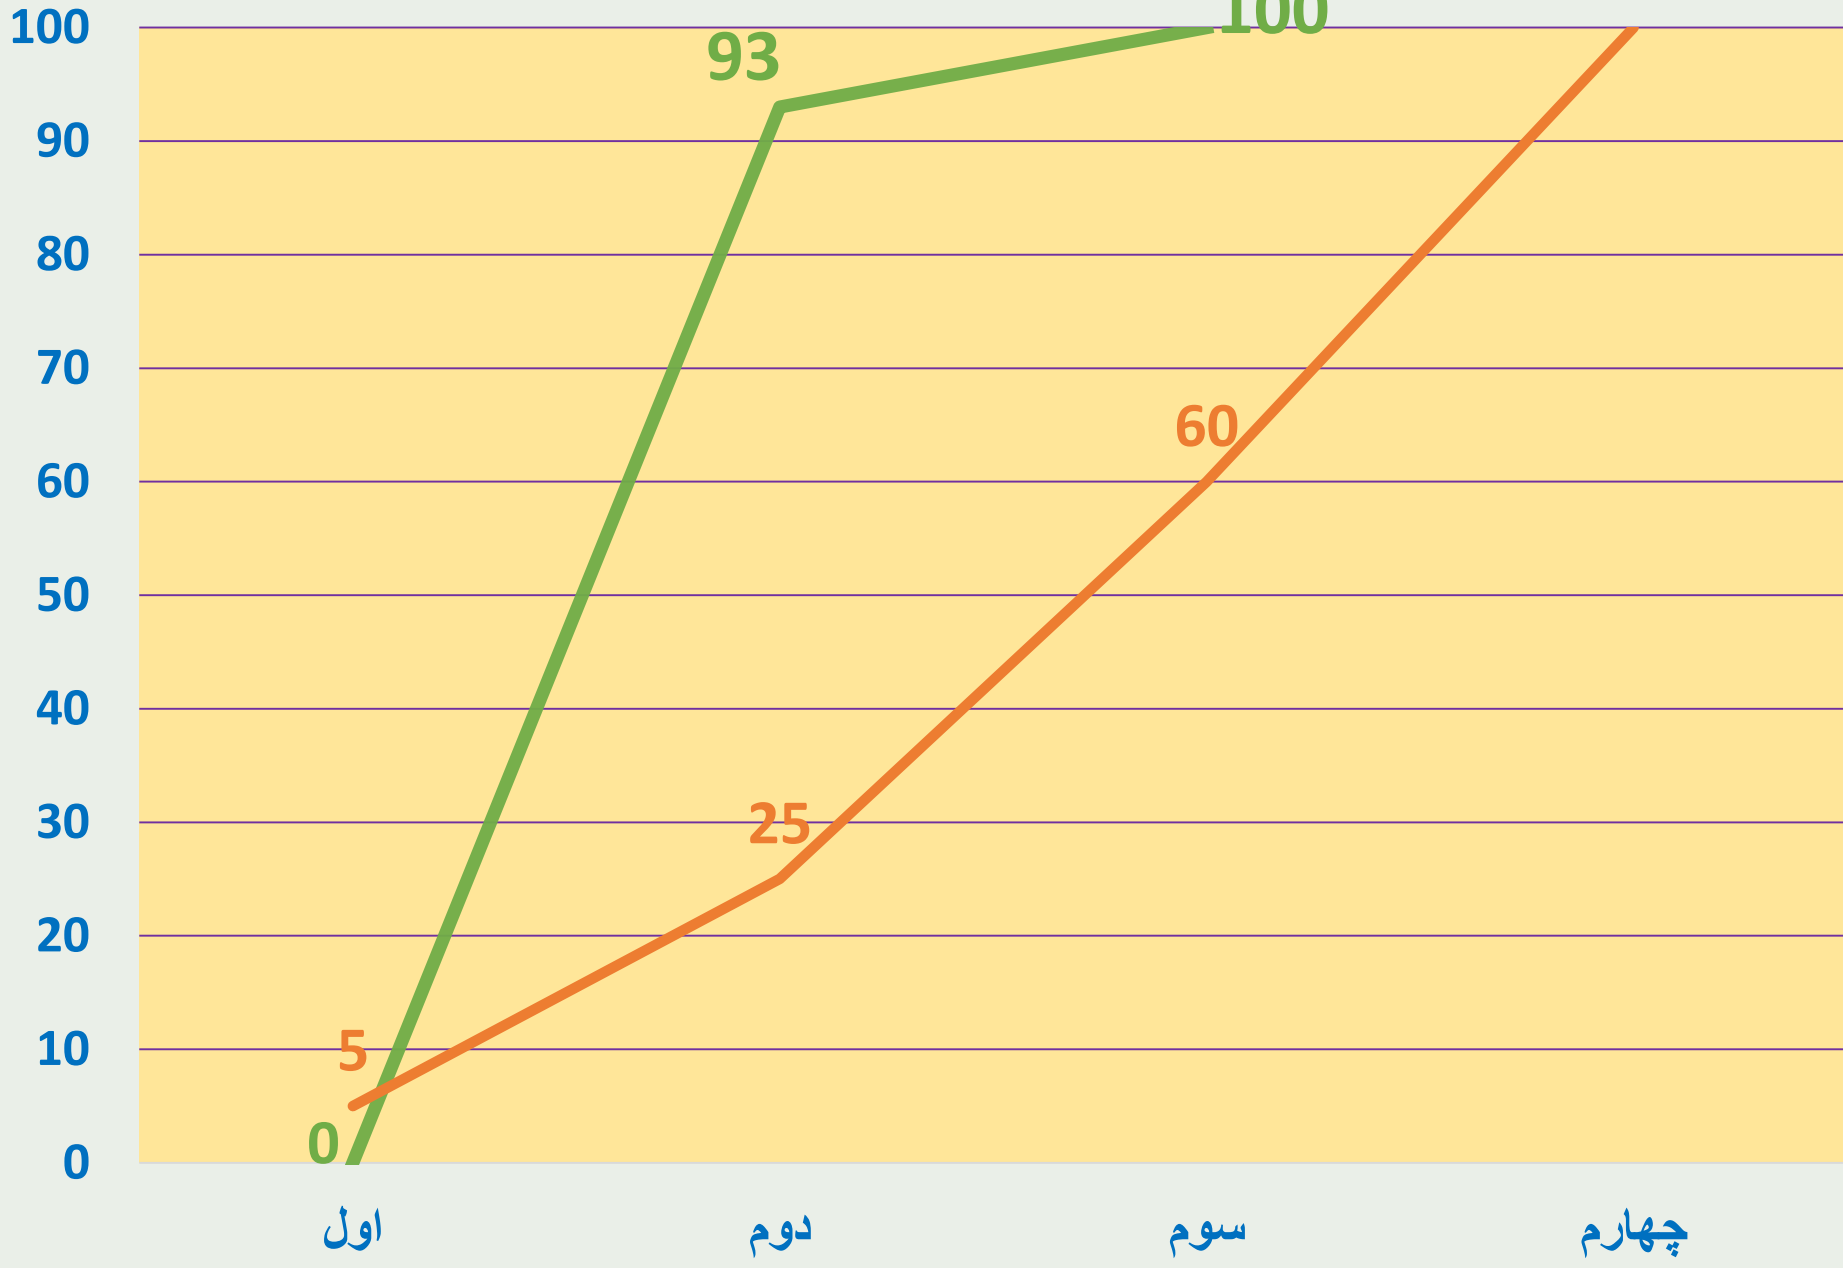

واگذاری طرح های مرتعداری

تعهدات: ۶۰۷۵۷۲ هکتار

عملکرد: ۶۳۶۶۲ هکتار

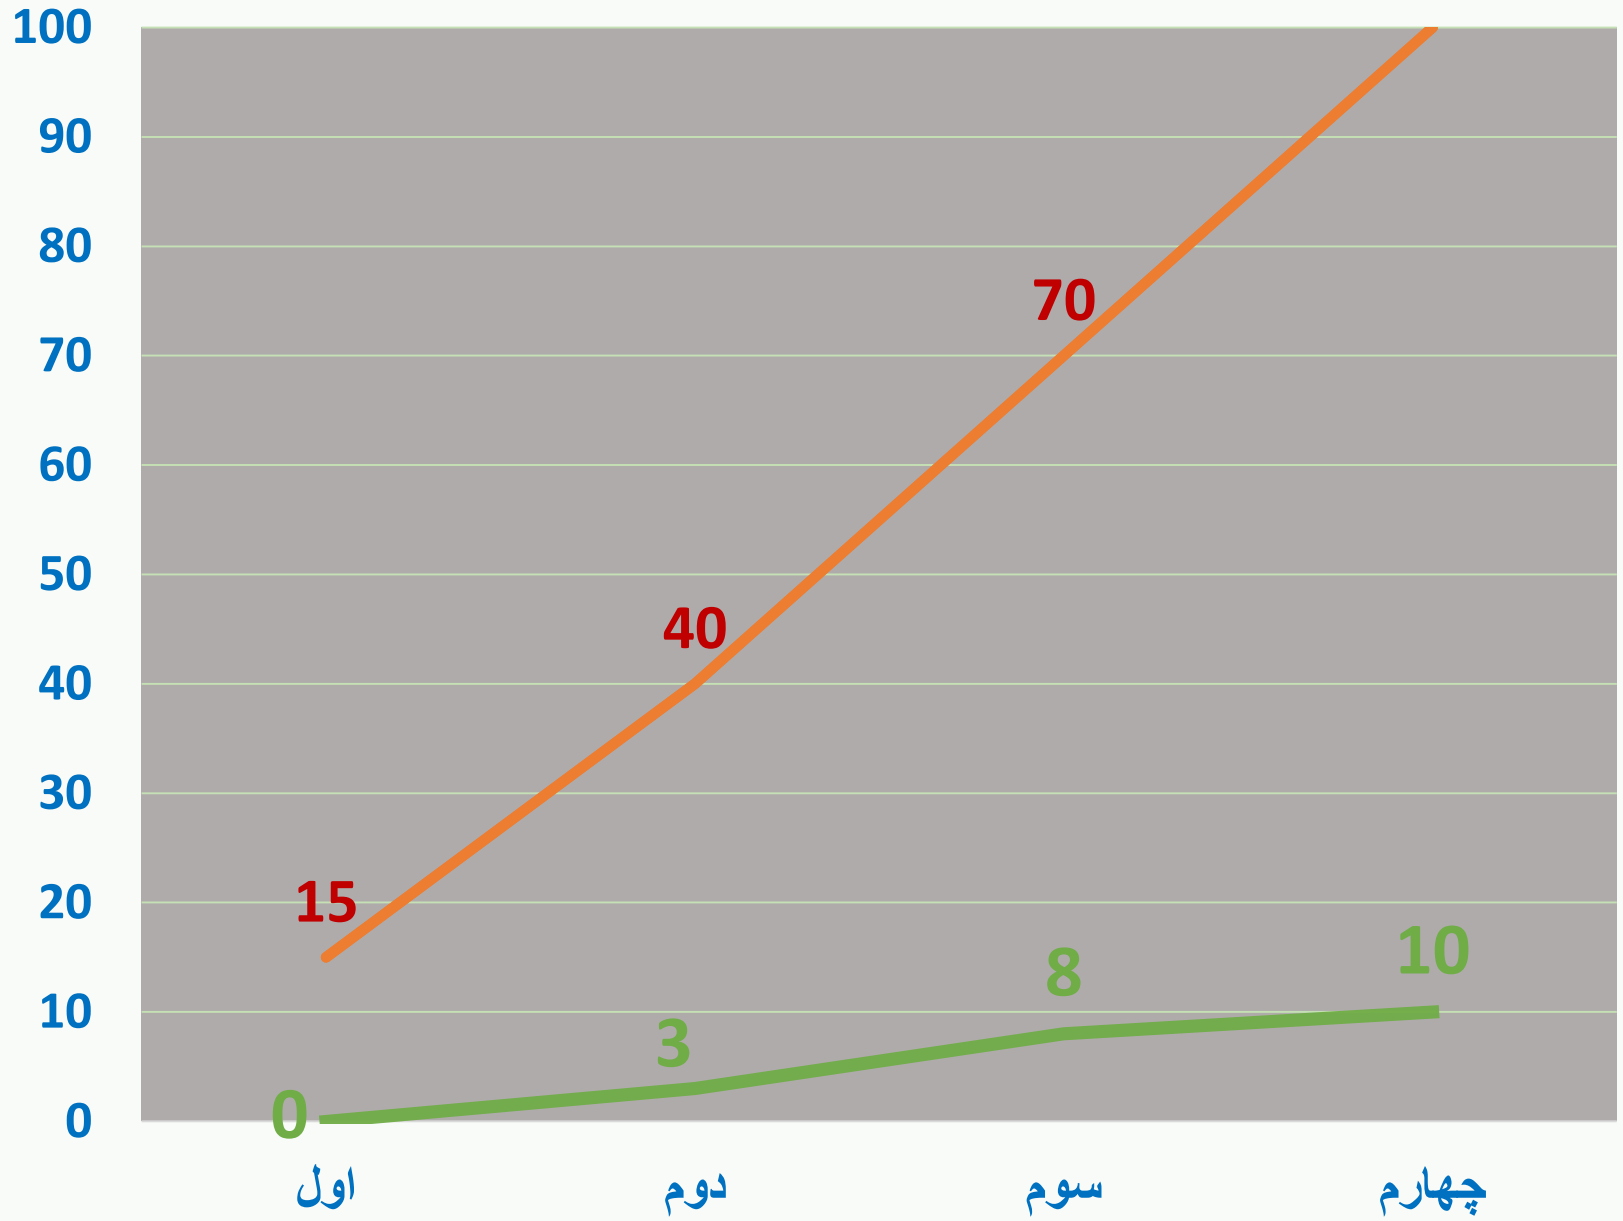


عملکرد
تعهدات

تهیه طرح حفاظت از ذخیره گاه ها

تعهدات: 5286 هکتار

عملکرد: 5286 هکتار

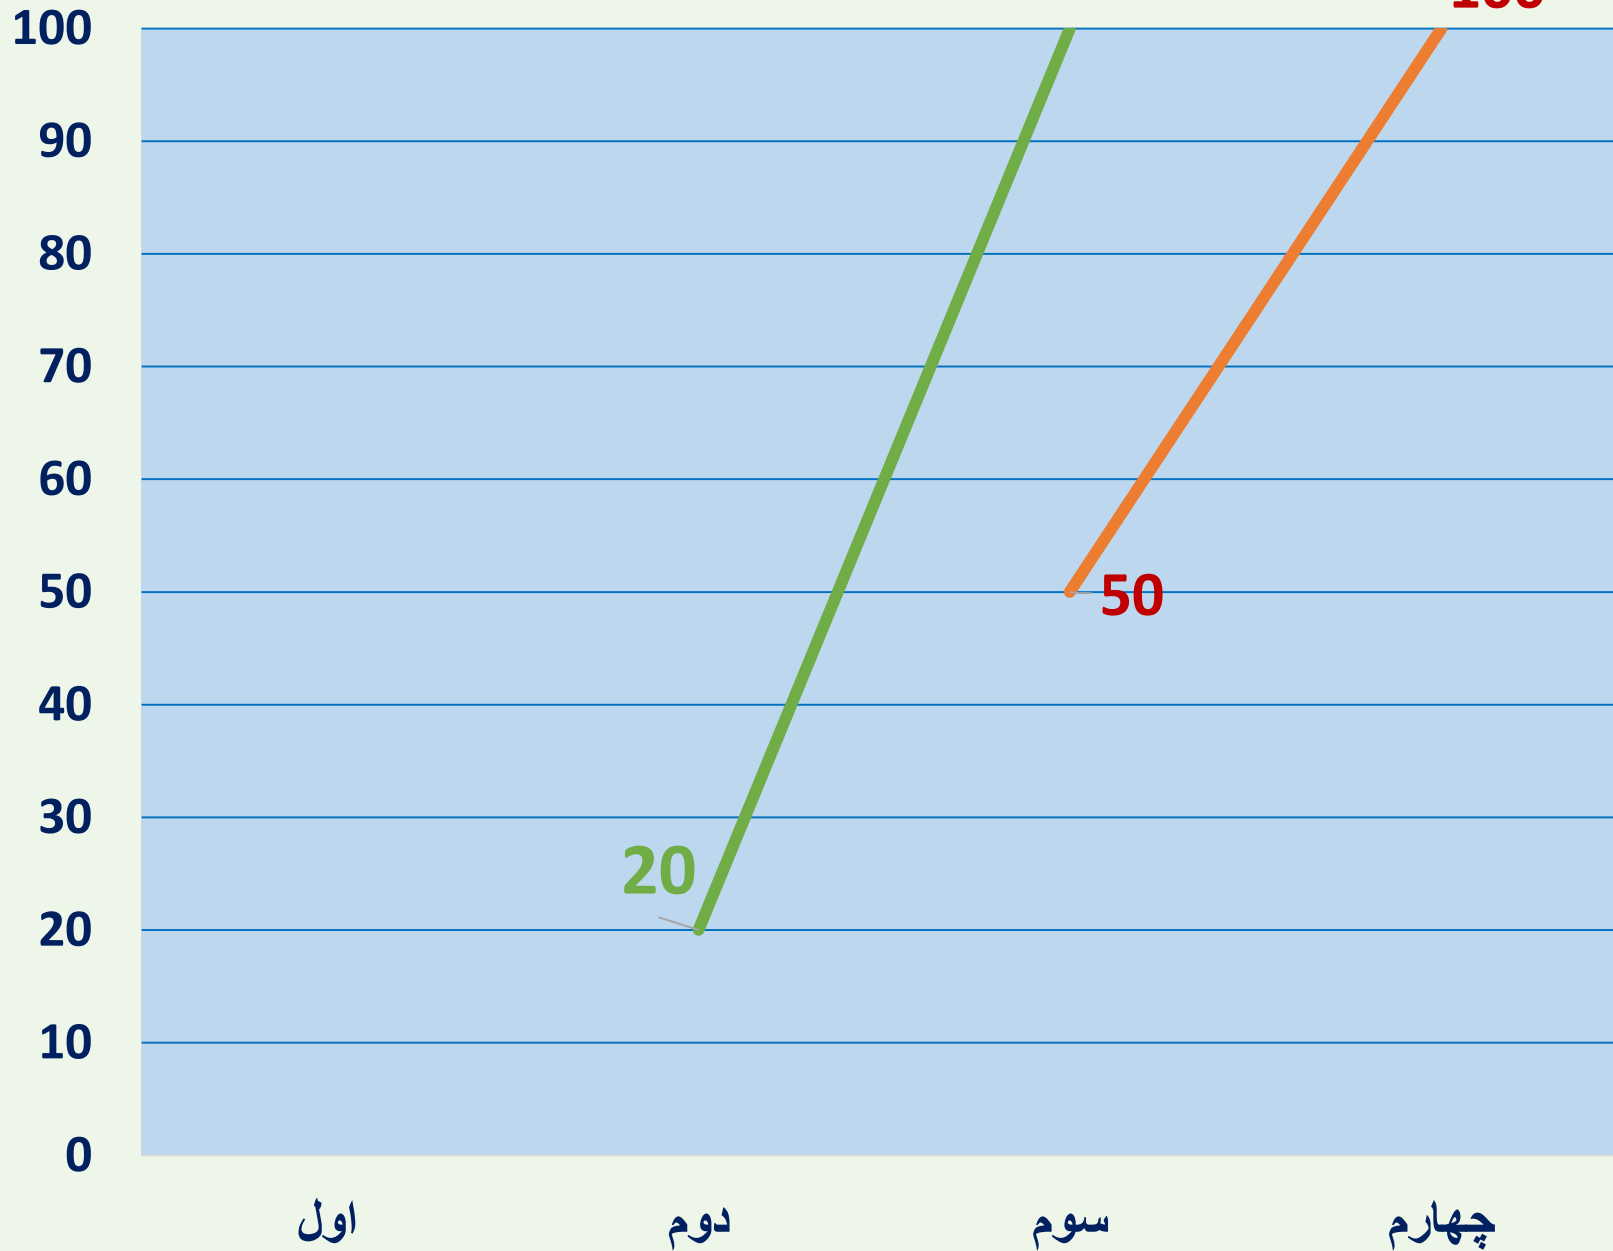


تعهدات
عملکرد

تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی


عملکرد
تعهدات

تعهدات : ۲۳۱۰۰۰ هکتار

عملکرد : ۱۴۱۰۰۱ هکتار

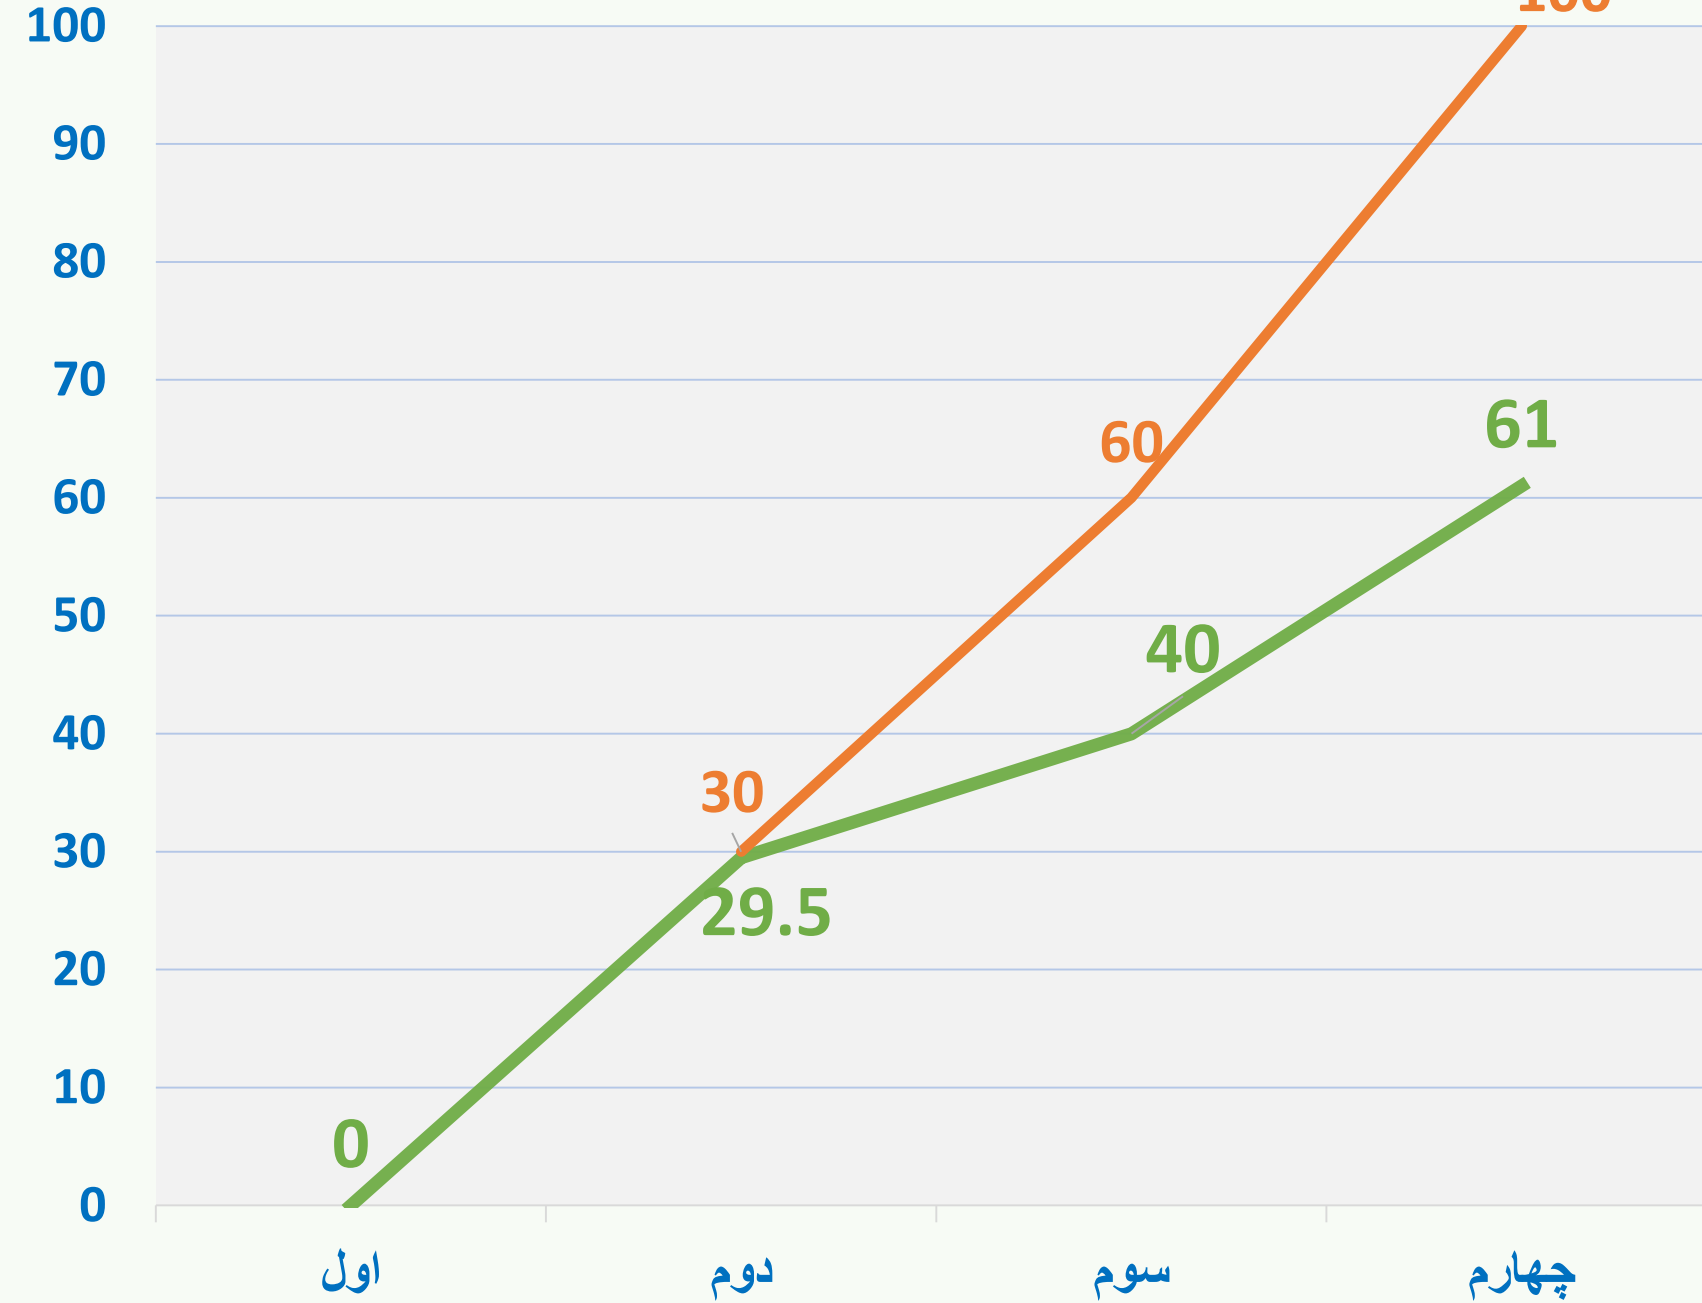

زراعت چوب

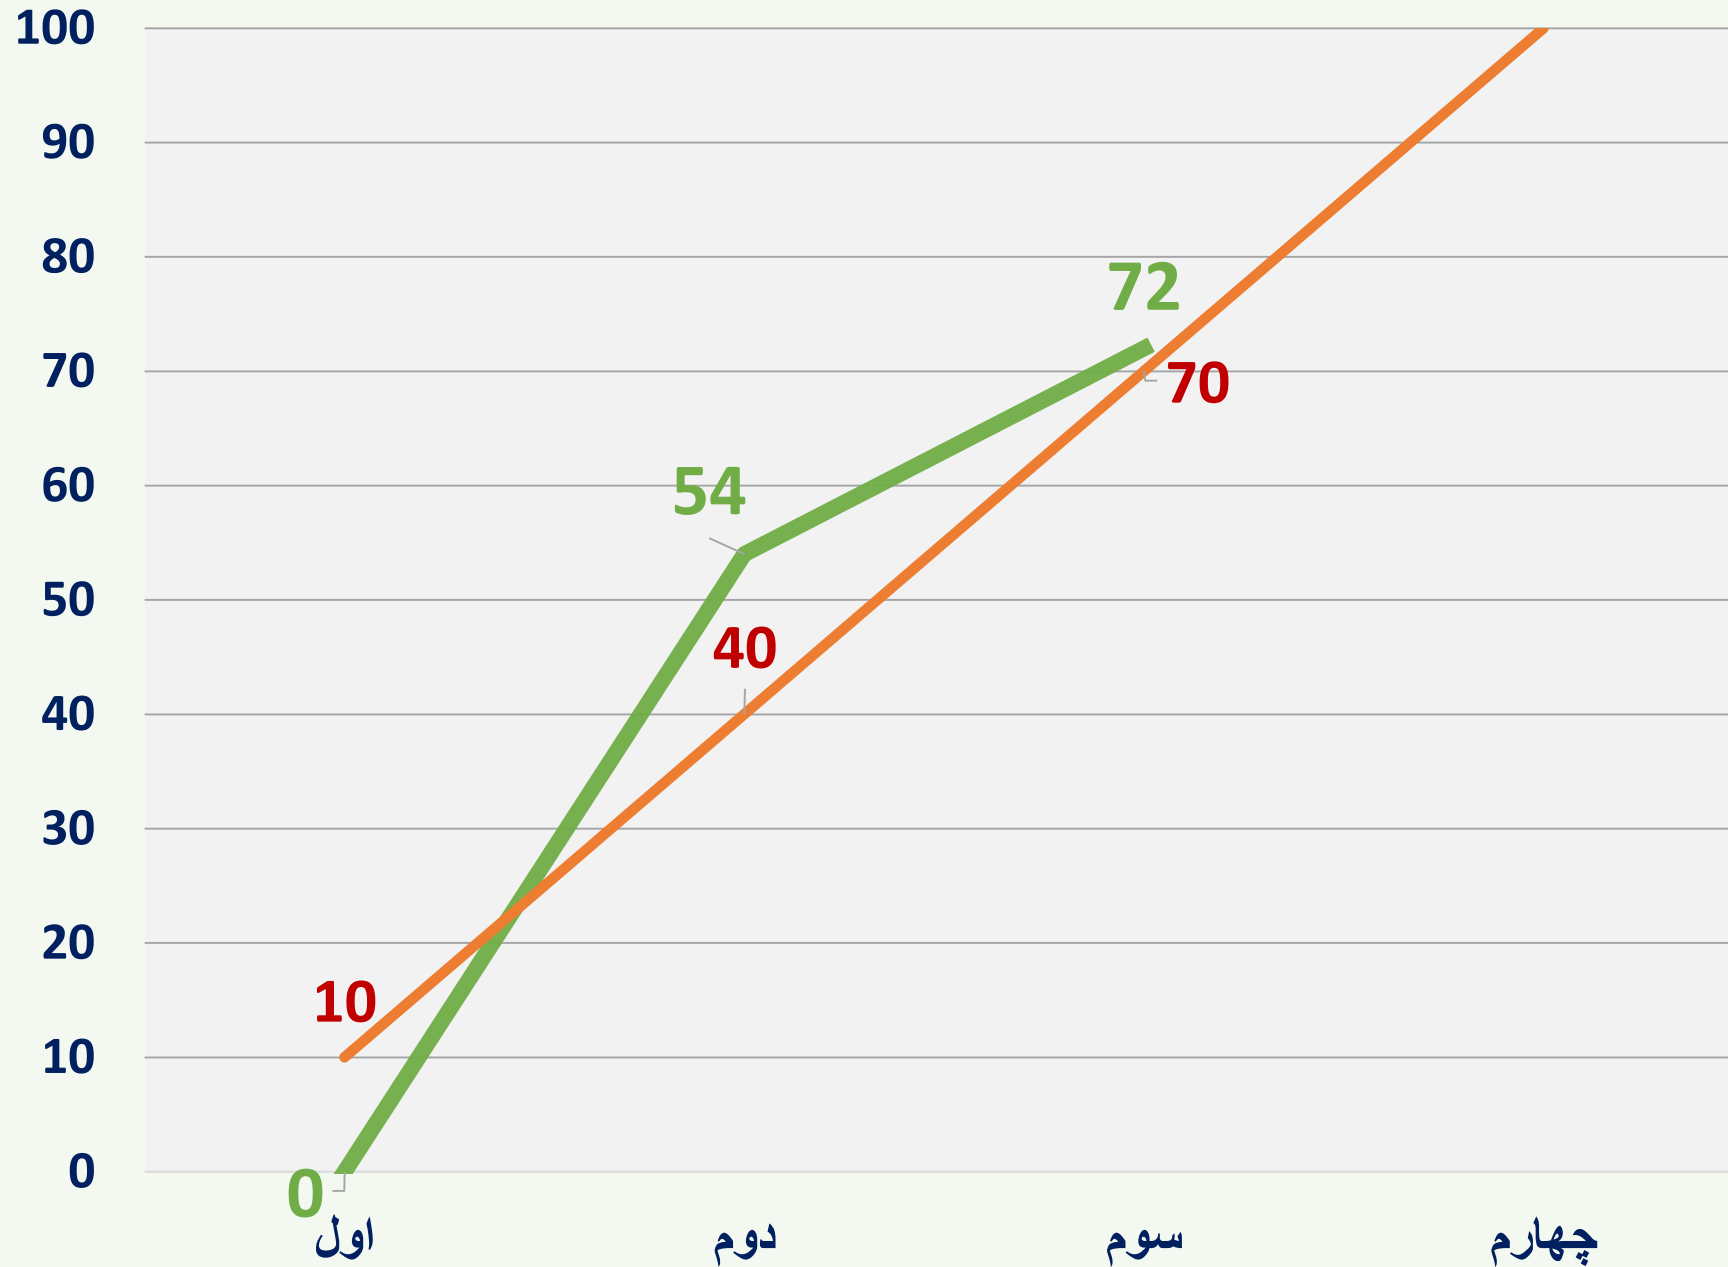

تعهدات: 700 هکتار

اقدامات: 503 هکتار

عملکرد
تعهدات

مدیریت پارک های جنگلی



تعهدات: 495 هکتار


عملکرد: 495 هکتار

عملکرد
تعهدات

تولید نهال

تعهدات: 1050 ه اصله

عملکرد: 550 ه اصله

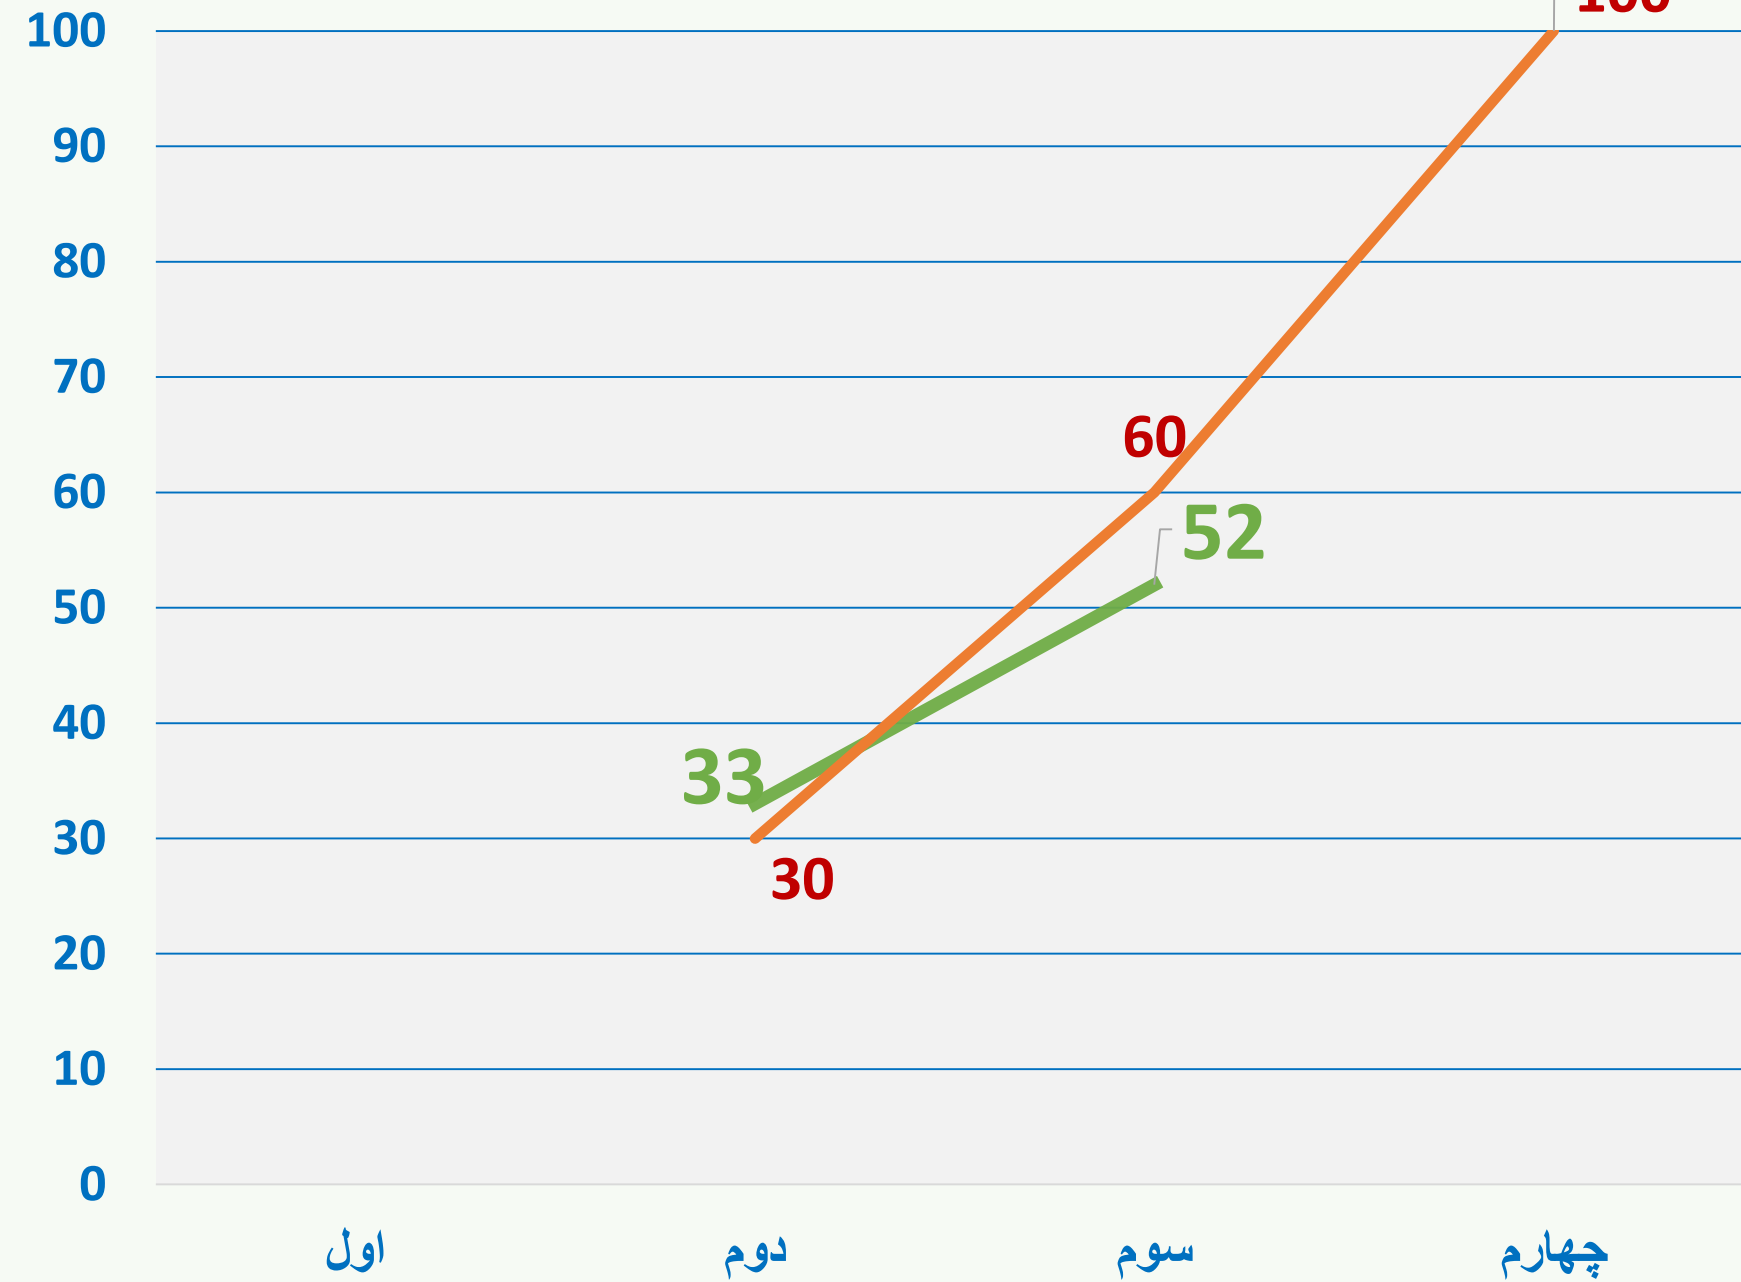


عملکرد
تعهدات

جنگلکاری اقتصادی با گونه های چند منظوره

تعهدات : ۲۰۰۰ هکتار

عملکرد: ۳۰۰

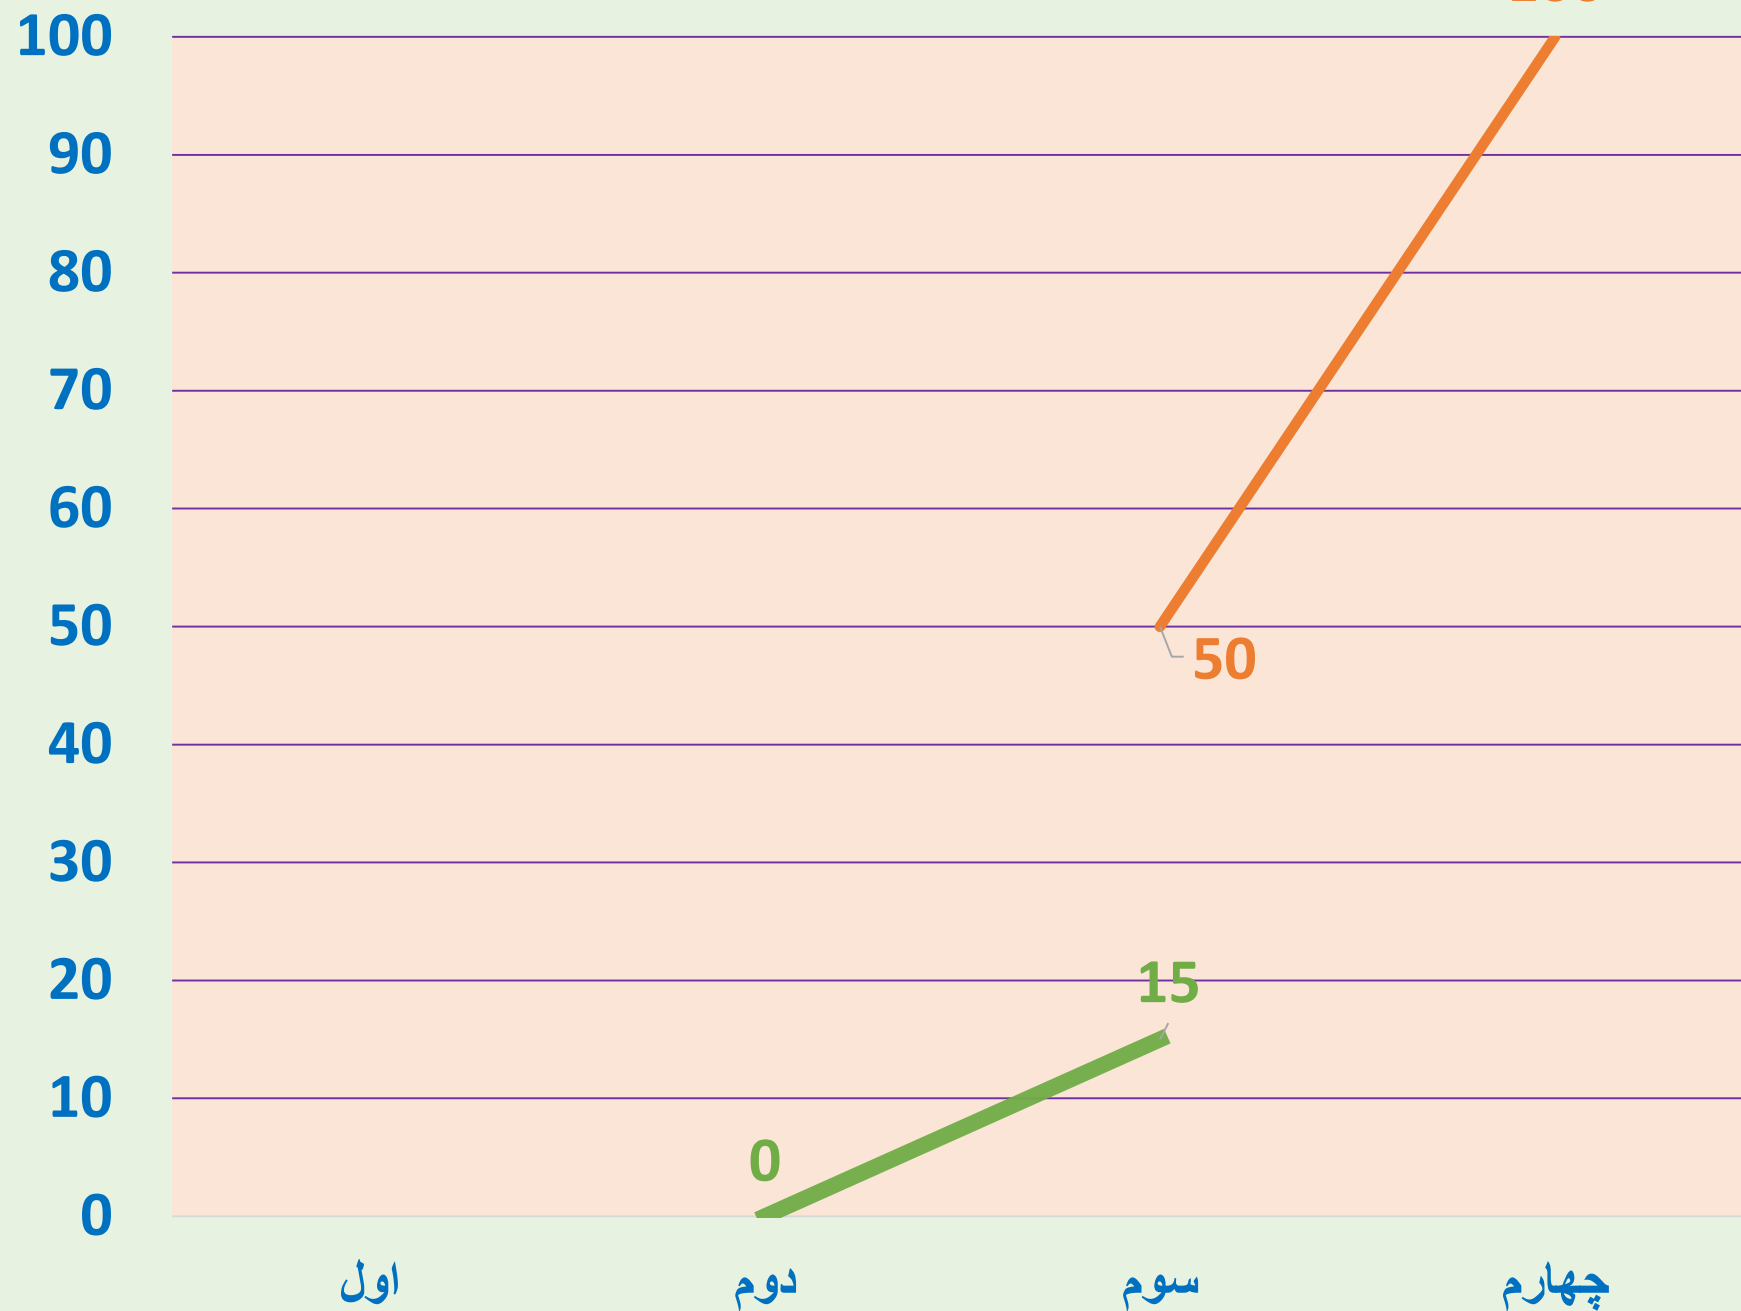


عملکرد
تعهدات

تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیرگاه های جنگلی

تعهدات: 5000 هکتار

عملکرد: 5286 هکتار

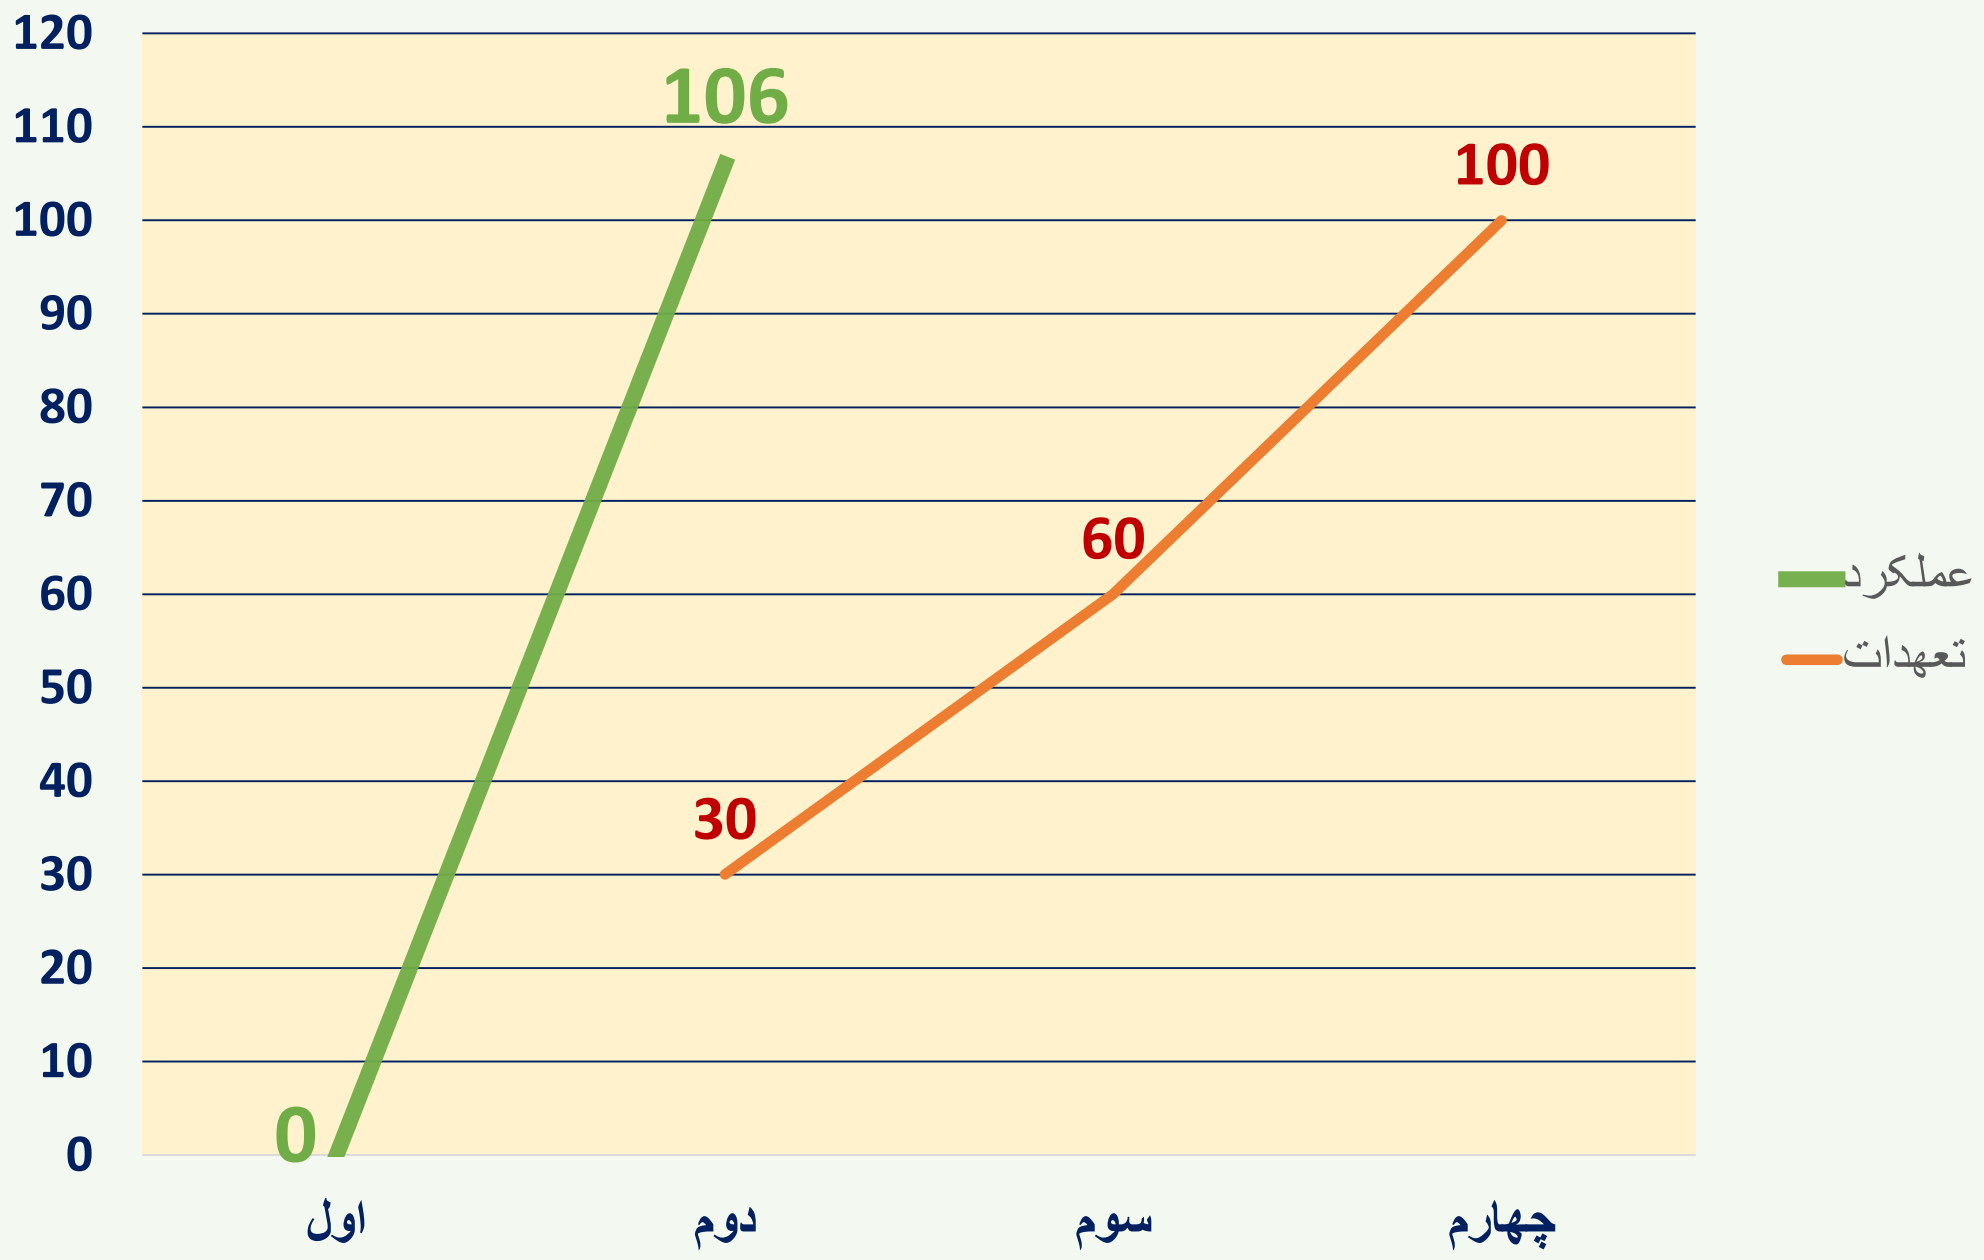


کمر بند حفاظتی


عملکرد
تعهدات

تعهدات: 40 کیلومتر

عملکرد: 32.8 کیلومتر

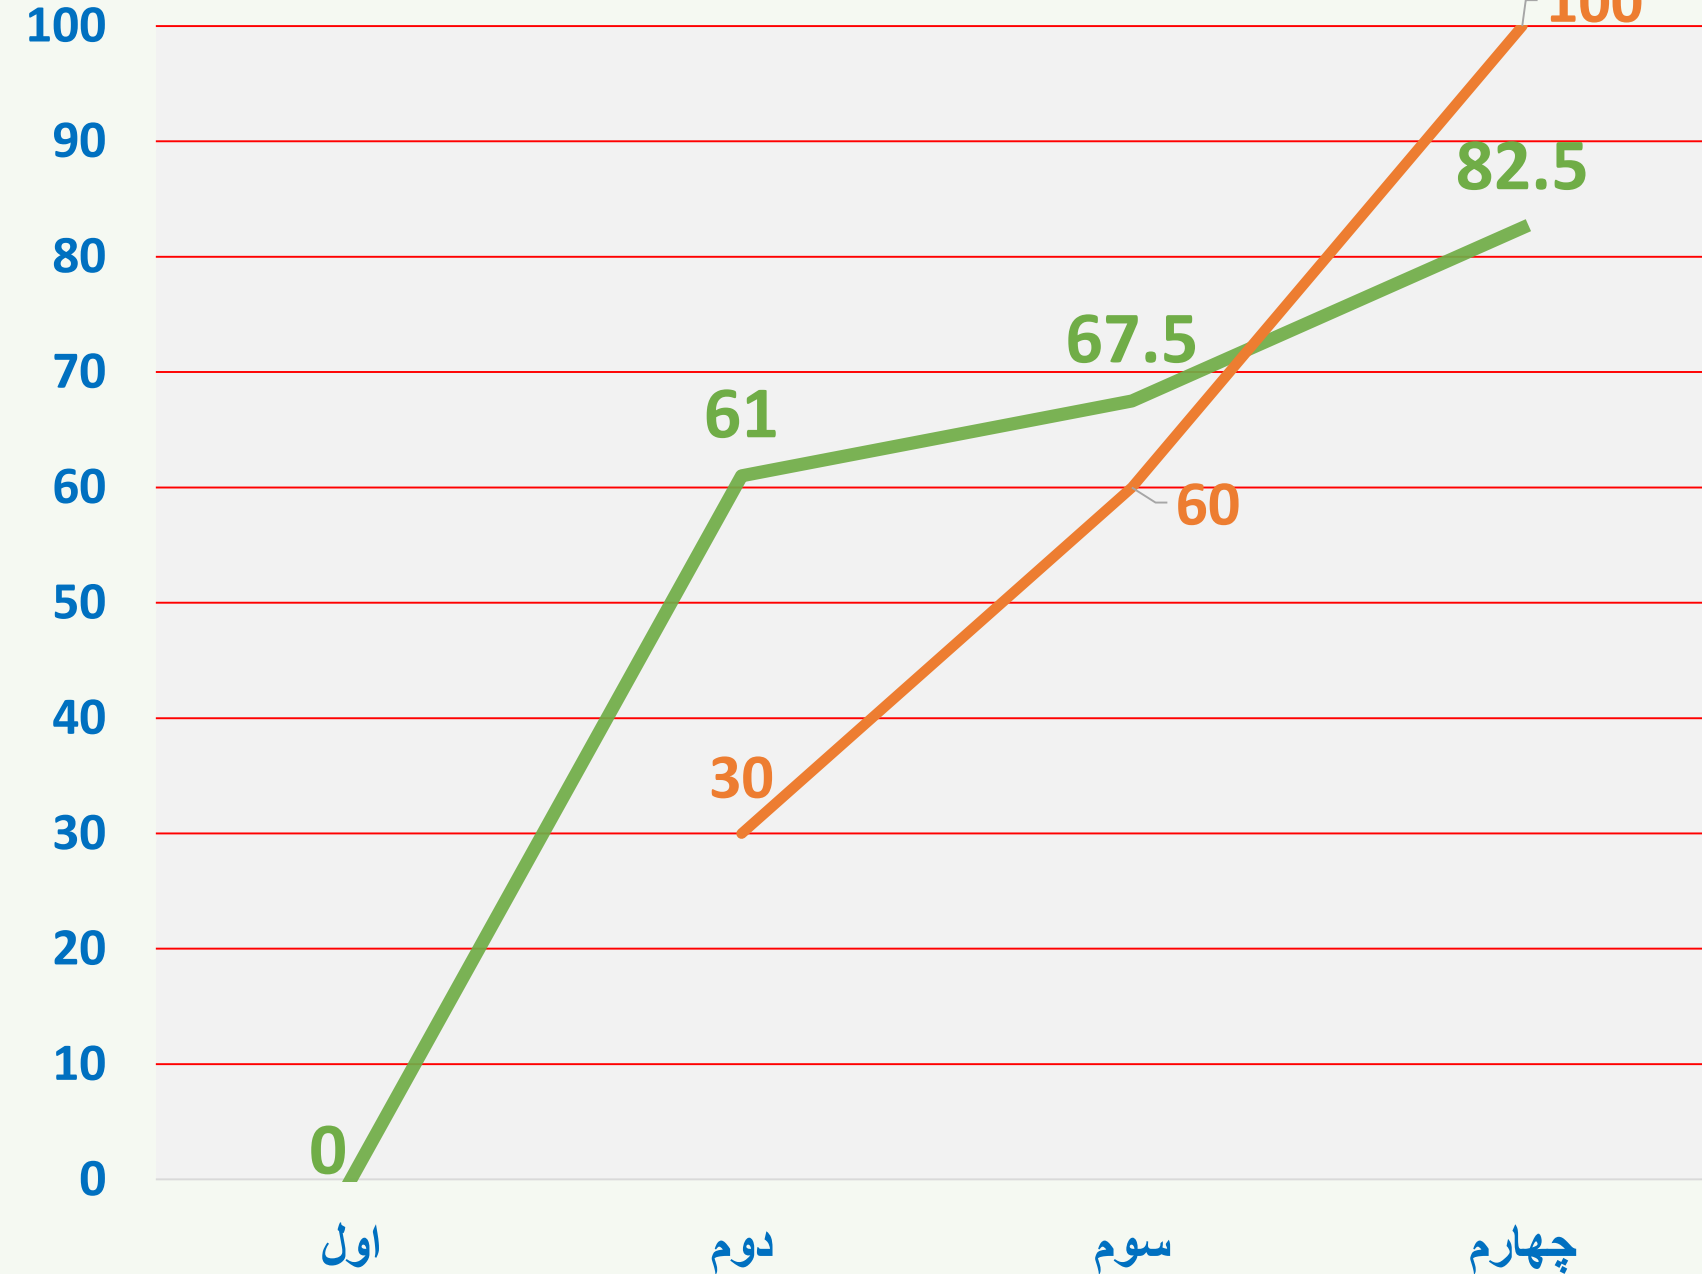

مبارزه با بیماریها

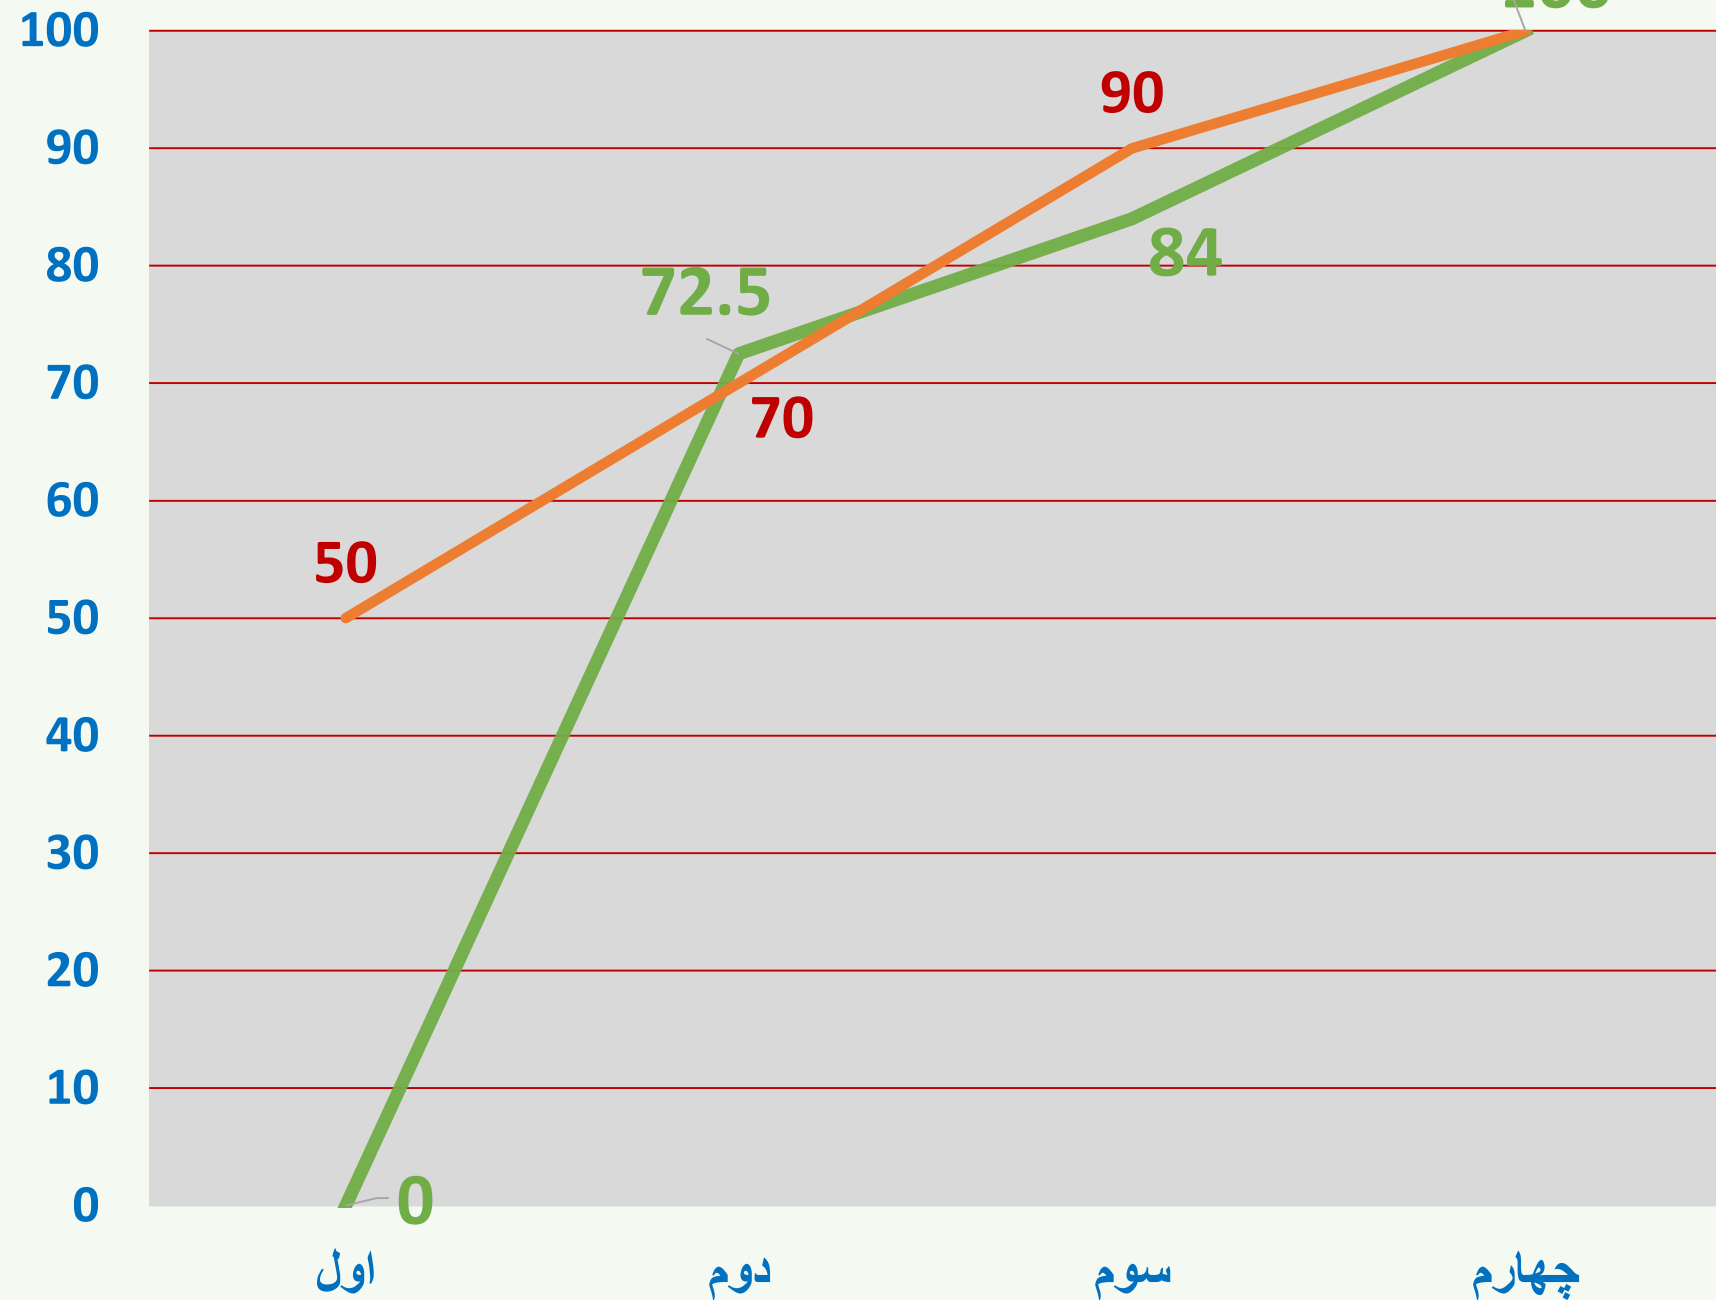


عملکرد
تعهدات

تعهدات : ۱۹۵۰۷ هکتار

عملکرد : ۱۹۶۹۷ هکتار



تامین و جایگزینی سوخت فسیلی

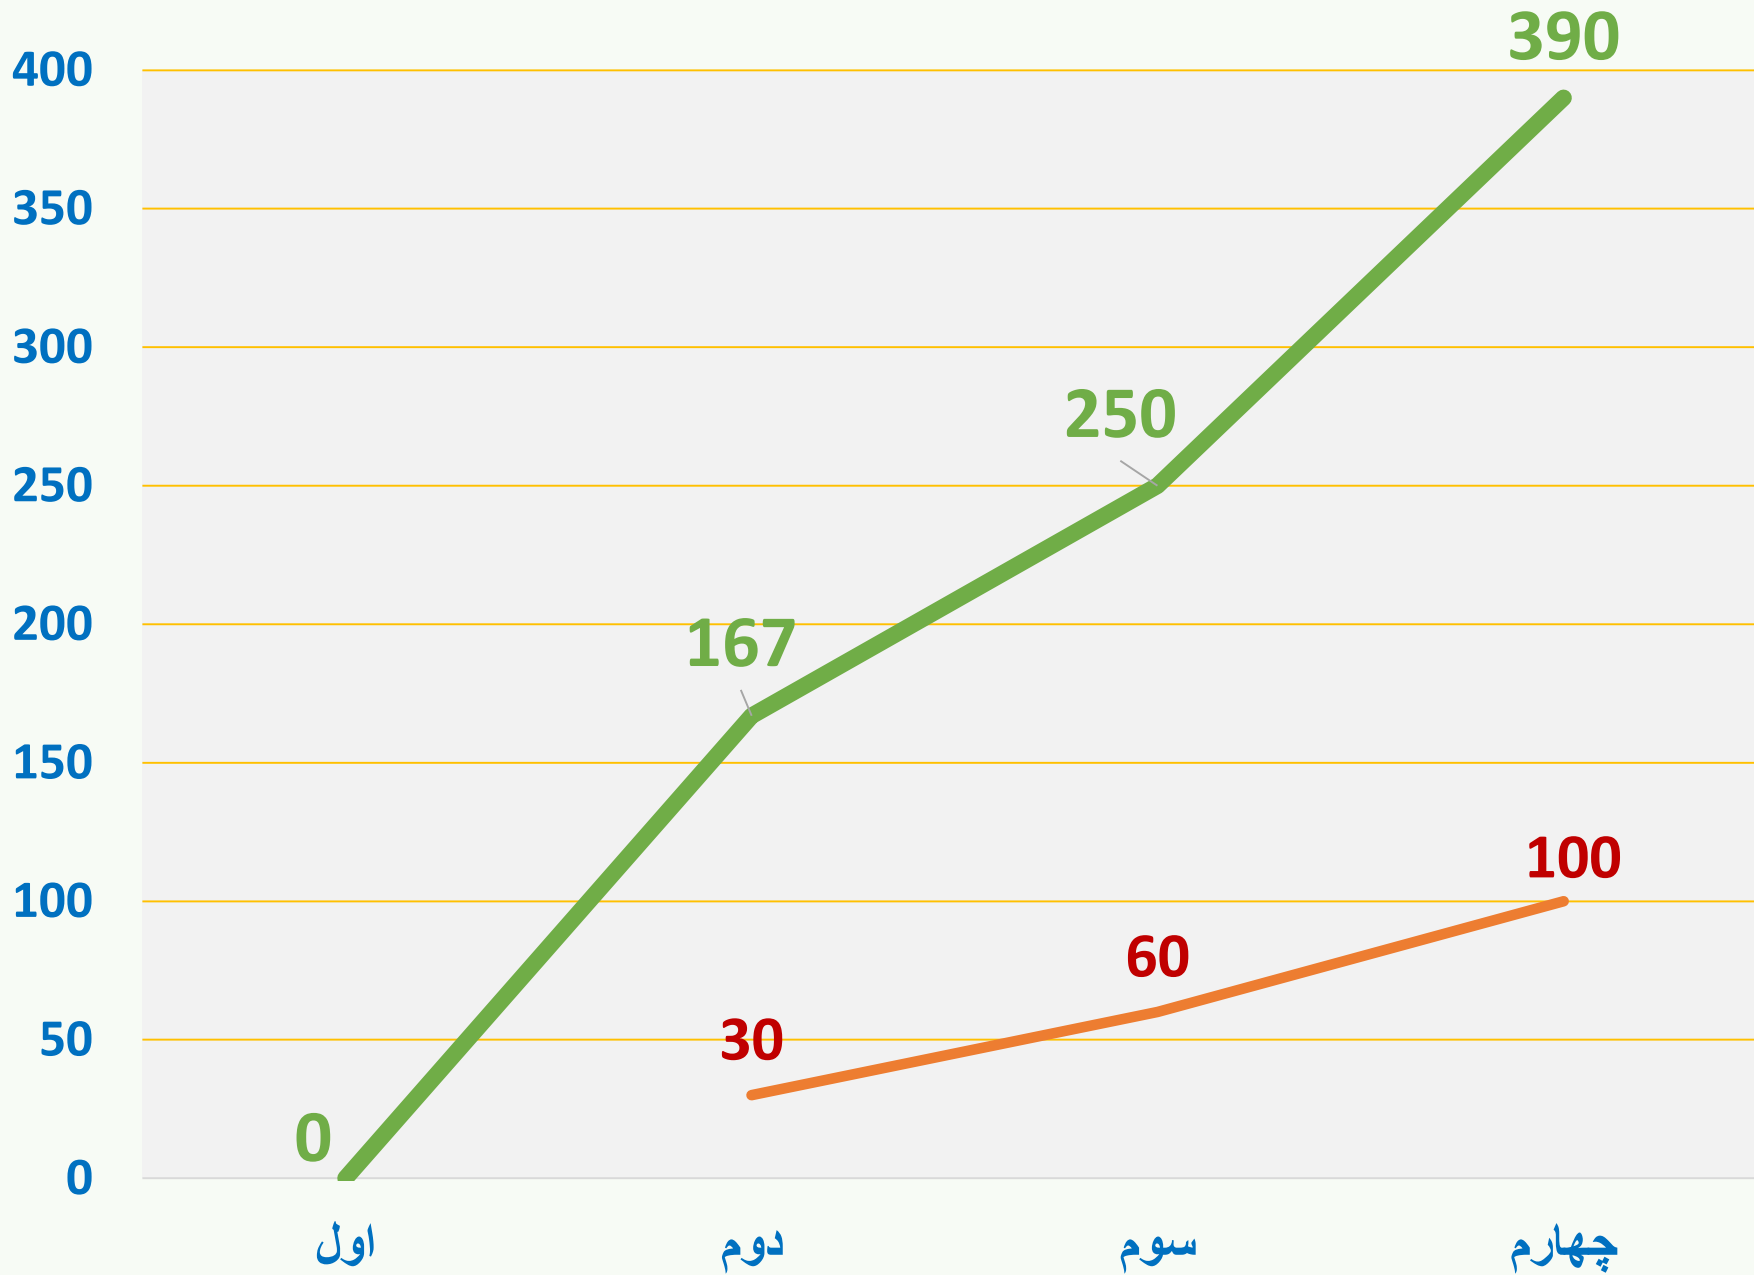

تعهدات: ۳۱ خانوار


عملکرد: ۱۲۱ خانوار



کاداستر

تعهدات : ۶۰۰ هزار هکتار

عملکرد : ۸۹۳۸۳۸ هکتار

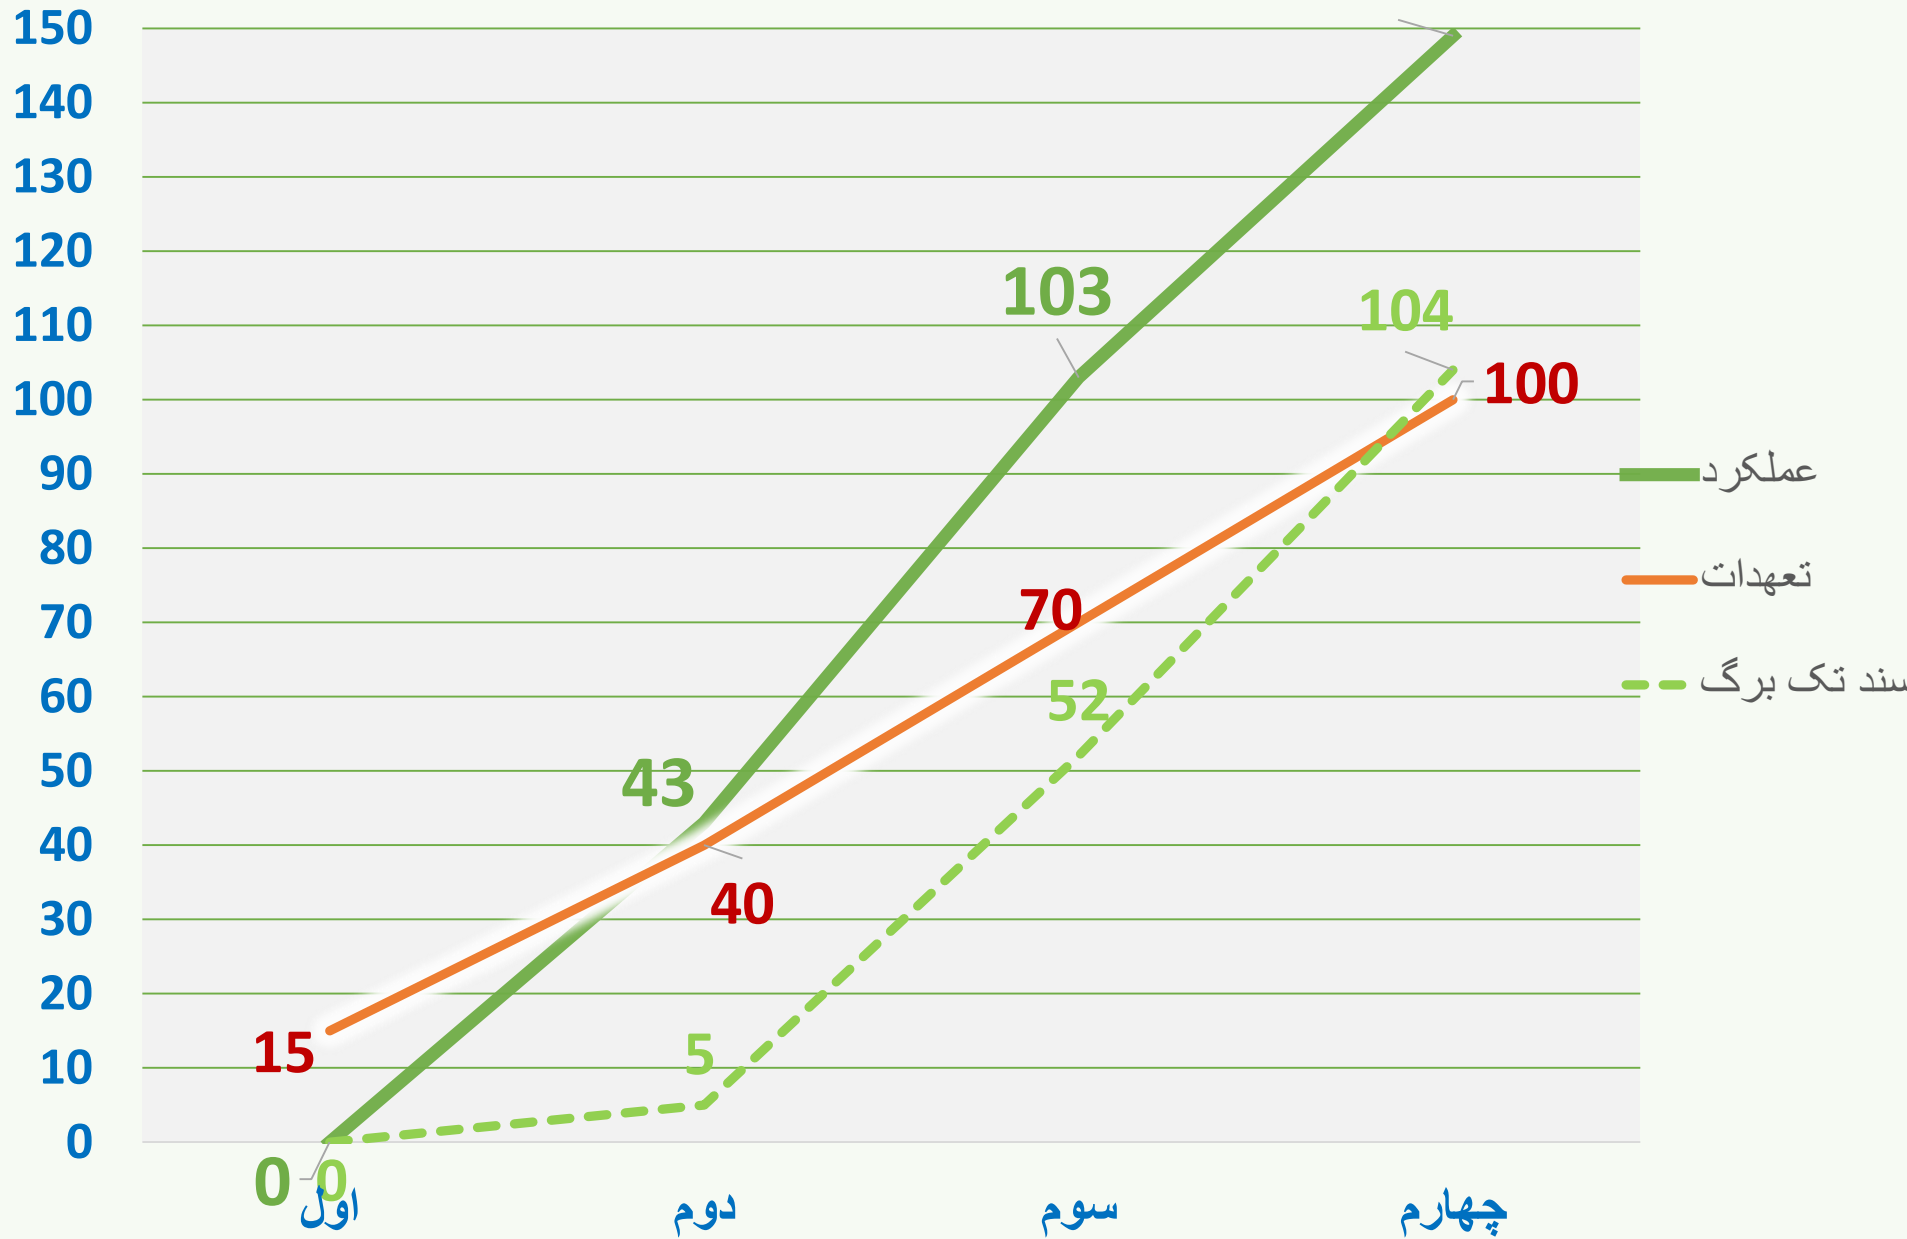

ردیف	عنوان طرح	حجم مصوب	واحد	حجم عملکرد	درصد پیشرفت	توضیحات
معاونت آبخیزداری						
1	اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه‌های آبخیز استان	8,754	هکتار	24053	275	
2	شناسایی و رقومی سازی اطلاعات توصیفی و مکانی اقدامات انجام شده بر اساس مطالعات تفصیلی-اجرایی طرح‌های قبلی	11,050	هکتار	25890	234	
3	استفاده از فن آوری‌ها و الگوهای جدید در کنترل فرسایش خاک و حفاظت آب بر اساس دستاورد های تحقیقاتی	130	هکتار	207	159	
4	اشاعه مدل هفت گام اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز با مشارکت همه بخش ها	22,261	هکتار	17808	80	
5	اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه‌های آبخیز استان(کنترل سیلاب و آبخوانداری)	1,040	هکتار	832	80	


عملیات آبخیزداری

عملکرد


تعهدات

تعهدات: ۱۱۰۵۰ هکتار

عملکرد: ۲۴۸۸۵ هکتار

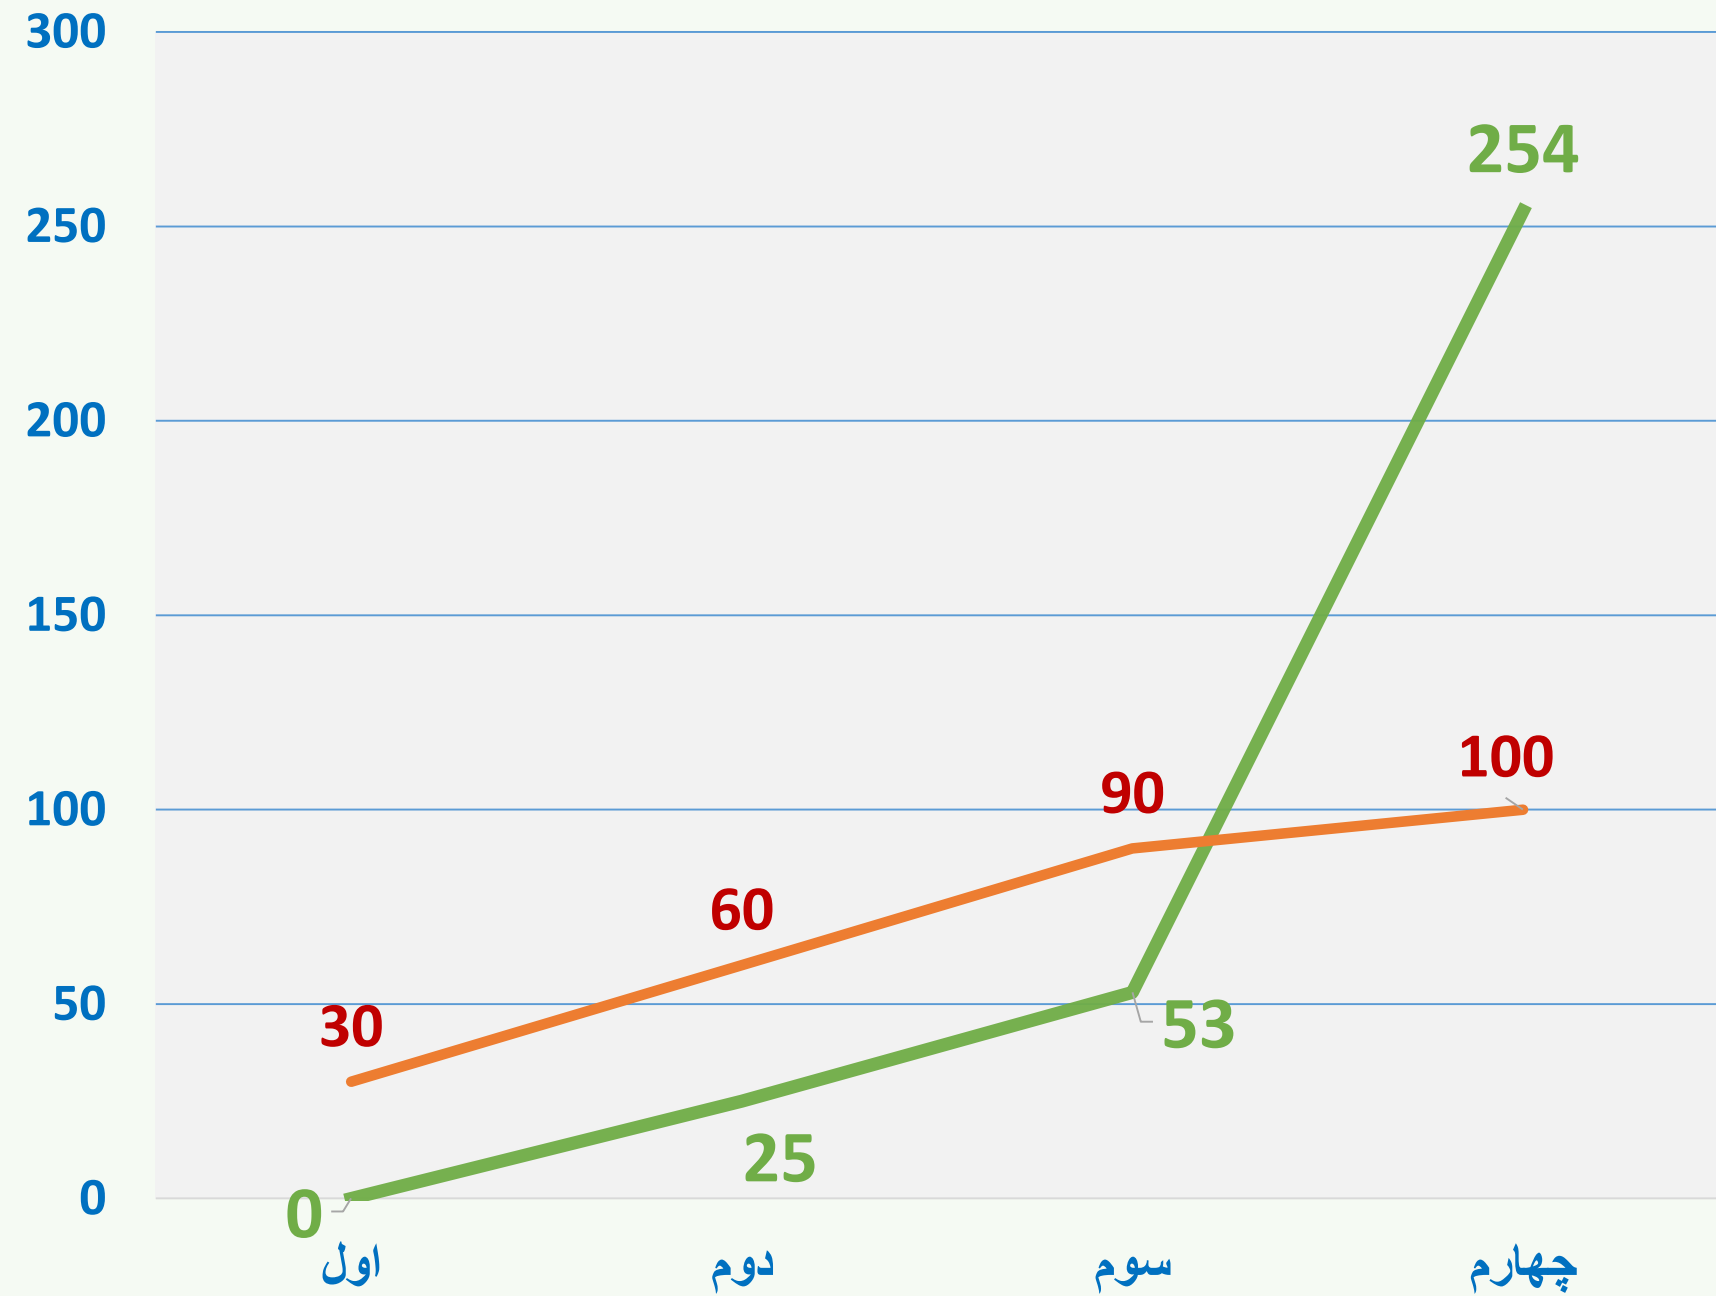

توسعه دولت الکترونیک

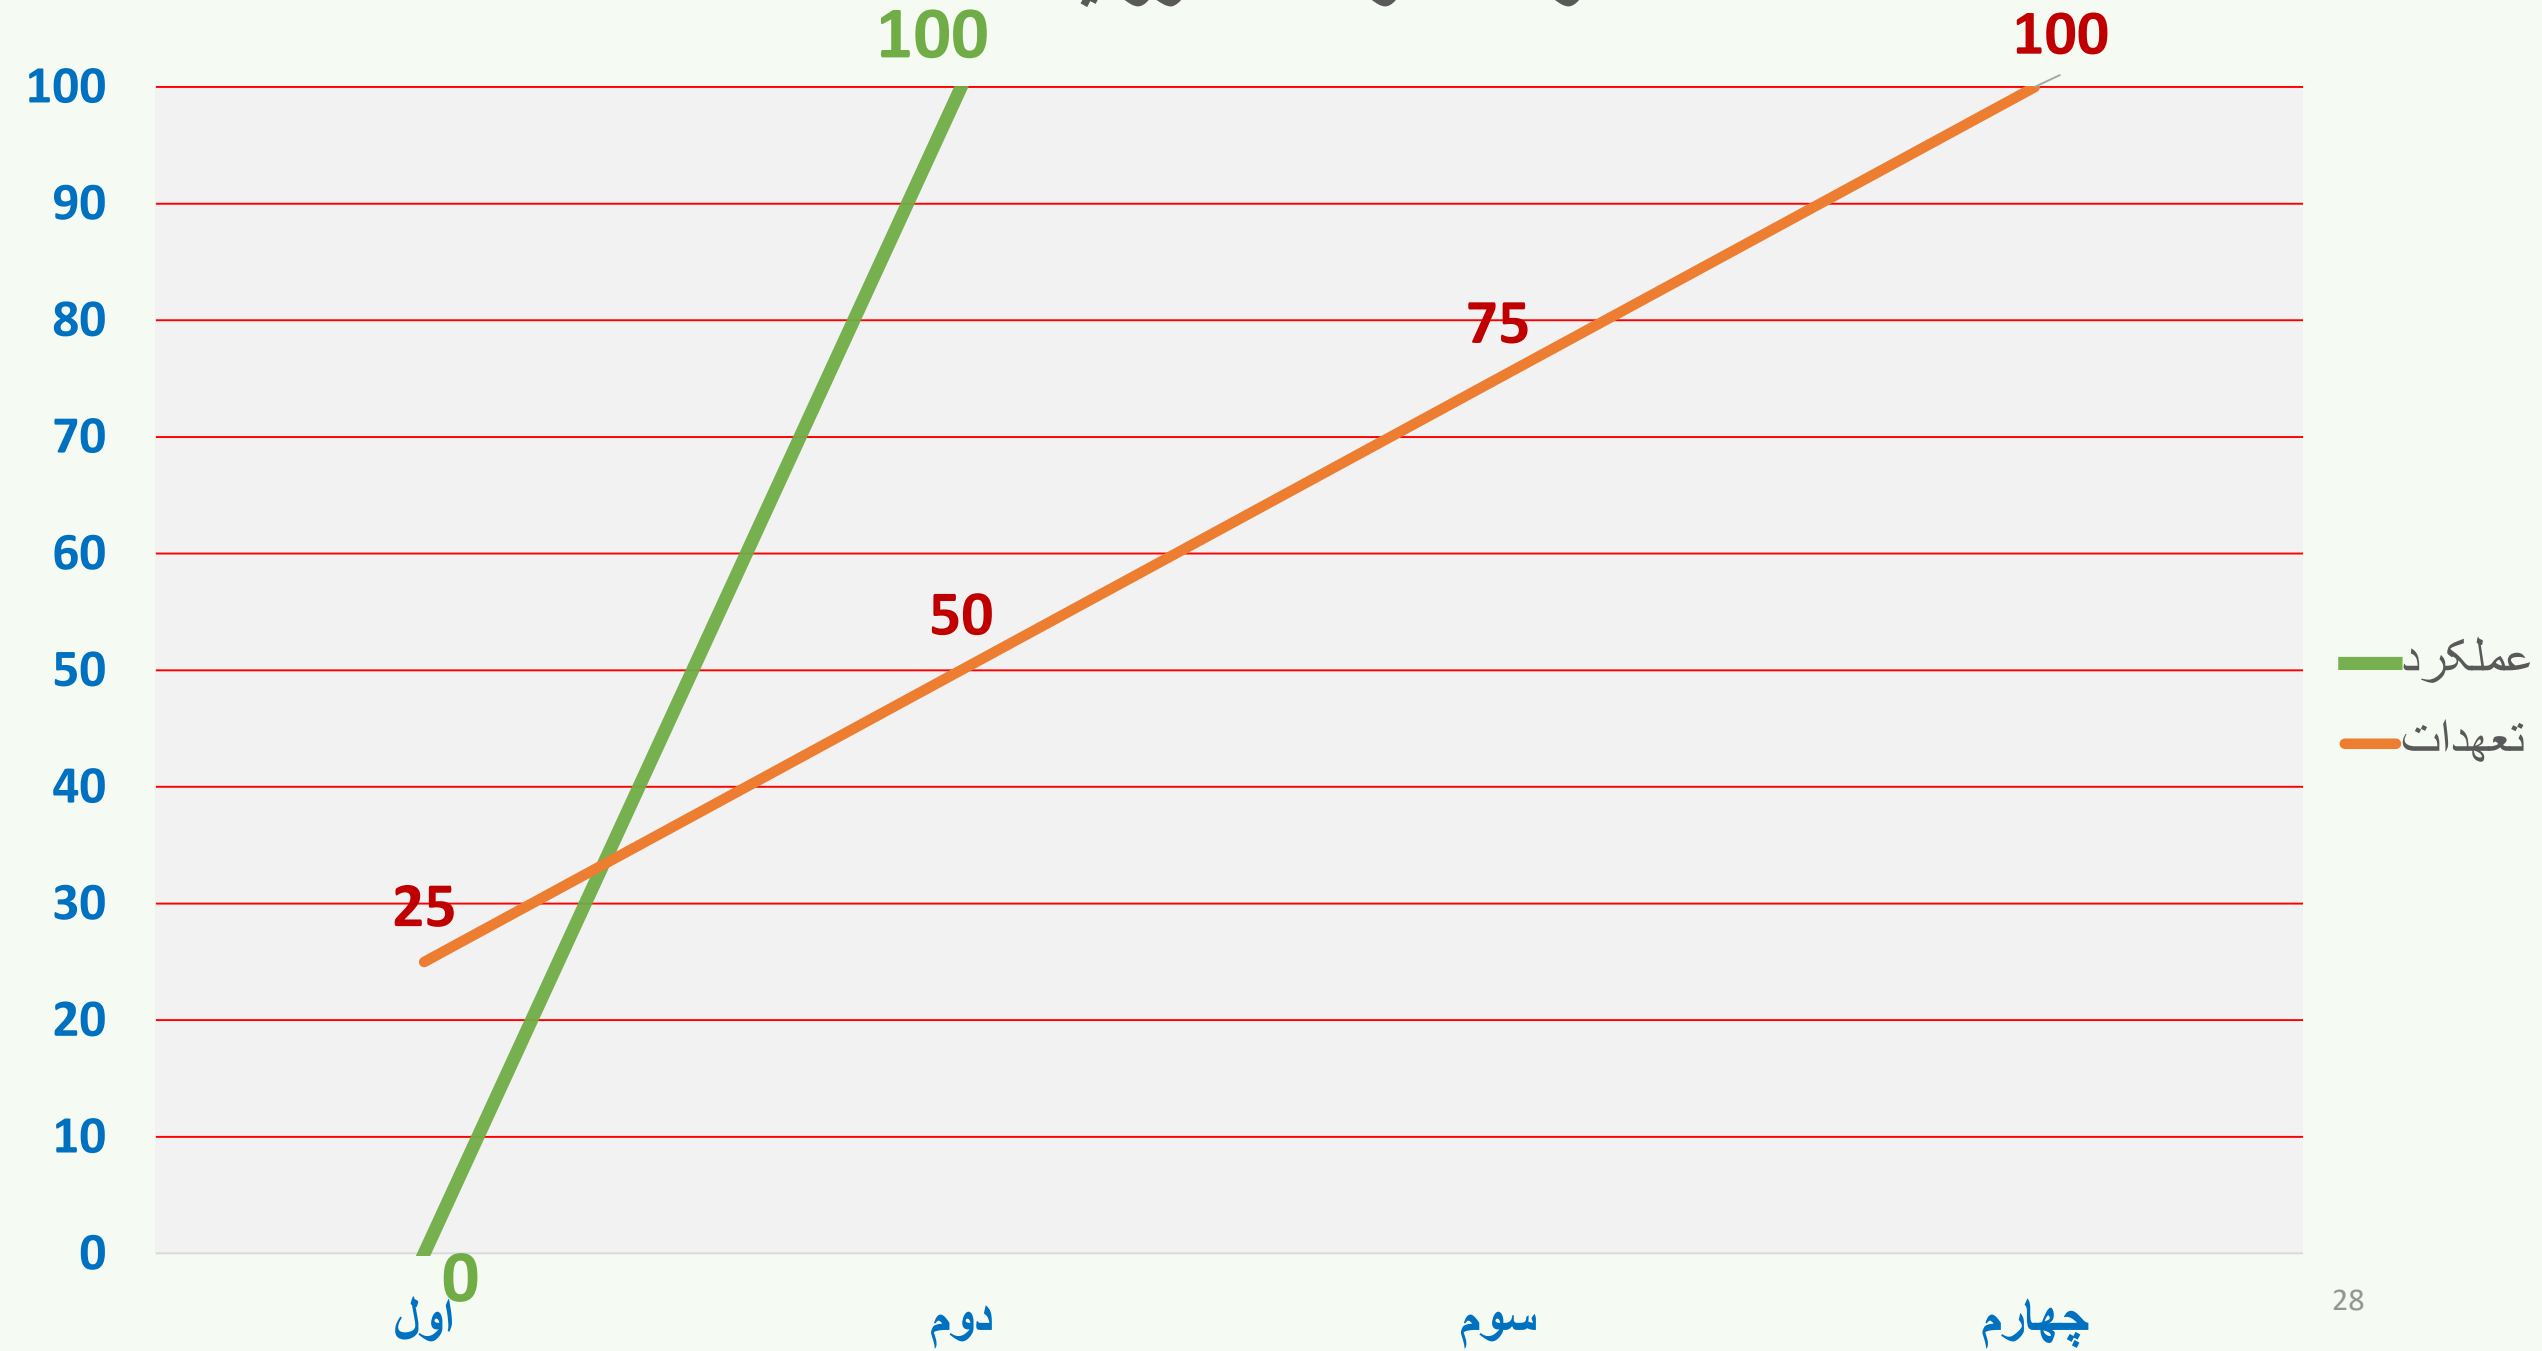

یگان حفاظت

ردیف	عنوان طرح	حجم مصوب	واحد	حجم عملکرد	درصد پیشرفت	توضیحات
1	مناطق بحرانی	486,092	هکتار	486,092	100	62 منطقه
2	مناطق نیمه بحرانی	812,049	هکتار	812,049	100	192 منطقه
3	عادی	185,126	هکتار	185,126	100	44 منطقه
4	شبکه رادیویی	85	درصد	85	100	
5	احداث پاسگاه و پایگاه اطفاء حریق (دستگاه)	20	دستگاه	20	100	



نگینی که حفاظت از جنگل

زود بینی که دیر خواهد شد

سنبری جنگل از حفاظت ماست

ورنه روزی کویر خواهد شد



با تشکر از توجه شما
